



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566



คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผลจัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบและให้ข้อเสนอแนะ ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



สารบัญ



หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

หน้า 7

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

หน้า 9

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

หน้า 10

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

หน้า
26


บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566
ที่ย้ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

หน้า
31

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

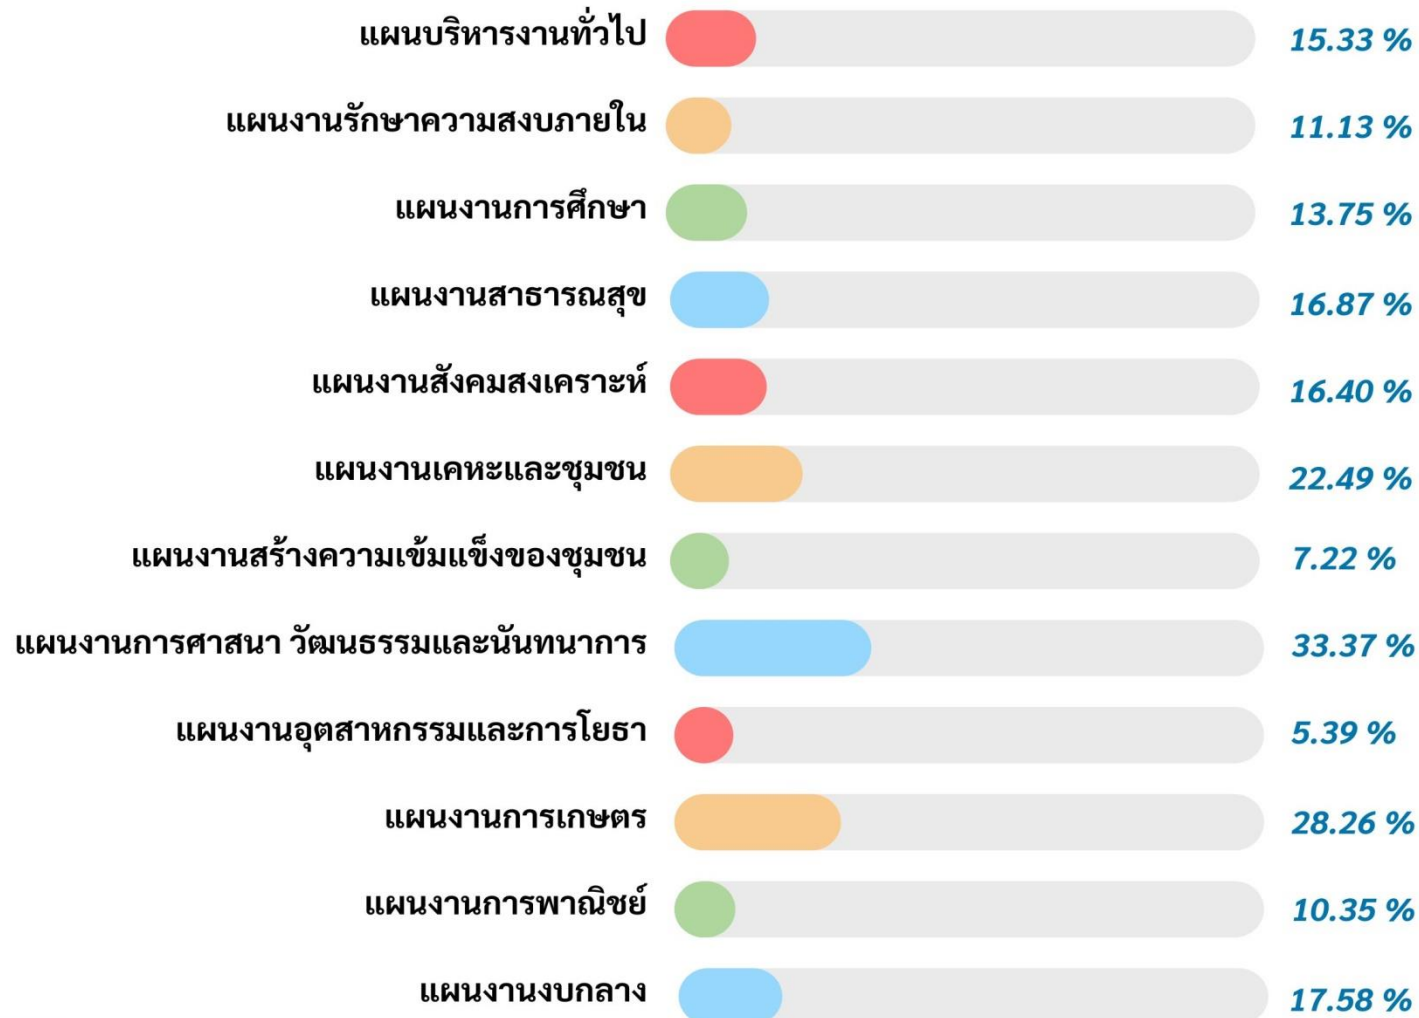

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)



เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1/2567

- > รายจ่ายประจำ ร้อยละ 30 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด)
- > งบลงทุน ร้อยละ 15 (ของงบลงทุนทั้งหมด)
- > การเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	141,265,840.00	309,750.00	309,750.00	5,897,153.19	15,758,407.50	119,610,279.31	15.33	
	รายจ่ายประจำ	140,227,790.00	309,750.00	309,750.00	5,897,153.19	15,578,307.50	118,752,329.31	15.31	
	- งานบริหารทั่วไป	94,472,800.00	271,750.00	271,750.00	5,287,446.33	9,248,347.27	79,937,006.40		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,591,600.00	18,000.00	18,000.00	23,650.00	581,840.00	3,986,110.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	40,272,000.00	-	-	531,056.86	5,643,461.56	34,097,481.58		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	891,390.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00	104,658.67	731,731.33		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,038,050.00	-	-	-	180,100.00	857,950.00	17.35	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	1,038,050.00	-	-	-	180,100.00	857,950.00		
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	33,067,900.00	69,000.00	69,000.00	377,560.03	3,303,260.48	29,387,079.49	11.13	
	รายจ่ายประจำ	33,026,400.00	69,000.00	69,000.00	377,560.03	3,303,260.48	29,345,579.49	11.15	
	- งานเทศกิจ	10,877,200.00	-	-	107,316.00	1,302,859.10	9,467,024.90		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,526,600.00	69,000.00	69,000.00	62,634.03	1,679,700.18	15,784,265.79		
	- งานจราจร	4,622,600.00	-	-	207,610.00	320,701.20	4,094,288.80		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	41,500.00	-	-	-	-	41,500.00	-	
	-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ครุภัณฑ์)	41,500.00	-	-	-	-	41,500.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	315,744,300.00	13,845.00	13,845.00	3,575,125.13	39,825,086.96	272,344,087.91	13.75	
	รายจ่ายประจำ	315,179,300.00	13,845.00	13,845.00	3,575,125.13	39,825,086.96	271,779,087.91	13.77	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,123,100.00	13,845.00	13,845.00	101,562.92	913,203.59	7,108,333.49		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	172,264,500.00	-	-	2,338,734.25	23,478,802.45	146,446,963.30		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	128,350,800.00	-	-	1,099,300.27	14,819,224.11	112,432,275.62		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,440,900.00	-	-	35,527.69	613,856.81	5,791,515.50		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	565,000.00	-	-	-	-	565,000.00	-	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	565,000.00	-	-	-	-	565,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,042,600.00	79,100.00	-	2,492,913.99	8,661,096.62	54,967,689.39	16.87	
	รายจ่ายประจำ	65,622,200.00	79,100.00	-	2,492,913.99	8,661,096.62	54,547,289.39	16.98	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,074,500.00	-	-	314,634.10	1,273,025.42	7,486,840.48		สำนักงานสาธารณสุข
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,364,700.00	75,500.00	-	845,856.85	1,873,133.67	15,721,209.48		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,183,000.00	3,600.00	-	1,332,423.04	5,514,937.53	31,339,239.43		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	420,400.00	-	-	-	-	420,400.00	-	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	71,400.00	-	-	-	-	71,400.00		สำนักงานสาธารณสุข
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	349,000.00	-	-	-	-	349,000.00		
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,783,390.00	20,000.00	20,000.00	674,665.54	1,257,902.09	9,850,822.37	16.40	
	รายจ่ายประจำ	11,756,690.00	20,000.00	20,000.00	674,665.54	1,257,902.09	9,824,122.37	16.44	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,960,700.00	20,000.00	20,000.00	2,749.50	670,103.69	4,287,846.81		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,795,990.00	-	-	671,916.04	587,798.40	5,536,275.56		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	26,700.00	-	-	-	-	26,700.00	-	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(ครุภัณฑ์)	26,700.00	-	-	-	-	26,700.00		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
6	แผนงานเคหะและชุมชน	185,454,570.00	158,500.00	237,600.00	21,954,326.13	19,733,785.82	143,687,358.05	22.49	
	รายจ่ายประจำ	160,454,570.00	158,500.00	237,600.00	21,954,326.13	19,733,785.82	118,687,358.05	25.99	
	- งานไฟฟ้าและประปา	321,270.00	-	-	-	321,233.26	36.74		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,119,800.00	-	-	182,062.76	1,780,592.74	8,157,144.50		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	131,277,300.00	158,500.00	237,600.00	21,226,050.37	15,417,032.70	94,555,116.93		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	18,736,200.00	-	-	546,213.00	2,214,927.12	15,975,059.88		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-	
	- งานสวนสาธารณะ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00		สช. / สธ.
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00		สช. / สธ.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,726,600.00	-	-	4,728.00	1,347,115.00	17,374,757.00	7.22	
	รายจ่ายประจำ	18,726,600.00	-	-	4,728.00	1,347,115.00	17,374,757.00	7.22	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	18,726,600.00	-	-	4,728.00	1,347,115.00	17,374,757.00		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	25,594,500.00	-	-	7,625,442.19	915,311.02	17,053,746.79	33.37	
	รายจ่ายประจำ	25,525,000.00	-	-	7,625,442.19	915,311.02	16,984,246.79	33.46	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,767,400.00	-	-	367,941.69	200,726.82	8,198,731.49		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,487,900.00	-	-	7,130,495.50	510,830.00	4,846,574.50		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,269,700.00	-	-	127,005.00	203,754.20	3,938,940.80		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	69,500.00	-	-	-	-	69,500.00	-	
	-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	69,500.00	-	-	-	-	69,500.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,346,390.00	55,000.00	55,000.00	1,656,565.80	6,440,597.12	142,249,227.08	5.39	
	รายจ่ายประจำ	57,412,740.00	55,000.00	55,000.00	1,656,565.80	6,389,397.12	49,366,777.08	14.01	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	7,341,300.00	55,000.00	55,000.00	78,390.00	913,689.40	6,349,220.60		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	50,071,440.00	-	-	1,578,175.80	5,475,707.72	43,017,556.48		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	92,933,650.00	-	-	-	51,200.00	92,882,450.00	0.06	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	26,578,450.00	-	-	-	51,200.00	26,527,250.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	66,355,200.00	-	-	-	-	66,355,200.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	6,699,900.00	-	-	748,113.30	1,144,985.30	4,806,801.40	28.26	
	รายจ่ายประจำ	6,699,900.00	-	-	748,113.30	1,144,985.30	4,806,801.40	28.26	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,699,900.00	-	-	748,113.30	1,144,985.30	4,806,801.40		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,296,200.00	-	-	38,262.20	302,926.81	2,955,010.99	10.35	
	รายจ่ายประจำ	3,296,200.00	-	-	38,262.20	302,926.81	2,955,010.99	10.35	
	- งานตลาดสด	651,100.00	-	-	1,680.00	69,080.00	580,340.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,645,100.00	-	-	36,582.20	233,846.81	2,374,670.99		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
12	แผนงานงบกลาง	241,977,810.00	200,000.00	200,000.00	1,303,284.50	41,244,929.51	199,429,595.99	17.58	
	รายจ่ายประจำ	241,977,810.00	200,000.00	200,000.00	1,303,284.50	41,244,929.51	199,429,595.99	17.58	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,200,000,000.00	905,195.00	905,195.00	46,348,140.00	139,935,404.23	1,013,716,455.77	15.52	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,079,905,200.00	905,195.00	905,195.00	46,348,140.00	139,704,104.23	893,852,955.77	17.23	
	รวมงบลงทุน	120,094,800.00	-	-	-	231,300.00	119,863,500.00	0.19	


รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

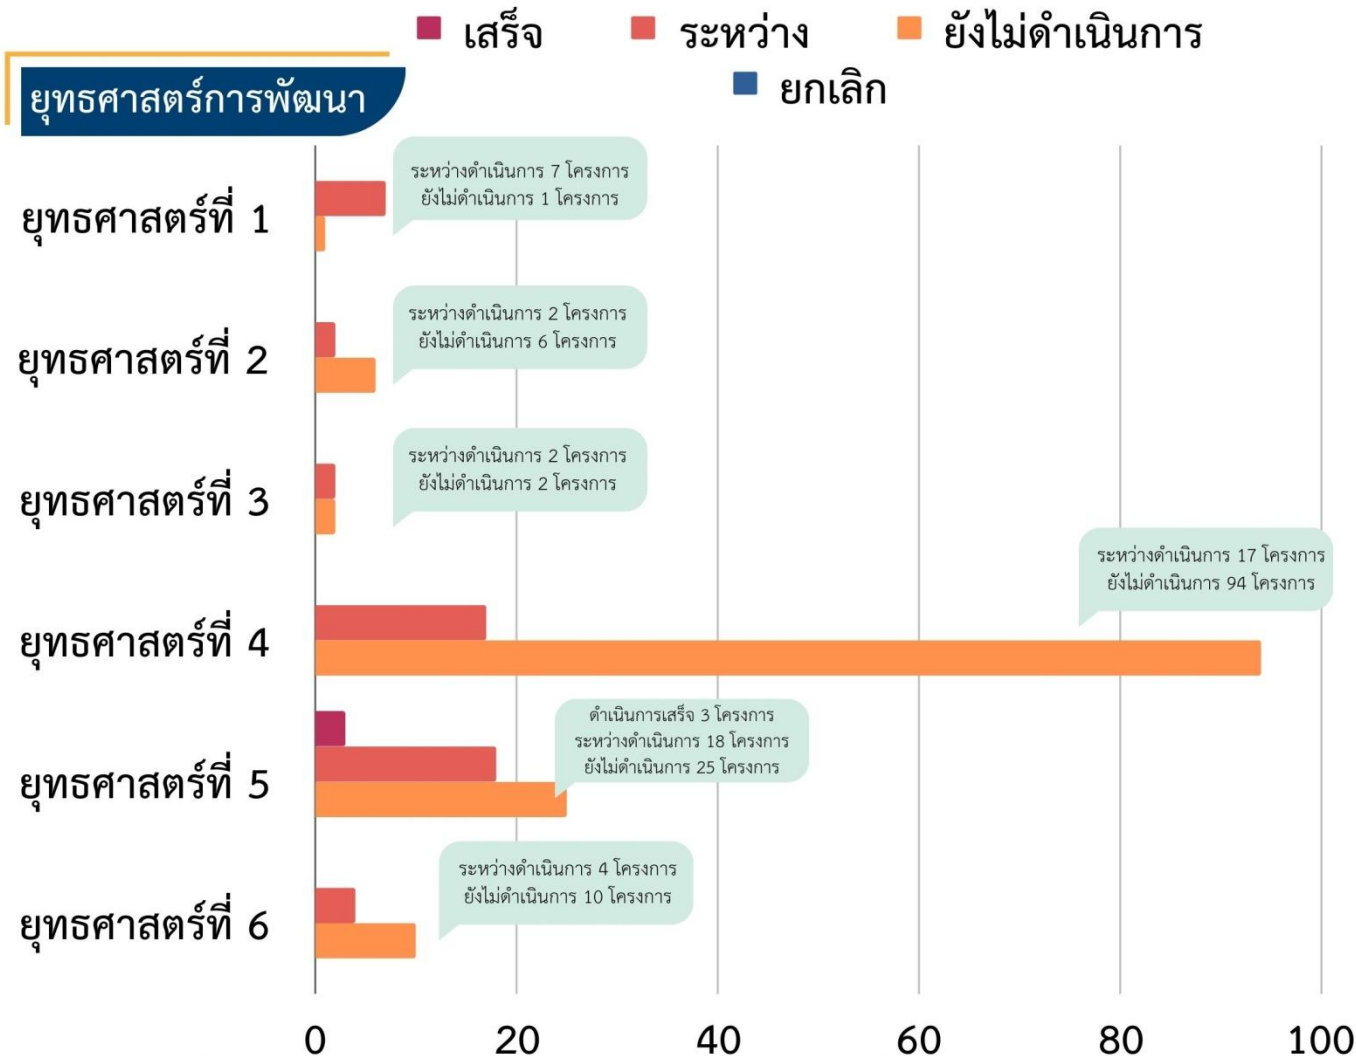

- 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

หน่วย : ร้อยละ

แผนภูมิแสดง

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ร้อยละ **1.57** ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 3 โครงการ

ร้อยละ **26.18** อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 50 โครงการ

ร้อยละ **72.25** ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 138 โครงการ

ร้อยละ **0** ยกเลิก
จำนวน - โครงการ

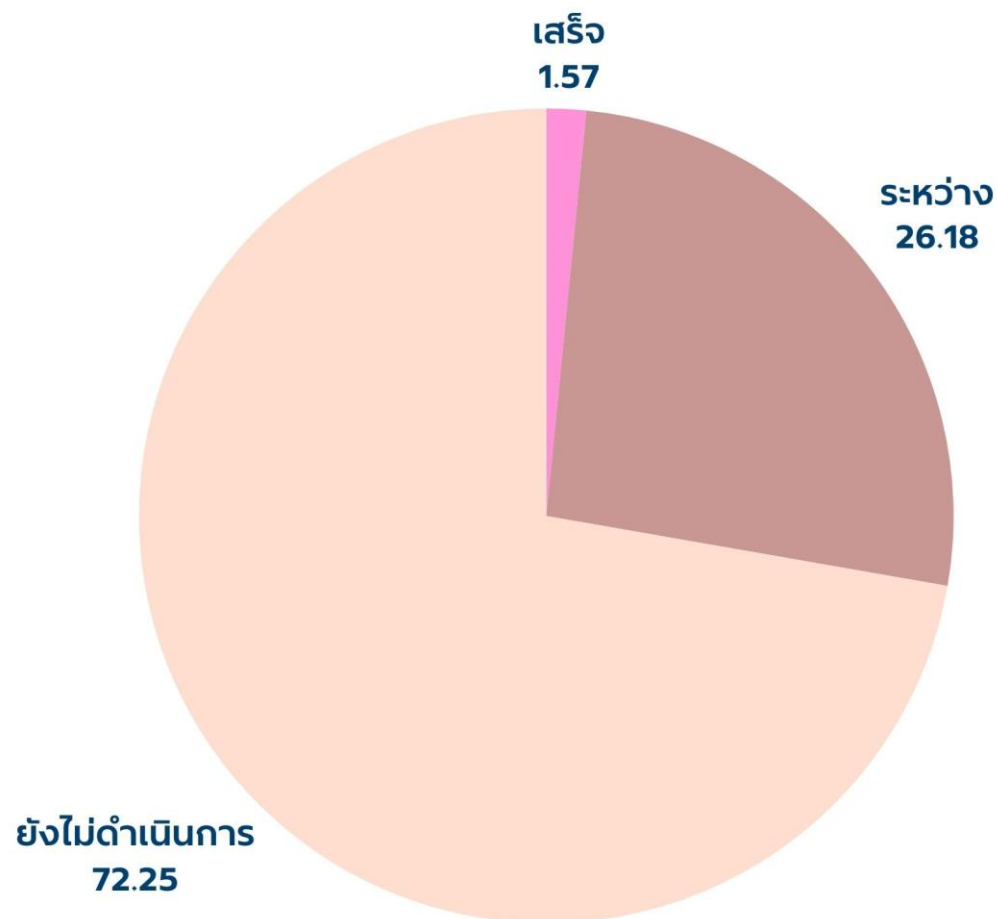

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีทั้งหมด 191 โครงการ
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 207,684,770.00 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 191 โครงการ งบประมาณ 207,684,770 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	1,386,270.00	292,292.97	-	-	-	7	321,270.00	292,292.97	1	1,065,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	13,300,000.00	42,100.00	-	-	-	2	900,000.00	42,100.00	6	12,400,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	5,700,000.00	-	-	-	-	2	500,000.00	-	2	5,200,000.00	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	111	45,694,600.00	613,700.00	-	-	-	17	6,117,600.00	613,700.00	94	39,577,000.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	138,663,900.00	18,237,309.04	3	7,200,000.00	6,009,348.00	18	98,078,800.00	12,227,961.04	25	33,385,100.00	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	2,940,000.00	37,500.00	-	-	-	4	700,000.00	37,500.00	10	2,240,000.00	-	-
รวม	191	207,684,770.00	19,222,902.01	3	7,200,000.00	6,009,348.00	50	106,617,670.00	13,213,554.01	138	93,867,100.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			1.57			26.18			72.25		0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี													
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)													
แบบรายงาน 2.1													
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนโลกรัฐ 19	74,940.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		45,999.30	28,940.70	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 31/1	40,700.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		40,698.52	1.48	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ่อนทะเล 13/1/1	44,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		43,991.98	8.02	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 39/1	37,040.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		37,031.63	8.37	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี ซอยตรงข้ามวัดโพธิ์นimit	33,640.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		33,631.17	8.83	✓	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี 3	46,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		45,999.30	0.70	✓	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 18	44,950.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		44,941.07	8.93	✓	
8	โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้าถนนหน้าเมือง ทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่แยกถนนหลวงอนุวัตรไปจนถึงถนนกาญจนาวิถี (ชุมชนหน้าด่าน, ชุมชนโพหวาย,ชุมชนตลาดล่าง)	1,065,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	1,065,000.00	✓	
รวม		1,386,270.00	-	-						292,292.97	1,093,977.03		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
9	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	500,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	500,000.00	✓	
10	โครงการเคาท์ดาวน์/สวัสดีปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67	✓			-	500,000.00	✓	
11	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	1,000,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	5,500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)													
แบบรายงาน 2.1													
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
13	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้า วันเสาร์-อาทิตย์		10,000.00	390,000.00	✓	
14	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้า วันเสาร์-อาทิตย์		32,100.00	467,900.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67	✓			-	2,900,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	2,000,000.00	✓	
รวม		13,300,000.00	-	-						42,100.00	13,257,900.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
17	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ตรวจคุณภาพน้ำทั้งปี		-	200,000.00	✓	
18	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
19	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ลดปริมาณ/คัดแยกขยะ ทั่วไป, กิจกรรมส่งเสริม ลดปริมาณ/คัดแยกขยะรี ไซเคิล, กิจกรรมส่งเสริม ลดปริมาณ/คัดแยกขยะ อันตราย, กิจกรรม ส่งเสริมลดปริมาณ/คัด แยกขยะอินทรีย์ และขอ อนุมัติจัดอบรมโครงการ วันที่ 21 ธ.ค. 2566		-	300,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	5,000,000.00	✓	
รวม		5,700,000.00	-	-						-	5,700,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
21	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		พัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง		-	57,000.00	✓	
22	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67		หารือกำหนดประเภท กีฬา		-	300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี													
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)													
แบบรายงาน 2.1													
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
23	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา (งาน 1 งวด)		-	30,000.00	✓	
24	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด (น้ำพริกเห็ด, เห็ดอบกรอบสมุนไพร)/ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
25	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสวนครัวพอเพียงชุมชนเมือง/ชุมชน หนองบัว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
26	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสร้างสร้งงานพื้นผ้าพัฒนา ศักยภาพชุมชน/ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
27	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพพื้นผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเพชรวิไลล่า	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
28	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
29	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้า Eco Print ผ้าพิมพ์ลาย จากธรรมชาติ/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
30	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร/ ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
31	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
32	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชน ร.25 พัน3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
33	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะและการปัก เลื่อม/ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
34	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนวัด ท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
35	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชน กาญจนวิถีสรรค์	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
36	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าถุงลายไทย/ ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
37	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าหัตถและ กระเป๋ากันแดด/ชุมชนเมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
38	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย ศิลปะเคคูพาจ/ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
39	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
40	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
41	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
42	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
43	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและทำของชำร่วย/ ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
44	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ/ชุมชน ท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
45	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง พื้นบ้าน(ลอบดักกุ้ง ปลา)/ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
46	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและการแปรรูป อาหาร/ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
47	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักผ้าด้วยมุก, เลื่อมลูกปัด, ข้ออ้อยคริสตัล ลงบนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
48	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ชุมชน เปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
49	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
50	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโอเครื่องหอม ยาหม่อง น้ำมันเหลือง จากสมุนไพร/ชุมชนบางกุ้ง3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
51	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม ไส้กรอก ปลา ส้ม/ชุมชนบางกุ้ง2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี													
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)													
แบบรายงาน 2.1													
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
52	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และดอกไม้จันทน์/ชุมชนวัดโพธิ์वास	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
53	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อและกระโปรงมัดย้อม/ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
54	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
55	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้านและน้ำพริก/ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
56	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมกรอบ หมูแดง เป็ดย่างน้ำผึ้ง/ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
57	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสมุนไพรอบไอน้ำเพื่อสุขภาพ/ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
58	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
59	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
60	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
61	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
62	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
63	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม(ต่อเนื่อง 66)/ชุมชนสันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (เสื้อ, ผ้าพัน, หมวก)/ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ต่อเนื่อง 66) /ชุมชนบางกุ้ง1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (ยาหม่องสมุนไพร , ลูกประคบ, สบู่สมุนไพร, ยาสระผมสมุนไพร) /ชุมชนฝั่งบางไผ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกงปักษ์ใต้/ชุมชนในลิ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกจากกะหล่ำ ใตปลาแห้ง/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก (น้ำพริกตาแดง น้ำพริกมันปู ปลาหวาน และกุ้งหวาน) /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)													
แบบรายงาน 2.1													
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมเม็ดขนุน , ขนมทองหยิบ, ขนมเผือกกวน, ขนมถั่วกวน)/ชุมชนหลัง อาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมถ้วย, ขนมสาคุไส้หมู, ข้าวต้มมัด, ขนมทองหยิบ, ขนมทองหยอด, ขนมวันกะทิ)/ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเปียะใส่ไข่เค็ม ลาวา/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าคัดไทย กระเป๋า ราวตรี แขนคัมภีร์/ชุมชนโพธิ์หวาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า/ชุมชนบ้าน บางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดลำลอง/ชุมชน พวงเพชรพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าและ ผ้าถุงปาเต๊ะ/ชุมชนตลาดเกษตร2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเครื่องมือประมง ชายฝั่ง(ต่อเนื่องปี 66)/ชุมชนหาดตายาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Inter Food (อาหาร นานาชาติ)/ชุมชนศรีธานี - ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
90	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,301,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		กำหนดจัดอบรมด้าน สาธารณสุข เดือน ม.ค. 2567 และการศึกษาดู งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนตัวอย่างด้าน สุขภาพต่างพื้นที่ เดือน ก.พ. 2567		-	1,301,600.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
91	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลสำหรับสถานบริการแต่งผม - เสริม สวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ลงพื้นที่เชิญชวนผู้เข้าร่วม โครงการ และกำหนดจัด อบรมผู้ประกอบการ สถานบริการแต่งผม - เสริมสวย พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 20 ธ.ค. 2566		-	80,000.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารใน ยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67	✓			-	50,000.00	✓	
93	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้า ฟ้ามหาวชิราวุธราช สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
94	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	700,000.00	✓	
95	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	150,000.00	✓	
96	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	42,000.00	✓	
97	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับเบี้ยยังชีพทุก ประเภท	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67	✓			-	50,000.00	✓	
98	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	90,000.00	✓	
99	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	80,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
100	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่ สังคมอายุยืน	200,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
101	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	20,000.00	✓	
102	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชน วันที่ 21 พ.ย. 2566		12,000.00	67,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)													
แบบรายงาน 2.1													
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
103	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ดำเนินการสำรวจข้อมูล		-	80,000.00	✓	
104	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารจัดการกลุ่มแกนนำสตรีเทศบาลฯ"		1,250.00	98,750.00	✓	
105	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ		-	399,800.00	✓	
106	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
107	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ 1 การส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม/การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยม		37,250.00	212,750.00	✓	
108	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
109	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
110	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
111	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ประสานงานการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่		544,200.00	255,800.00	✓	
112	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)													
แบบรายงาน 2.1													
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
113	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ส.ค. 67	✓			-	900,000.00	✓	
114	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชน		-	1,350,000.00	✓	
115	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	400,000.00	✓	
116	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งใน การพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	500,000.00	✓	
117	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ เด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	500,000.00	✓	
118	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตร ทบทวน)	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	400,000.00	✓	
119	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	100,000.00	✓	
120	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
121	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ย ผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	25,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	25,000.00	✓	
122	โครงการบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowonce Registration)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	10,000.00	✓	
123	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ลงพื้นที่ทำบัตรให้กับ คนพิการ		-	50,000.00	✓	
124	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และ ชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		อยู่ระหว่างตรวจรับ พัสดุ		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี													
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)													
แบบรายงาน 2.1													
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด							
125	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี และเบิกค่าเช่าเครื่องเสียง		14,000.00	186,000.00	✓	
126	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	800,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการเมื่อมีเหตุ สาธารณสุข		-	800,000.00	✓	
127	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาวไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	1 ก.ค. 67	✓			-	200,000.00	✓	
128	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง เทศกาล	50,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67	✓			-	50,000.00	✓	
129	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมคณะกรรมการ บริหารสภาเด็กฯ		5,000.00	35,000.00	✓	
130	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	4,500,000.00	✓	
131	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	27,500,000.00	✓	
รวม		45,694,600.00	-	-						613,700.00	45,080,900.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
132	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
133	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุ ราษฎร์ธานี	7,700,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		3,830,200.00	3,869,800.00	✓	
134	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		644,600.00	763,400.00	✓	
135	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,144,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		567,600.00	576,400.00	✓	
136	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลาง ใหม่	1,012,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		418,000.00	594,000.00	✓	
137	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพ หวาย	1,540,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		644,600.00	895,400.00	✓	
138	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		268,800.00	259,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
139	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	616,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		279,400.00	336,600.00	✓	
140	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	968,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		517,000.00	451,000.00	✓	
141	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	✓			-	50,000.00	✓	
142	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	✓			-	80,000.00	✓	
143	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประสานสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม		-	100,000.00	✓	
144	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	
145	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		แจ้งความประสงค์จัดหาหนังสือ		-	250,000.00	✓	
146	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67	✓			-	300,000.00	✓	
147	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	5,000.00	✓	
148	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	300,000.00	✓	
149	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	5,000,000.00	✓	
150	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตามหนังสือเชิญ		55,630.00	144,370.00	✓	
151	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	700,000.00	✓	
152	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	48,555,700.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาส 1		3,116,617.04	45,439,082.96	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี													
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)													
แบบรายงาน 2.1													
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
153	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	30,807,100.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียน อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย, งาน นิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาส 1, งานออกระบบฯ อยู่ ระหว่างเบิกจ่ายเป็นงวด		1,555,944.00	29,251,156.00	✓	
154	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	100,000.00	✓	
155	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประธานถุมิต 2	1,429,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	1,429,600.00	✓	
156	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เบิกค่าวัสดุทำข้อสอบ ปลายภาค 1/66		260,120.00	639,880.00	✓	
157	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
158	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	80,000.00	✓	
159	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	1,000,000.00	✓	
160	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
161	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
162	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	500,000.00	✓	
163	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	650,000.00	✓	
164	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67	✓			-	250,000.00	✓	
165	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,700,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66		รอเบิกจ่ายงบประมาณ		-	1,700,000.00	✓	
166	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	5,809,348.00	1,190,652.00	✓	
167	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายใน ปีงบประมาณ		69,450.00	230,550.00	✓	
168	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67	✓			-	350,000.00	✓	
169	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)													
แบบรายงาน 2.1													
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
170	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	300,000.00	✓	
171	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	15,000,000.00	✓	
172	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,130,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	4,130,000.00	✓	
173	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	1,640,500.00	✓	
174	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมหิตลาธิเบศรสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
175	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
176	โครงการอุดหนุนมีสียติอโศกมณฑลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	400,000.00	✓	
177	โครงการจ้างออกแบบเสาประติมากรรมคุณธรรม	60,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67	✓			-	60,000.00	✓	
รวม		138,663,900.00	-	-						18,237,309.04	120,426,590.96		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
178	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
179	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	400,000.00	✓	
180	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	100,000.00	✓	
181	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	530,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	530,000.00	✓	
182	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	300,000.00	✓	
183	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
184	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	40,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
185	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและผลการ ดำเนินโครงการ ประจำเดือน พ.ย. 2566 และประชุม คณะกรรมการติดตามฯ ในวันที่ 9 พ.ย. 2566		3,335.00	26,665.00	✓	
186	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2570) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566		4,150.00	345,850.00	✓	
187	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)		30,015.00	39,985.00	✓	
188	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องใน วันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
189	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	10,000.00	✓	
190	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างหลัก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	✓			-	500,000.00	✓	
191	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR)		-	250,000.00	✓	
รวม		2,940,000.00	-	-						37,500.00	2,902,500.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		207,684,770.00	-	-						19,222,902.01	188,461,867.99		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 21 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 250,648,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 200,368,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	โครง	งบประมา
	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	200,368,000.00	45,726,566.94	2	4,560,000.00	4,172,000.00	7	195,808,000.00	41,554,566.94	-	-	-	-
รวม	9	200,368,000.00	45,726,566.94	2	4,560,000.00	4,172,000.00	7	195,808,000.00	41,554,566.94	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			22.22			77.78			0.00		0.00	

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 50,280,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	โครง	งบประมา
	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	50,280,000.00	-	-	-	-	12	50,280,000.00	-	-	-	-	-
รวม	12	50,280,000.00	-	-	-	-	12	50,280,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			-			100.00			0.00		0.00	

รวม	21	250,648,000.00	45,726,566.94	2	4,560,000.00	4,172,000.00	19	246,088,000.00	41,554,567	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			9.52			90.48			0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกัรัฐ 18/2	1,960,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,700,000.00	260,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนวิลิ 30 ตอน 3	6,200,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65		ส่งงานงวดที่ 1 เนื้องาน 50%		-	6,200,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง เนื้องาน 5%		-	3,500,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	1 ก.ค. 65	31 ต.ค. 65			✓	2,472,000.00	128,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65		บริหารสัญญา เนื้องาน 64%		-	1,800,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง เนื้องาน 7%		-	950,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง เนื้องาน 42%		-	900,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง งานงวดที่ 3		21,608,374.81	45,859,625.19		✓
9	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง งานงวดที่ 3		19,946,192.13	95,043,807.87		✓
รวม		200,368,000.00						45,726,566.94	154,641,433.06		
รวมทุกยุทธศาสตร์		200,368,000.00						45,726,566.94	154,641,433.06		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566		-	8,568,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566		-	1,994,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566		-	1,011,000.00		✓
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566		-	1,865,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566		-	410,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566		-	308,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566		-	218,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566		-	1,372,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	1 ส.ค. 66	31 ธ.ค. 66		เสนอขอความเห็นชอบ แบบบูรณาการงาน ก่อสร้าง		-	7,662,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Over-lay) ถนนโศภนรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง งาม,ชุมชนค่าย อส.)	19,800,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผลงาน 10%		-	19,800,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ทำสัญญาแล้ว รอผู้รับจ้างเข้าทำงาน		-	6,200,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		-	872,000.00		✓
รวม		50,280,000.00						-	50,280,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		50,280,000.00						-	50,280,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
 ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 77 โครงการ
 งบประมาณ 149,312,519 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 23,900,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	23,900,000.00	2,390,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	2,390,000.00	-	-	-	-
รวม	1	23,900,000.00	2,390,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	2,390,000.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,787,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	34,252,000.00	4,879,269.00	13	6,202,000.00	4,879,269.00	13	28,050,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	1,836,678.00	1	2,700,000.00	1,836,678.00	1	2,835,000.00	-	-	-	-	-
รวม	28	39,787,000.00	6,715,947.00	14	8,902,000.00	6,715,947.00	14	30,885,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			50.00			50.00			0.00		0.00	

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 85,625,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	70,518,519.00	992,700.00	2	1,104,000.00	992,700.00	34	69,414,519.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	7,849,000.00	298,000.00	1	527,000.00	298,000.00	5	7,322,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	3	1,600,000.00	100,000.00	-	-	-	3	1,600,000.00	100,000.00	-	-	-	-
รวม	48	85,625,519.00	1,390,700.00	3	1,631,000.00	1,290,700.00	45	83,994,519.00	100,000.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00		6.25			93.75			0.00		0.00	
รวม	77	149,312,519.00	10,496,647.00	17	10,533,000.00	8,006,647.00	60	138,779,519.00	2,490,000.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00		22.08			77.92			0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)												
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
1	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	23,900,000.00	1 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง และเบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว		2,390,000.00	21,510,000.00		✓
รวม		25,000,000.00	23,900,000.00						2,390,000.00	21,510,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,000,000.00	23,900,000.00						2,390,000.00	21,510,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,152,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		เนื้องาน 9% สิ้นหยุด งาน		-	1,152,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	246,000.00		✓
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	39,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	33,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	510,000.00	187,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	100,000.00	12,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	18,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	104,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	41,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	194,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	131,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	410,000.00	161,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สวนหลวง	592,000.00	592,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	435,269.00	156,731.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		จัดทำแบบรูปและ ราคากลาง		-	800,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		จัดทำแบบรูปและ ราคากลาง		-	770,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		อยู่ระหว่างเขียนแบบ แปลน		-	1,710,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ส่งเอกสารจัดซื้อจัด จ้างให้ฝ่ายพัสดุ เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 66		-	1,300,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดทำแบบรูปและ ราคากลาง		-	1,050,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดทำแบบรูปและ ราคากลาง		-	3,200,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ส่งเอกสารจัดซื้อจัด จ้างให้ฝ่ายพัสดุ เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 66		-	2,600,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ส่งเอกสารจัดซื้อจัด จ้างให้ฝ่ายพัสดุ เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 66		-	1,600,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ส่งเอกสารจัดซื้อจัด จ้างให้ฝ่ายพัสดุ เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 66		-	4,600,000.00	✓	
24	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	1 ก.พ. 66	31 ส.ค. 66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจาก 75%		-	3,805,000.00		✓
25	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนวน - หัวแหลมพัฒนา(ทางเข้า ศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	324,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	324,000.00	-	✓	
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ ร้านกำปั่น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		แจ้งผู้รับจ้างลงนาม สัญญาจ้าง		-	1,700,000.00	✓	
รวม		34,876,000.00	34,252,000.00						4,879,269.00	29,372,731.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น												
27	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีภูกษา - อาคารปฐุมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,700,000.00	2,700,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	1,836,678.00	863,322.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
28	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	2,835,000.00		✓
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00						1,836,678.00	3,698,322.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		40,411,000.00	39,787,000.00						6,715,947.00	33,071,053.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กั้นเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน		
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อมทุ่นขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบแปลนเพื่อขออนุญาตเชื่อมต่อทางหลวง		-	660,000.00	✓		
2	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อมทุ่นขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	720,000.00	1 พ.ย. 66	30 เม.ย. 67		ขออนุญาตทำสิ่งล่วงลำน้ำ		-	720,000.00	✓		
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคอนนง จากสี่แยกกอนามัยถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ปรับแก้ไขแบบแปลน		-	9,100,000.00	✓		
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	2,500,000.00	1 มี.ค. 66	30 ก.ย. 66		ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ		-	2,500,000.00		✓	
5	โครงการขยายเขตประปา	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66		จัดทำแบบรูปและราคากลาง		-	1,680,519.00		✓	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการปรับแบบแปลนให้ตรงกับความต้องการของชุมชน		-	187,000.00	✓		
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13	937,000.00	937,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2		-	937,000.00	✓		
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2	555,000.00	555,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	523,300.00	31,700.00		✓	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		จัดทำแบบรูปและราคากลาง		-	4,026,000.00		✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ยกเลิกประกวดราคาจ้าง เนื่องจากปัญหาของระบบ จัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ราคา กลางไม่ถูกต้อง		-	1,854,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	779,000.00	779,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอ การเบิกจ่าย		-	779,000.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตอนนก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำ แบบรูป		-	2,341,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการศึกษา แบบ		-	355,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการศึกษา แบบ		-	1,857,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการศึกษา แบบ		-	1,877,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการศึกษา แบบ		-	1,978,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวดยางงาม)	3,513,000.00	3,513,000.00	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		อยู่ระหว่างการศึกษา แบบแปลนให้ตรงกับ ความต้องการของชุมชน		-	3,513,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24	2,960,000.00	2,960,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		รอจ้างรังวัดสอบแนว เขตที่ดิน		-	2,960,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	4,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1	549,000.00	549,000.00	1 ก.พ. 66	30 ก.ย. 66			✓	469,400.00	79,600.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียน แบบ		-	970,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียน แบบ		-	729,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัดสอบแนว เขตที่ดิน		-	619,000.00	✓	
24	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการเตรียม เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,130,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัดสอบแนว เขตที่ดิน		-	2,927,000.00	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุญาตเชื่อมต่อทาง หลวง		-	929,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัดสอบแนว เขตที่ดิน		-	1,800,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชบุรี แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำราคากลาง		-	2,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
29	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนนค ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	5,000,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง เสร็จงาน 73%		-	900,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัดสอบแนว เขตที่ดิน		-	1,950,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41	436,000.00	436,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างปรับแบบ แปลน		-	436,000.00	✓	
32	โครงการจ้างเหมาผู้ต้องขัง ชุดลอกท่อระบายน้ำ โดยวิธีจ้างเหมา	2,500,000.00	2,500,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66		ดำเนินการลอกท่อ ระบายน้ำตามแผนงาน		-	2,500,000.00		✓
33	โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็กถนนปากน้ำ บริเวณหน้า หมู่บ้านเสาวลักษณ์ 1 (ชุมชนบางกุ้ง)	350,000.00	350,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดทำแบบสรุปรายการ		-	350,000.00	✓	
34	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ขอความอนุเคราะห์ ส่วนควบคุมการ ก่อสร้างประมาณการ ฐานรากเสาไฟ High Mast		-	2,250,000.00	✓	
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล ช่วงที่ 2 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	5,800,000.00	5,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำแบบสรุปรายการ		-	5,800,000.00	✓	
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ (ชุมชนบางกุ้ง)	2,800,000.00	2,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำแบบสรุปรายการ		-	2,800,000.00	✓	
รวม		74,618,519.00	70,518,519.00						992,700.00	69,525,819.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน		
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
37	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้น ลานเอนกประสงค์บริเวณสะพานริศ	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	500,000.00	✓		
รวม		500,000.00	500,000.00						-	500,000.00			
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
38	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67		คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางใหม่		-	1,795,000.00	✓		
39	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประสานสำนักช่าง เพื่อแก้ไข พร.4/5		-	3,363,000.00	✓		
รวม		5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
40	โครงการก่อสร้างอ่างล้างภาอาหารนักเรียน	365,000.00	365,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลาง		-	365,000.00	✓	
41	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนถุมิต ๒,๓ อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลาง		-	1,157,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		ลงนามสัญญา เมื่อ วันที่ 20 พ.ย. 2566		-	1,700,000.00	✓	
43	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3	527,000.00	527,000.00	1 ธ.ค. 65	30 ก.ย. 66			✓	298,000.00	229,000.00		✓
44	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	100,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66		รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน		-	100,000.00		✓
45	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		คณะกรรมการจัดทำ รูปแบบการงานก่อสร้าง		-	4,000,000.00	✓	
รวม		7,849,000.00	7,849,000.00						298,000.00	7,551,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
46	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	250,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุให้แก้ไขงาน และส่งมอบงานอีกครั้ง		100,000.00	150,000.00	✓	
47	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และ กำหนดแบบรายงาน พร้อมจัดส่งคณะกรรมการ		-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กั้นเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
48	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		พัสดุแจ้งเร่งรัดสำนักช่างเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2566		-	850,000.00	✓	
รวม		1,600,000.00	1,600,000.00						100,000.00	1,500,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		89,725,949.00	85,625,519.00						1,390,700.00	84,234,819.00		
