



รายงานติดตาม

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)



คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีและประจำปีไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพร่วมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



สารบัญ



หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

หน้า 6

รายงานผลการดำเนินโครงการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

หน้า 7

รายงานผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

หน้า 11

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

หน้า 34


บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ที่ถ่ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

หน้า 38

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

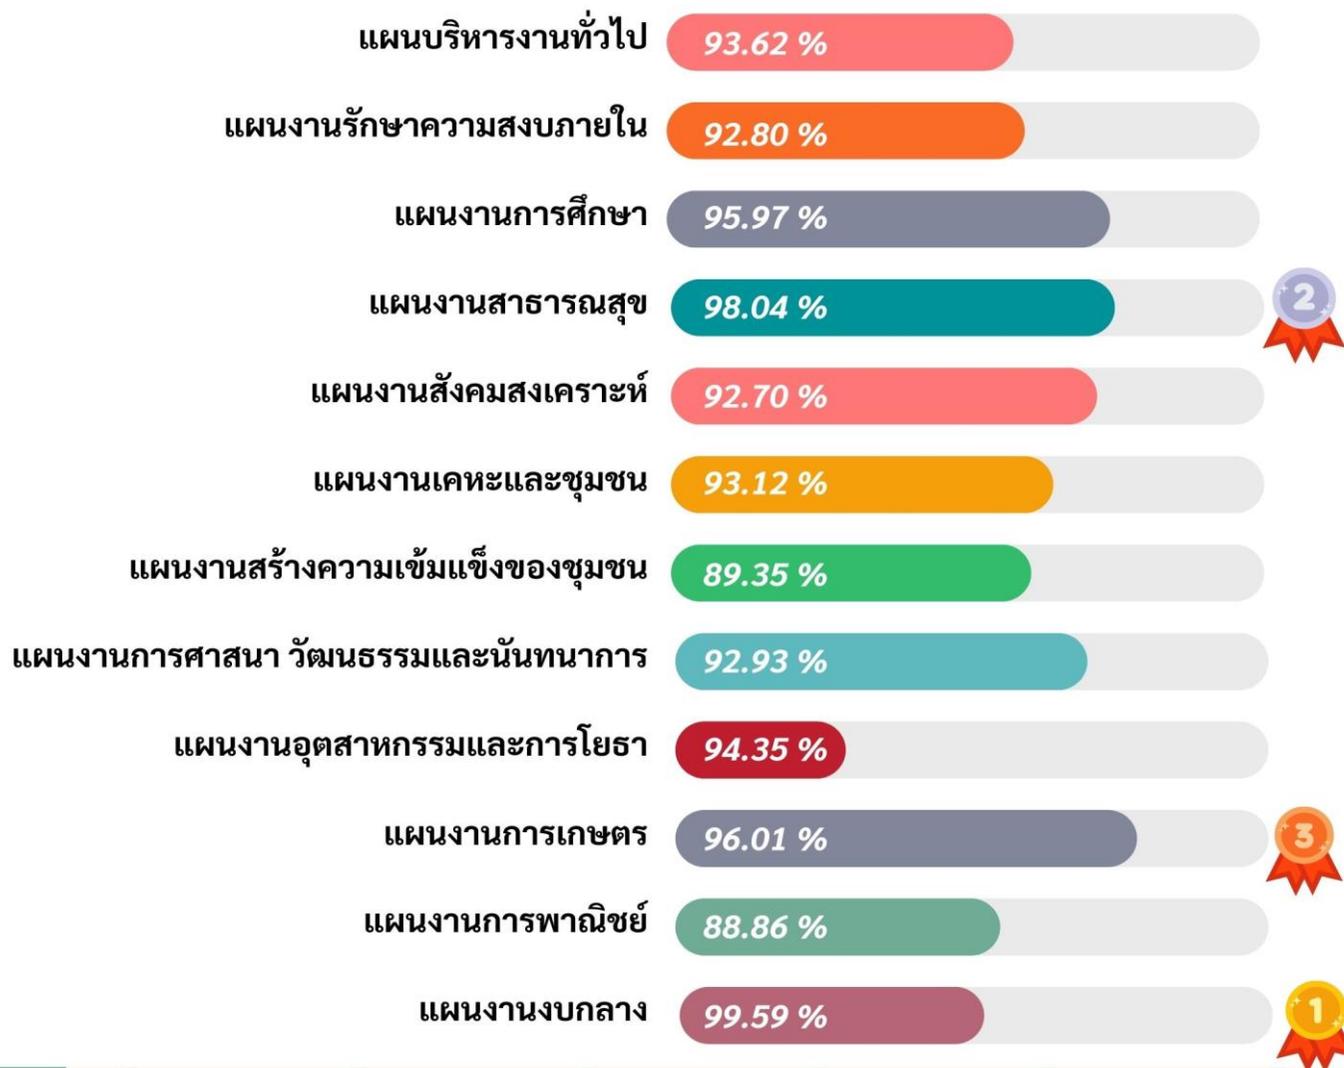

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)



เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4/2567

- > รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด)
- > งบลงทุน ร้อยละ 100 (ของงบลงทุนทั้งหมด)
- > การเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	141,265,840.00	23,449,680.00	12,927,621.69	33,301,925.70	108,807,459.51	9,678,513.10	93.62	
	รายจ่ายประจำ	140,227,790.00	21,150,050.00	12,927,621.69	31,602,225.70	107,171,279.51	9,676,713.10	93.48	
	- งานบริหารทั่วไป	94,472,800.00	16,839,750.00	8,564,548.67	31,284,713.75	67,332,693.49	4,130,594.09		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,591,600.00	88,500.00	206,780.00	148,200.00	3,993,850.83	331,269.17		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	40,272,000.00	4,201,800.00	3,901,031.69	164,311.95	35,324,994.52	5,083,461.84		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	891,390.00	20,000.00	255,261.33	5,000.00	519,740.67	131,388.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,038,050.00	2,299,630.00	-	1,699,700.00	1,636,180.00	1,800.00	99.95	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	1,038,050.00	1,962,730.00	-	1,556,800.00	1,442,180.00	1,800.00		
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	-	37,700.00	-	-	37,700.00	-		
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	-	299,200.00	-	142,900.00	156,300.00	-		สป./กองยุทธฯ/กจ.
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	33,067,900.00	2,040,500.00	7,174,416.52	1,116,769.28	24,807,265.84	2,009,948.36	92.80	
	รายจ่ายประจำ	33,026,400.00	1,854,500.00	7,162,416.52	1,116,769.28	24,591,765.84	2,009,948.36	92.75	
	- งานเทศกิจ	10,877,200.00	300,000.00	1,851,213.40	9,820.48	9,005,007.95	311,158.17		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,526,600.00	819,000.00	4,075,703.12	1,070,803.80	12,511,153.99	687,939.09		
	- งานจราจร	4,622,600.00	735,500.00	1,235,500.00	36,145.00	3,075,603.90	1,010,851.10		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	41,500.00	186,000.00	12,000.00	-	215,500.00	-	100.00	
	- งานเทศกิจ	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ครุภัณฑ์)	41,500.00	156,000.00	12,000.00	-	185,500.00	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	315,744,300.00	9,849,625.00	13,312,882.39	6,567,437.30	293,137,267.51	12,576,337.80	95.97	
	รายจ่ายประจำ	315,179,300.00	9,695,225.00	13,312,882.39	6,567,437.30	292,419,867.51	12,574,337.80	95.96	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,123,100.00	78,845.00	876,129.25	3,300.00	5,732,630.39	1,589,885.36		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	172,264,500.00	7,135,380.00	8,888,784.30	6,518,352.30	158,732,759.24	5,259,984.16		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	128,350,800.00	2,480,000.00	2,662,701.84	43,200.00	122,836,998.55	5,287,899.61		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,440,900.00	1,000.00	885,267.00	2,585.00	5,117,479.33	436,568.67		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	565,000.00	154,400.00	-	-	717,400.00	2,000.00	99.72	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	26,600.00	-	-	26,600.00	-		
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	565,000.00	41,700.00	-	-	605,900.00	800.00		
	- งานมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	9,000.00	-	-	8,700.00	300.00		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	77,100.00	-	-	76,200.00	900.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,042,600.00	1,202,288.00	4,306,427.16	179,106.34	61,525,736.60	1,233,617.90	98.04	
	รายจ่ายประจำ	65,622,200.00	1,181,788.00	4,291,427.16	179,106.34	61,099,836.60	1,233,617.90	98.03	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,074,500.00	233,720.00	826,128.74	38,800.00	8,332,401.96	110,889.30		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,364,700.00	442,193.00	2,486,393.32	77,811.80	15,599,782.80	642,905.08		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,183,000.00	505,875.00	978,905.10	62,494.54	37,167,651.84	479,823.52		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	420,400.00	20,500.00	15,000.00	-	425,900.00	-	100.00	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	71,400.00	20,500.00	-	-	91,900.00	-		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	349,000.00	-	15,000.00	-	334,000.00	-		
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,783,390.00	51,000.00	452,227.00	16,550.00	10,534,450.98	831,162.02	92.70	
	รายจ่ายประจำ	11,756,690.00	51,000.00	452,227.00	16,550.00	10,507,750.98	831,162.02	92.68	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,960,700.00	20,000.00	314,920.00	-	4,489,982.07	175,797.93		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,795,990.00	31,000.00	137,307.00	16,550.00	6,017,768.91	655,364.09		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายการเพื่อการลงทุน	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-	-	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(ครุภัณฑ์)	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-	-	สำนักช่าง
6	แผนงานเคหะและชุมชน	185,454,570.00	32,762,730.37	12,242,697.89	31,424,474.00	160,388,719.22	14,161,409.26	93.12	
	รายการประจำ	160,454,570.00	32,740,890.37	12,242,697.89	6,420,134.00	160,371,219.22	14,161,409.26	92.17	
	- งานไฟฟ้าและประปา	321,270.00	-	-	-	321,233.26	36.74	-	สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,119,800.00	2,496,879.00	580,136.00	9,820.54	11,457,671.81	569,050.65	-	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	131,277,300.00	23,325,011.37	7,883,401.89	6,365,723.46	128,773,053.21	11,580,132.81	-	สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	18,736,200.00	6,919,000.00	3,779,160.00	44,590.00	19,819,260.94	2,012,189.06	-	สำนักช่าง
	รายการเพื่อการลงทุน	25,000,000.00	21,840.00	-	25,004,340.00	17,500.00	-	100.00	
	- งานสวนสาธารณะ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	สช. / สธ.
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	20,000,000.00	21,840.00	-	20,004,340.00	17,500.00	-	-	สช. / สธ.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,726,600.00	473,276.00	925,096.90	-	16,328,075.41	1,946,703.69	89.35	
	รายการประจำ	18,726,600.00	473,276.00	925,096.90	-	16,328,075.41	1,946,703.69	89.35	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	18,726,600.00	473,276.00	925,096.90	-	16,328,075.41	1,946,703.69	-	กองสวัสดิการสังคม
	รายการเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	25,594,500.00	1,912,490.40	936,860.58	1,053,807.11	23,636,543.24	1,879,779.47	92.93	
	รายการประจำ	25,525,000.00	1,870,490.40	936,860.58	1,022,907.11	23,557,043.24	1,878,679.47	92.90	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,767,400.00	690,000.00	120,000.00	78,590.00	7,828,346.94	1,430,463.06	-	สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,487,900.00	11,000.00	104,000.00	907,917.11	11,140,204.60	346,778.29	-	
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,269,700.00	1,169,490.40	712,860.58	36,400.00	4,588,491.70	101,438.12	-	สำนักปลัดเทศบาล
	รายการเพื่อการลงทุน	69,500.00	42,000.00	-	30,900.00	79,500.00	1,100.00	99.01	
	- งานกีฬาและนันทนาการ (ค่าครุภัณฑ์)	-	32,000.00	-	30,900.00	-	1,100.00	-	
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์)	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,346,390.00	7,368,600.00	12,073,772.00	83,599,633.28	53,789,800.14	8,251,784.58	94.33	
	รายจ่ายประจำ	57,412,740.00	6,134,500.00	10,553,772.00	253,083.28	49,707,424.94	3,032,959.78	94.28	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	7,341,300.00	336,000.00	708,700.00	9,200.00	6,125,921.62	833,478.38		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	50,071,440.00	5,798,500.00	9,845,072.00	243,883.28	43,581,503.32	2,199,481.40		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	92,933,650.00	1,234,100.00	1,520,000.00	83,346,550.00	4,082,375.20	5,218,824.80	94.37	
	- งานบริหารทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์)	-	89,700.00	-	-	89,700.00	-		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	26,578,450.00	315,400.00	455,000.00	18,361,450.00	3,154,400.00	4,923,000.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	66,355,200.00	829,000.00	1,065,000.00	64,985,100.00	838,275.20	295,824.80		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	6,699,900.00	245,000.00	726,118.00	67,000.00	5,903,492.14	248,289.86	96.01	
	รายจ่ายประจำ	6,699,900.00	245,000.00	726,118.00	67,000.00	5,903,492.14	248,289.86	96.01	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,699,900.00	245,000.00	726,118.00	67,000.00	5,903,492.14	248,289.86		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,296,200.00	643,760.00	350,629.64	4,500.00	3,185,017.76	399,812.60	88.86	
	รายจ่ายประจำ	3,296,200.00	643,760.00	350,629.64	4,500.00	3,185,017.76	399,812.60	88.86	
	- งานตลาดสด	651,100.00	-	162,918.76	-	480,920.24	7,261.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,645,100.00	643,760.00	187,710.88	4,500.00	2,704,097.52	392,551.60		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกกลาง	241,977,810.00	1,809,000.00	16,379,200.00	184.00	226,468,280.70	939,145.30	99.59	
	รายจ่ายประจำ	241,977,810.00	1,809,000.00	16,379,200.00	184.00	226,468,280.70	939,145.30	99.59	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,200,000,000.00	81,807,949.77	81,807,949.77	157,331,387.01	988,512,109.05	54,156,503.94	95.49	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,079,905,200.00	77,849,479.77	80,260,949.77	47,249,897.01	981,311,053.85	48,932,779.14	95.46	
	รวมงบลงทุน	120,094,800.00	3,958,470.00	1,547,000.00	110,081,490.00	7,201,055.20	5,223,724.80	95.74	

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	116	33.82	1,074,864,043.00	42.79	45	13.12	346,078,918.00	13.78	43	12.54	343,750,918.00	13.68
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	12	3.50	51,143,710.00	2.04	8	2.33	14,119,949.60	0.56	8	2.33	14,119,949.60	0.56
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10	2.92	952,270,000.00	37.91	4	1.17	5,700,000.00	0.23	4	1.17	5,700,000.00	0.23
4	ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพ ชีวิต	122	35.57	96,919,680.00	3.86	111	32.36	45,616,360.00	1.82	105	30.61	45,106,360.00	1.80
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	65	18.95	330,932,700.00	13.17	48	13.99	141,501,220.00	5.63	44	12.83	142,355,358.00	5.67
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	18	5.25	6,010,000.00	0.24	14	4.08	2,581,760.00	0.10	12	3.50	2,056,477.00	0.08
รวมทั้งสิ้น		343	100.00	2,512,140,133.00	100.00	230	67.06	555,598,207.60	22.12	216	62.97	553,089,062.60	22.02


หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ประจำปีไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

● ดำเนินการเสร็จ ● ระหว่างดำเนินการ ● ยังไม่ดำเนินการ ● ยกเลิก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

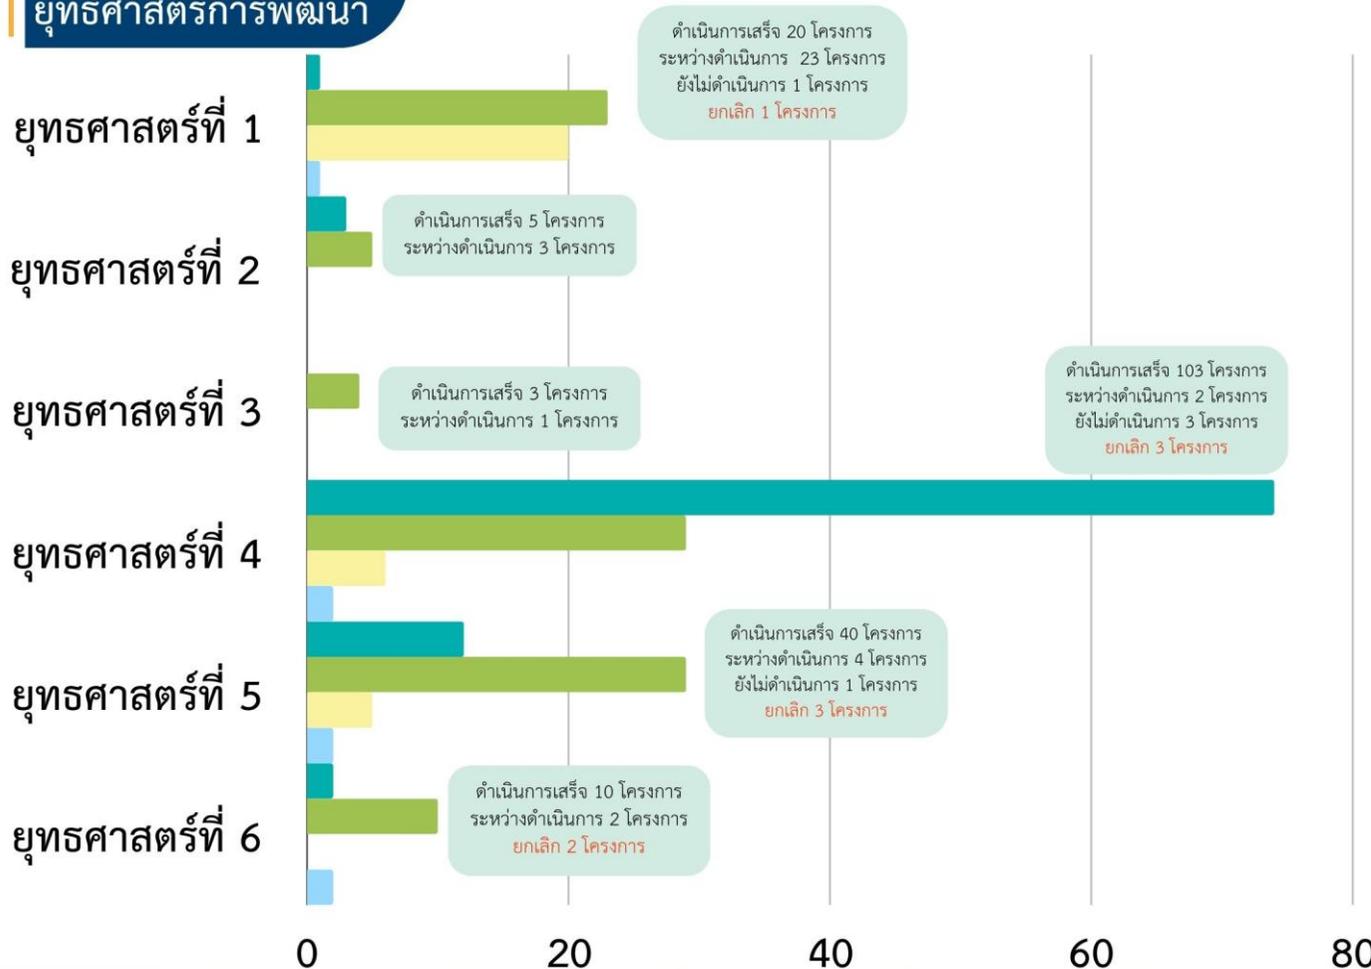

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

หน่วย : ร้อยละ

แผนภูมิแสดง


สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ร้อยละ 78.70 ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 181 โครงการ

ร้อยละ 15.22 อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 35 โครงการ

ร้อยละ 2.17 ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 6 โครงการ

ร้อยละ 3.91 ยกเลิก
จำนวน 9 โครงการ

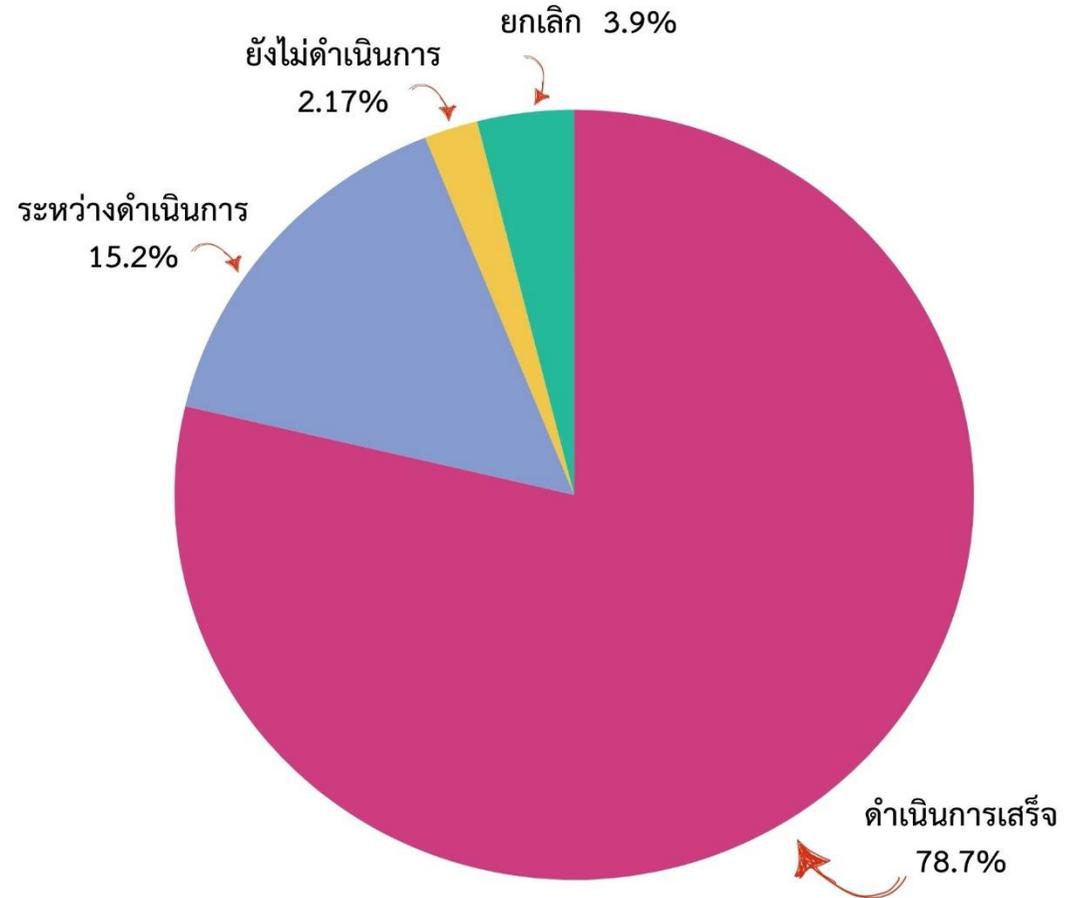

สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีทั้งหมด 230 โครงการ
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 555,195,662.60 (ห้าร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสตางค์)
 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 194 โครงการ งบประมาณ 211,267,014.60 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	1,150,270.00	1,036,423.26	8	1,150,270.00	1,036,423.26	-	-	-	-	-	1	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	14,119,949.60	3,677,549.60	5	3,719,949.60	3,677,549.60	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	5,700,000.00	626,642.00	3	700,000.00	626,642.00	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	111	45,316,360.00	11,213,449.84	103	13,106,360.00	11,213,449.84	2	32,000,000.00	-	3	90,000.00	3	120,000.00
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	48	142,675,358.00	113,949,758.34	40	120,155,258.00	113,949,758.34	4	22,200,100.00	-	1	60,000.00	3	260,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	2,305,077.00	1,025,127.00	10	1,306,477.00	926,327.00	2	750,000.00	98,800.00	-	-	2	248,600.00
รวม	194	211,267,014.60	131,528,950.04	169	140,138,314.60	131,430,150.04	12	70,350,100.00	98,800.00	4	150,000.00	9	628,600.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			87.11			6.19			2.06		4.64
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 344,928,648 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	344,928,648.00	13,700,927.00	12	16,352,000.00	13,700,927.00	23	326,248,648.00	-	1	2,328,000.00	-	-
รวม	36	344,928,648.00	13,700,927.00	12	16,352,000.00	13,700,927.00	23	326,248,648.00	-	1	2,328,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.33			63.89			2.78		0.00
รวมทั้งสิ้น	230	556,195,662.60	145,229,877.04	181	156,490,314.60	145,131,077.04	35	396,598,748.00	98,800.00	5	2,478,000.00	9	628,600.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			78.70			15.22			2.17		3.91

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินงานโครงการที่ถ่ายจาก
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนโกลกรัฐ 19	74,940.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67			✓	74,939.59	0.41		✓
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 31/1	40,700.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67			✓	40,698.52	1.48		✓
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ้อขุนทะเล 13/1/1	44,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67			✓	43,991.98	8.02		✓
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 39/1	37,040.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67			✓	37,031.63	8.37		✓
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี ซอยตรงข้ามวัดโพธิ์นิมิต	33,640.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67			✓	33,631.17	8.83		✓
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี 3	46,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67			✓	45,999.30	0.70		✓
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 18	44,950.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67			✓	44,941.07	8.93		✓
8	โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้า ถนนหน้าเมือง ทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่แยกถนนหลวงอนุวัตร ไปจนถึงถนนกาญจนาวิถี (ชุมชนหน้าด่าน, ชุมชนโพหวาย, ชุมชนตลาดล่าง)	1,065,000.00	-	1,065,000.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ		-	-		
								เนื่องจากไม่ได้รับเงิน สมทบโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567					
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตถนนศรีสุราษฎร์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	829,000.00	-	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67			✓	715,190.00	-		✓
	รวม	1,386,270.00	829,000.00	1,065,000.00						1,036,423.26	36.74		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
10	โครงการยื่นหัวลำ มหาสงกรานต์	500,000.00	1,000,000.00	157,050.40	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			✓	1,342,949.60	-	✓	
11	โครงการเคหาตำบล/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	-	8,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	492,000.00	-	✓	
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	15,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	985,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
13	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67		จัดทำแบบบูรณาการ (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติกันเงิน กรณีมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน)		-	5,500,000.00		✓
14	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	400,000.00	-	✓	
15	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	457,600.00	42,400.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67		จัดทำแบบบูรณาการ (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติกันเงิน กรณีมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน)		-	2,900,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67		จัดทำแบบบูรณาการ (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติกันเงิน กรณีมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน)		-	2,000,000.00		✓
รวม		13,300,000.00	1,000,000.00	180,050.40						3,677,549.60	10,442,400.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
18	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	185,610.00	14,390.00	✓	
19	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	196,510.00	3,490.00	✓	
20	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	244,522.00	55,478.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		จัดทำแบบบูรณาการ (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติกันเงิน กรณีมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน)		-	5,000,000.00	✓	
รวม		5,700,000.00	-	-						626,642.00	5,073,358.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
22	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	52,860.00	4,140.00	✓	
23	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	286,815.00	13,185.00	✓	
24	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	29,998.52	1.48	✓	
25	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด (น้ำพริกเห็ด, เห็ดอบกรอบสมุนไพร/ชุมชนเสรีพล)	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
26	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสวนครัวพอเพียงชุมชน เมือง/ชุมชนหนองบัว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
27	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสร้างสร้งงานพันผ้า พัฒนาศักยภาพชุมชน/ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
28	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพพันผ้า ปาเต๊ะ/ชุมชนเพชรวิลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
29	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวและ สมุนไพรในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
30	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้า Eco Print ผ้าพิมพ์ ลายจากธรรมชาติ/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓
31	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอม อาหาร/ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
32	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชนบ้าน บางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
33	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชน ร.25 พัน3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
34	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะและ การปักเลื่อม/ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
35	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะ/ชุมชน วัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าป่าเต๊ะ/ชุมชน กาญจนวิถีส่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
37	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าถุงลายไทย/ ชุมชนลูกเสือการุณราษฎร์	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
38	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าหมวกและ กระเป๋าจักสานเดคูพาจ/ชุมชนเมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
39	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยศิลปะเดคูพาจ/ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
40	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
41	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
42	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
43	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
44	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและทำของ ชำร่วย/ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
45	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ /ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
46	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง พื้นบ้าน(ลอบดักกุ้ง ปลา)/ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
47	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและการ แปรรูปอาหาร/ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
48	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักผ้าด้วยมุก, เลื่อม ลูกปัด, ข้ออ้อยคริสตัล ลงบนผ้าป่าเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครุ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
49	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์/ ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
50	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์/ ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
51	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องหอม ยาหม่อง น้ำมันเหลือง จากสมุนไพร/ชุมชนบางกุ้ง3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
52	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำแหนม ไส้กรอก ปลาต้ม/ชุมชนบางกุ้ง2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
53	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และดอกไม้จันทน์/ชุมชนวัดโพธิวาส	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
54	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อและกระโปรง มัดย้อม/ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
55	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง ชายฝั่ง/ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
56	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้านและ น้ำพริก/ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
57	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูกรอบ หมูแดง เบียดย่างน้ำผึ้ง/ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
58	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสมุนไพรอบไอน้ำ เพื่อสุขภาพ/ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
59	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน แหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
60	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน เทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
61	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน หลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
62	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน หน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
63	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดใหม่-ตอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ ชุมชนไม่ประสงค์ รับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการ		-	30,000.00		
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม(ต่อเนื่อง 66)/ชุมชนสันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (เสื้อ, ผ้าพัน, หมวก)/ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ต่อเนื่อง 66) /ชุมชนบางกุ้ง1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาหม่องสมุนไพร , ลูกประคบ, สบู่สมุนไพร, ยาสระผมสมุนไพร) /ชุมชนฝั่งบางไปไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกงปักษ์ใต้/ชุมชนในลี้ก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกจากหมูไตปลาแห้ง/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก (น้ำพริกตาแดง น้ำพริกมันปู ปลาหวาน และกุ้งหวาน) /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมเม็ดขนุน, ขนมทองหยิบ, ขนมเผือกกวน, ขนมถั่วกวน)/ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมถ้วย, ขนมสาคุไส้หมู, ข้าวต้มมัด, ขนมทองหยิบ, ขนมทองหยอด, ขนมวันกะทิ)/ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเปียะใส่ไข่เค็มลาวา/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป่าผ้าไทย กระเป่าราตรี แอนดัมเมด/ชุมชนโพหาวย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า/ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดลำลอง/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ กระเป๋า/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าและ ผ้าถุงปาเต๊ะ/ชุมชนตลาดเกษตร2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเครื่องมือ ประมงชายฝั่ง(ต่อเนื่องปี 66)/ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Inter Food (อาหาร นานาชาติ)/ชุมชนศรีธานี - ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
91	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,301,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67			✓	1,197,281.32	104,318.68	✓	
92	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลสำหรับสถานบริการแต่งผม - เสริมสวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	-	13,720.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	66,280.00	-	✓	
93	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสาร ในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67			✓	49,140.00	860.00	✓	
94	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67			✓	199,850.00	150.00	✓	
95	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	17,350.00	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67			✓	682,650.00	-	✓	
96	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ส.ค. 67			✓	78,010.00	71,990.00		✓
97	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	16,448.00	25,552.00	✓	
98	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกประเภท	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67			✓	38,873.00	11,127.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
99	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเข้าถึงช่องทางทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67		ยกเลิกโครงการ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตามที่ได้ กำหนดไว้ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์โครงการ ไม่คุ้มค่า จึงไม่สามารถ ดำเนินการตาม โครงการได้		-	90,000.00		
100	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	80,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	50,860.00	29,140.00	✓	
101	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	200,000.00	-	-	1 มี.ย. 67	31 ส.ค. 67			✓	89,315.00	110,685.00		✓
102	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67			✓	17,510.00	2,490.00	✓	
103	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	67,800.00	11,400.00	✓	
104	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	30,600.00	49,400.00	✓	
105	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	29,000.00	71,000.00	✓	
106	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	277,936.00	121,864.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
107	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	187,287.00	12,713.00	✓	
108	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	152,220.00	97,780.00	✓	
109	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุกกรม่อมหมิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	200,000.00	-	✓	
110	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67			✓	79,225.00	775.00		✓
111	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67			✓	189,275.00	10,725.00	✓	
112	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	15,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	742,585.00	42,415.00		✓
113	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67			✓	49,150.00	850.00	✓	
114	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ส.ค. 67			✓	796,195.00	103,805.00	✓	
115	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	450,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	1,606,665.00	193,335.00	✓	
116	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67			✓	362,425.00	37,575.00		✓
117	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	333,279.00	166,721.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
118	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	16,000.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	445,500.00	38,500.00	✓	
119	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและ หลักสูตรทบทวน)	400,000.00	-	400,000.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67		ยกเลิกโครงการ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจไม่คุ้มค่าในการใช้จ่าย งบประมาณ หากจัดโครงการ		-	-		
120	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	31 ก.ค. 67			✓	90,208.00	9,792.00		✓
121	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	184,675.00	15,325.00	✓	
122	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ย ผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	25,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67			✓	24,900.00	100.00	✓	
123	โครงการบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowance Registration)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67			✓	7,005.00	2,995.00	✓	
124	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	49,717.00	283.00	✓	
125	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67			✓	199,236.00	764.00	✓	
126	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	20,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	148,400.00	31,600.00	✓	
127	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	800,000.00	-	300,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	43,046.00	456,954.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
128	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาขาตไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	1 ก.ค. 67			✓	191,950.00	8,050.00	✓	
129	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง เทศกาล	50,000.00	-	46,170.00	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67			✓	3,830.00	-	✓	
130	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	5,450.00	34,550.00	✓	
131	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแบบแปลนและ ราคากลาง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติกันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน)		-	4,500,000.00	✓	
132	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำราคากลาง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติกันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน)		-	27,500,000.00	✓	
รวม		45,694,600.00	450,000.00	828,240.00						11,213,449.84	34,102,910.16		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
133	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ ร.ร.ในสังกัดไปร่วม แข่งขันกีฬา อบท. ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช		-	80,000.00		
134	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,700,000.00	72,600.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	7,772,600.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
135	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	182,600.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	1,225,400.00	-	✓	
136	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดท่าทอง	1,144,000.00	39,600.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	1,183,600.00	-	✓	
137	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดกลางใหม่	1,012,000.00	-	204,600.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	807,400.00	-	✓	
138	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้าน โพหวาย	1,540,000.00	-	310,200.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	1,229,800.00	-	✓	
139	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	528,000.00	-	✓	
140	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสันติสุข	616,000.00	-	66,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	550,000.00	-	✓	
141	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านบางใหญ่	968,000.00	17,600.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	985,600.00	-	✓	
142	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	49,365.00	635.00	✓	
143	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	30,000.00	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	104,502.00	5,498.00		✓
144	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	71,133.00	28,867.00	✓	
145	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	-	50,000.00	✓	
146	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	250,000.00	-	✓	
147	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67			✓	215,265.00	84,735.00		✓
148	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	5,000.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการ ดังกล่าวตั้งไว้เพื่อ สนับสนุนจังหวัด จังหวัด ไม่ได้ดำเนินการ		-	-		
149	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้า ร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	500,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	735,718.00	64,282.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
150	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	4,259,796.00	740,204.00	✓	
151	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	163,740.00	36,260.00	✓	
152	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	624,248.00	75,752.00	✓	
153	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	48,555,700.00	400,000.00	1,391,400.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	44,954,582.12	2,609,717.88	✓	
154	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	30,807,100.00	3,700,000.00	599,780.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	32,985,277.95	922,042.05	✓	
155	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67			✓	96,065.00	3,935.00	✓	
156	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชานฤมิต 2	1,429,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง (มติสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติกันเงินกรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน)		-	1,429,600.00		✓
157	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	5,662.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	894,338.00	-	✓	
158	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	197,905.00	2,095.00	✓	
159	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67			✓	79,550.00	450.00	✓	
160	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	1,123,800.00	123,800.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	1,998,421.00	1,579.00	✓	
161	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	80,000.00	-	72,100.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	-	7,900.00	✓	
162	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	191,530.00	8,470.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
163	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	32,000.00	1 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67			✓	394,946.00	73,054.00	✓	
164	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	11,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			✓	631,700.00	7,300.00	✓	
165	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	6,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	241,760.00	2,240.00	✓	
166	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,700,000.00	-	10,000.00	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66			✓	1,686,101.50	3,898.50	✓	
167	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	42,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	5,909,256.27	1,048,743.73	✓	
168	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและ พระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	260,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	476,067.50	83,932.50	✓	
169	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	350,000.00	-	✓	
170	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	766,856.00	33,144.00	✓	
171	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	120,000.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ มีภารกิจงานที่ซ้ำซ้อน ในห้วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2567		-	180,000.00		
172	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติกันเงิน กรณีมีได้ก่อนผูกพัน)		-	15,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
173	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	4,130,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67				-	4,130,000.00	✓	
174	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67				-	1,640,500.00		✓
175	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
176	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
177	โครงการอุดหนุนมัสยิดอิกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	400,000.00	-	✓	
178	โครงการจ้างออกแบบเสาประติมากรรมคุณธรรม	60,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67	✓			-	60,000.00		✓
179	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตาม หลักสูตรพื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	850,000.00	-	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67			✓	601,235.00	248,765.00	✓	
180	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	200,000.00	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67			✓	138,000.00	62,000.00	✓	
รวม		138,663,900.00	7,193,600.00	3,182,142.00						113,949,758.34	28,725,599.66		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
181	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67			✓	53,455.00	26,545.00		✓
182	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	254,700.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	145,300.00	-	✓	
183	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เทศบาลฯได้ใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE ซึ่งรองรับการสืบค้นข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินระหว่างกองสารสนเทศฯกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นสามารถเข้าใช้ระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง จึงยกเลิก		-	100,000.00		
184	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	530,000.00	-	21,840.00	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67			✓	351,575.00	156,585.00	✓	
185	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	151,400.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เทศบาลฯได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE แทน LTAX 3000 Verion 4 ซึ่งมีความทันสมัยมากกว่า จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการ จึงยกเลิก		-	148,600.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	56,400.00	43,600.00	✓	
187	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	40,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	-	40,000.00	✓	
188	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	21,525.00	8,475.00	✓	
189	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	85,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	193,640.00	71,360.00	✓	
190	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	36,415.00	33,585.00	✓	
191	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	21,983.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			✓	58,017.00	-	✓	
192	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	10,000.00	-	✓	
193	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้า ดำเนินการได้ เนื่องจากมี การติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์งาน ประเพณีชักพระ (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	500,000.00		✓
194	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ผู้รับจ้างดำเนินการตาม สัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ต.ค. 2567 (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		98,800.00	151,200.00	✓	
รวม		2,940,000.00	-	634,923.00						1,025,127.00	1,279,950.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		207,684,770.00	9,472,600.00	5,890,355.40						131,528,950.04	79,624,254.56		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันติสุข	1,163,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	788,373.00	374,627.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันติสุข แยกขวา 1	3,255,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	2,205,126.00	1,049,874.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		เตรียมเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	8,905,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		เตรียมเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	2,000,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	2,328,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		เตรียมเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	947,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		เตรียมเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	495,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง		-	8,070,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		เตรียมเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	3,490,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม 2/1 เชื่อมถนนกาญจนาภิเษก 7	1,980,000.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	1,715,000.00	265,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	1,200,000.00	✓	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	1,250,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	749,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,555,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,896,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	645,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	557,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,820,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุสมจิตรเทรดเตอร์)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	386,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	3,510,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนศรีเกษม ซอยข้างอุฎีวิทยุทเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
22	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	19,800,778.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนการุณราชบุรี	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	70,998,138.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	184,347,732.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 38	925,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	795,059.25	129,940.75		✓
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 38 ซอย 1,2	864,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	743,331.00	120,669.00		✓
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 3	376,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	302,103.75	73,896.25		✓
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 5	669,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	537,262.50	131,737.50		✓
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 7	646,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	518,816.25	127,183.75		✓
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9	1,518,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	1,219,823.25	298,176.75		✓
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยพันธุ์ธนา	369,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	318,339.00	50,661.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยพันธุ์ไม้	211,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	181,908.00	29,092.00		✓
33	โครงการขุดประตูดิเรกพระเกียรติพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	4,376,000.00	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67			✓	4,375,785	215.00		✓
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา เนื้อหา 20%		-	1,535,000.00		✓
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา เนื้อหา 20%		-	2,082,000.00		✓
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนดอนนก STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา เนื้อหา 20%		-	4,510,000.00		✓
รวม		344,928,648.00						13,700,927.00	331,227,721.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		344,928,648.00						13,700,927.00	331,227,721.00		

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **21 โครงการ**
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น **250,648,000 บาท** (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 200,368,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	200,368,000.00	81,039,739.11	7	17,910,000.00	14,549,432.00	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-
รวม	9	200,368,000.00	81,039,739.11	7	17,910,000.00	14,549,432.00	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			77.78			22.22		0.00		0.00	

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 50,280,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	50,280,000.00	27,899,489	10	43,208,000.00	27,899,489.00	2	7,072,000.00	-	-	-	-
รวม	12	50,280,000.00	27,899,489	10	43,208,000.00	27,899,489.00	2	7,072,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			83.33			16.67		0.00		0.00	

รวม	21	250,648,000.00	108,939,228.11	17	61,118,000.00	42,448,921.00	4	189,530,000.00	66,490,307	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			80.95			19.05		0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนโกลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,700,000.00	260,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	5,910,000.00	290,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,236,000.00	2,264,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	1 ก.ค. 65	31 ต.ค. 65			✓	2,472,000.00	128,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	1,490,000.00	310,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	947,500.00	2,500.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	793,932.00	106,068.00		✓
8	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้างเบิกจ่ายงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567		38,465,580.02	29,002,419.98		✓
9	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้างเบิกจ่ายงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567		28,024,727.09	86,965,272.91		✓
รวม		200,368,000.00						81,039,739.11	119,328,260.89		
รวมทุกยุทธศาสตร์		200,368,000.00						81,039,739.11	119,328,260.89		

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	6,139,000.00	2,429,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	1,332,296.00	661,704.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	675,502.00	335,498.00		✓
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	1,246,104.00	618,896.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	273,942.00	136,058.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	205,790.00	102,210.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	145,656.00	72,344.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66			✓	916,710.00	455,290.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	1 ส.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	5,295,489	2,366,511.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Over-lay) ถนนโกลกรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง งาม,ชุมชนค่าย อส.)	19,800,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	11,669,000.00	8,131,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากแยกตาดำป่านช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน เนื่องจากรอผลทดสอบ วัสดุ		-	6,200,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผู้รับจ้าง ยังไม่เข้าดำเนินการ		-	872,000.00		✓
รวม		50,280,000.00						27,899,489.00	22,380,511.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		50,280,000.00						27,899,489.00	22,380,511.00		

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 77 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 149,312,519 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 23,900,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	23,900,000.00	23,900,000.00	1	23,900,000.00	23,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1	23,900,000.00	23,900,000.00	1	23,900,000.00	23,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			100.00			0.00			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,787,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	34,252,000.00	14,283,616.99	19	19,272,000.00	14,283,616.99	6	14,210,000.00	-	-	-	1	770,000.00
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	4,295,609.00	2	5,535,000.00	4,295,609.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	28	39,787,000.00	18,579,225.99	21	24,807,000.00	18,579,225.99	6	14,210,000.00	-	-	-	1	770,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			75.00			21.43			0.00		3.57

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 85,625,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	70,518,519.00	13,576,200.89	11	18,106,000.00	13,576,200.89	22	45,219,519.00	-	-	-	3	7,193,000.00
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	500,000.00	480,000.00	1	500,000.00	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	7,849,000.00	2,217,000.00	4	2,692,000.00	2,217,000.00	2	5,157,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	3	1,600,000.00	750,000.00	2	750,000.00	750,000.00	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	48	85,625,519.00	17,023,200.89	18	22,048,000.00	17,023,200.89	27	56,384,519.00	-	-	-	3	7,193,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			37.50			56.25			0.00		6.25
รวม	77	149,312,519.00	59,502,426.88	40	70,755,000.00	59,502,426.88	33	70,594,519.00	-	-	-	4	7,963,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			51.95			42.86			0.00		5.19

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
1	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	23,900,000.00	1 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65			✓	23,900,000.00	-		✓
รวม		25,000,000.00	23,900,000.00						23,900,000.00	0.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,000,000.00	23,900,000.00						23,900,000.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,152,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	1,152,000.00	-		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	3,650,000.00	113,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	246,000.00		✓
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	39,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	33,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	510,000.00	187,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	100,000.00	12,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	18,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	104,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	41,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	194,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	131,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	410,000.00	161,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสวนหลวง	592,000.00	592,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	435,269.00	156,731.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		บริหารสัญญา ผลงาน 40% (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	800,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ยกเลิกการประกวดราคา (สิ้นสุดการขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน โครงการ เป็นอันพับไป)		-	770,000.00		
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพูนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	1,710,000.00		✓
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	1,300,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	1,050,000.00	-		✓
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ (กันเงินกรณีที่มีการก่องหนผู้กัพนไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)		-	3,200,000.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 5% (กันเงินกรณีที่มีการก่องหนผู้กัพนไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)		-	2,600,000.00		✓
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	1,324,347.99	275,652.01		✓
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 70% (กันเงินกรณีที่มีการก่องหนผู้กัพนไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)		-	4,600,000.00		✓
24	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	1 ก.พ. 66	31 ส.ค. 66			✓	1,330,000.00	2,475,000.00		✓
25	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	324,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	324,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ร้านค้าปิ่น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	898,000.00	802,000.00		✓
รวม		34,876,000.00	34,252,000.00						14,283,616.99	19,968,383.01		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น												
27	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพฤษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	2,700,000.00	2,700,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	1,836,678.00	863,322.00		✓
28	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพฤษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	2,835,000.00	2,835,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	2,458,931.00	376,069.00		✓
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00						4,295,609.00	1,239,391.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		40,411,000.00	39,787,000.00						18,579,225.99	21,207,774.01		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมทุ่นขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายการ ครั้งที่ 2 (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	660,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมทุ่นขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	720,000.00	1 พ.ย. 66	30 เม.ย. 67		ยกเลิกโครงการ ที่ดินริมฝั่งคลองมีพื้นที่ คาบเกี่ยวกับที่ดินของ เอกชน เจ้าของที่ดินไม่ ยินยอมให้ใช้พื้นที่		-	720,000.00		
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนตอนนอก จากสี่แยกคอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	9,100,000.00		✓
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	2,500,000.00	1 มี.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	2,500,000.00	-		✓
5	โครงการขยายเขตประปา	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผลงาน 10% (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	1,680,519.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	187,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13	937,000.00	937,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	678,000.00	259,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2	555,000.00	555,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	523,300.00	31,700.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		รอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	4,026,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	1,854,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	779,000.00	779,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	710,000.00	69,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังอนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ รูปรายการ (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	2,341,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขั้นตอน การตรวจรับงาน (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	355,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายการ ก่อสร้าง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	1,857,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายการ ก่อสร้าง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	1,877,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	1,978,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวยยางงาม)	3,513,000.00	3,513,000.00	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากระดับความลึก ของบ่อพักที่ไปเชื่อมต่อ เพื่อระบายน้ำมีความลึก น้อยทำให้มีความจำเป็นต้อง ยกระดับถนนบริเวณหน้า หมู่บ้านอย่างน้อย 0.80 เมตร แต่คณะกรรมการหมู่บ้าน มีมติไม่เห็นชอบกับการ ดำเนินการดังกล่าว		-	3,513,000.00		
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24	2,960,000.00	2,960,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ตรวจสอบ แนวเขตทางแล้ว มีบางส่วน ยังไม่เป็นสาธารณะ		-	2,960,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	4,000,000.00		✓
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนปากน้ำ 8/1	549,000.00	549,000.00	1 ก.พ. 66	30 ก.ย. 66			✓	469,400.00	79,600.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	970,000.00		✓
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	729,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนกาญจนาวิถี 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	619,000.00		✓
24	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการเตรียม เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	1,130,000.00		✓
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	2,927,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกัรฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำราคา กลาง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	929,000.00		✓
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการเตรียม เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	1,800,000.00		✓
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชูร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ (กันเงินกรณีที่มีกรก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	2,000,000.00		✓
29	โครงการขยายผิวจราจรถนนดอนนก ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	5,000,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	868,244.11	31,755.89		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		บริหารสัญญา เนื้องาน 30% (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	1,950,000.00		✓
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนตลาดล่าง 41	436,000.00	436,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	436,000.00	-		✓
32	โครงการจ้างเหมาผู้ต้องขัง ขุดลอกท่อระบายน้ำ โดยวิธีจ้างเหมา	2,500,000.00	2,500,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	1,499,856.78	1,000,143.22		✓
33	โครงการขยายฝิวจากรแบบคอนกรีต เสริมเหล็กถนนปากน้ำ บริเวณหน้า หมู่บ้านเสาวลักษณ์ 1 (ชุมชนบางกุ้ง)	350,000.00	350,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	301,400.00	48,600.00		✓
34	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา เนื้องาน 30% (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	2,250,000.00		✓
35	โครงการปรับปรุงฝิวจากรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล ช่วงที่ 2 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	5,800,000.00	5,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	3,690,000.00	2,110,000.00		✓
36	โครงการปรับปรุงฝิวจากรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ (ชุมชนบางกุ้ง)	2,800,000.00	2,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,900,000.00	900,000.00		✓
รวม		74,618,519.00	70,518,519.00						13,576,200.89	56,942,318.11		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
37	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้น ลานอเนกประสงค์บริเวณสะพานริศ	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	480,000.00	20,000.00		✓
รวม		500,000.00	500,000.00						480,000.00	20,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
38	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67		จัดทำราคากลางใหม่ (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	1,795,000.00		✓
39	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำราคากลางใหม่ (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	3,363,000.00		✓
รวม		5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
40	โครงการก่อสร้างอ่างล้างภาอาหารนักเรียน	365,000.00	365,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	159,000.00	206,000.00	✓	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
41	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนถุมิต 2,3 อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		เปลี่ยนแปลงแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)		-	1,157,000.00		✓
42	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตริมวิทยา)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,660,000.00	40,000.00		✓
43	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3	527,000.00	527,000.00	1 ธ.ค. 65	30 ก.ย. 66			✓	298,000.00	229,000.00		✓
44	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	100,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	100,000.00	-		✓
45	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม (กันเงินกรณีที่มีการก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ)		-	4,000,000.00	✓	
รวม		7,849,000.00	7,849,000.00						2,217,000.00	5,632,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
46	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	250,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	250,000.00	-	✓	
47	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67			✓	500,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
48	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำราคากลางใหม่ (มติสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 ก.ย. 2567 อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน)		-	850,000.00		✓
รวม		1,600,000.00	1,600,000.00						750,000.00	850,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		89,725,949.00	85,625,519.00						17,023,200.89	68,602,318.11		
