

รายงานติดตาม

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประจำเดือน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)



DOWNLOAD



รวบรวมโดย : งานวิจัยและประเมินผล



คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป





สารบัญ

หน้า
2

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

หน้า
3

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินงานโครงการในภาพรวม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

หน้า
4

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

หน้า
31

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566
ที่จ่ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

หน้า
39

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)



รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ร้อยละ
5.74

ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 14 โครงการ

ร้อยละ
41.80

อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 102 โครงการ

ร้อยละ
52.46


ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 128 โครงการ

ร้อยละ
-

ยกเลิก
จำนวน - โครงการ




สถานะการดำเนินโครงการ

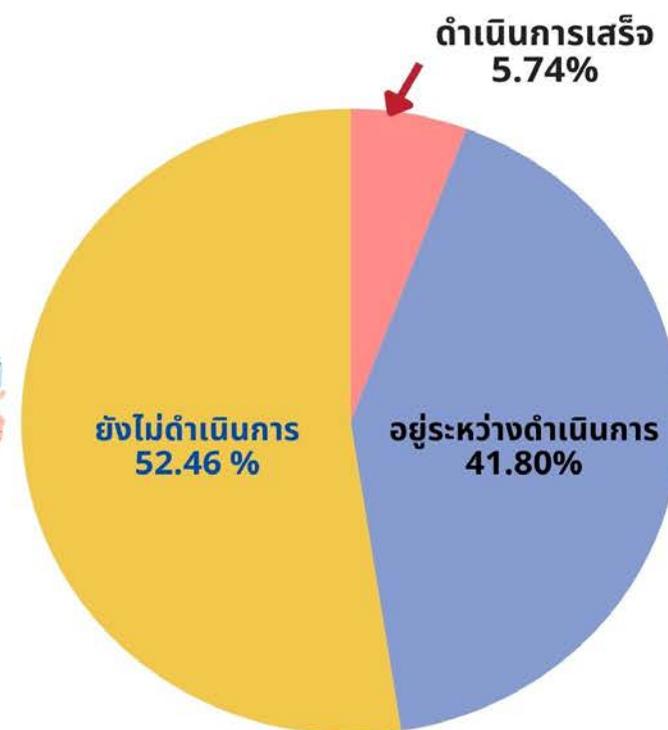

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


หน่วย : โครงการ

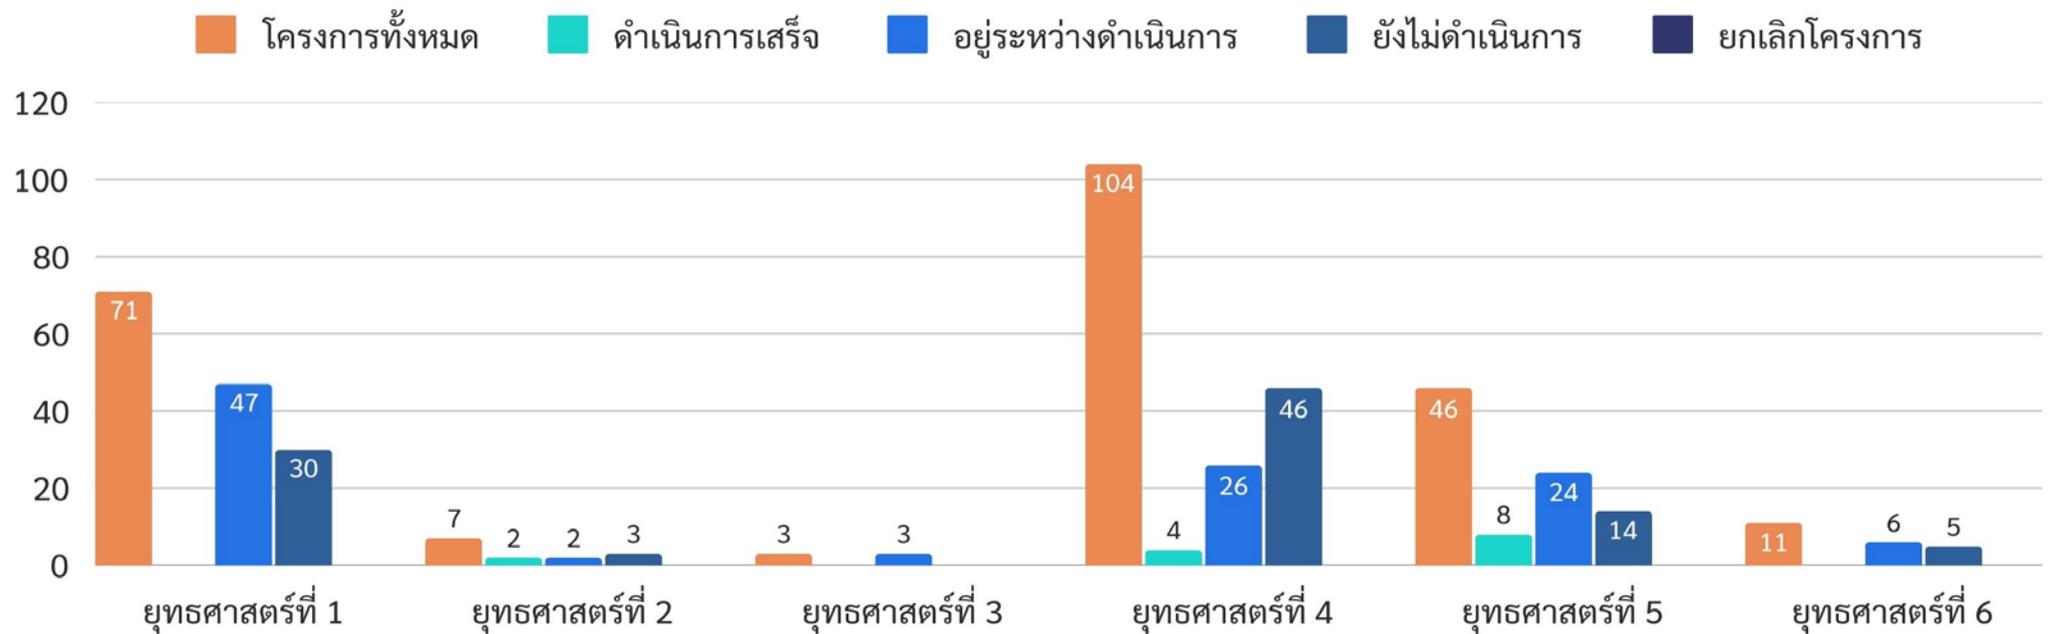

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

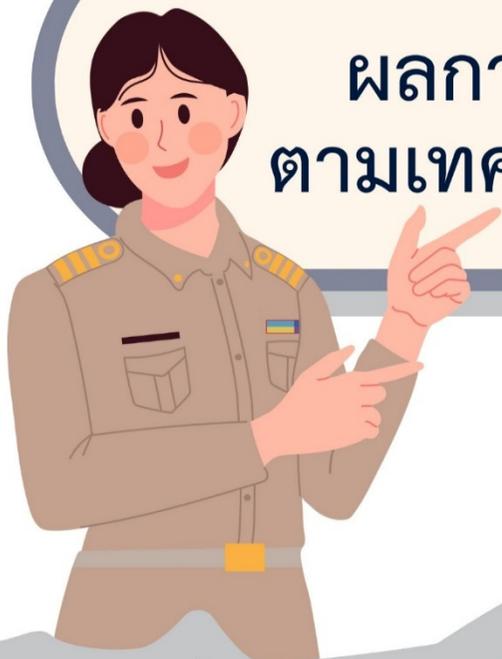

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 244 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 418,516,710 บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 219 งบประมาณ 244,710,710 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46	65,962,710.00	497,657.00	-	-	-	31	57,845,710.00	497,657.00	15	8,117,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	6,200,000.00	2,463,225.00	2	2,330,000.00	2,323,600.00	2	670,000.00	139,625.00	3	3,200,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	900,000.00	2,008.00	-	-	-	3	900,000.00	2,008.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	106	14,197,900.00	3,770,629.00	4	2,049,200.00	1,996,044.00	26	7,833,700.00	1,774,585.00	76	4,315,000.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	134,345,100.00	55,010,244.00	8	4,910,700.00	4,804,853.00	24	124,349,400.00	50,205,391.00	14	5,085,000.00	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	23,105,000.00	91,572.00	-	-	-	6	2,800,000.00	91,572.00	5	20,305,000.00	-	-
รวม	219	244,710,710.00	61,835,335.00	14	9,289,900.00	9,124,497.00	92	194,398,810.00	52,710,838.00	113	41,022,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			6.39			42.01			51.60		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 173,806,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	173,806,000.00	-	-	-	-	10	168,881,000.00	-	15	4,925,000.00	-	-
รวม	25	173,806,000.00	-	-	-	-	10	168,881,000.00	-	15	4,925,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			40.00			60.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	244	418,516,710.00	61,835,335.00	14	9,289,900.00	9,124,497.00	102	363,279,810.00	52,710,838.00	128	45,947,000.00	0	0.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			5.74			41.80			52.46		0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่า ไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง		-	15,920,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี 20 ช่วง 2	528,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง		-	528,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนการบินไทย	769,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	769,000.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก	7,187,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		จัดทำ TOR และ ราคาในระบบ e-GP คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		-	7,187,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2 แยกขวา 1	761,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		จัดทำ TOR และ ราคาในระบบ e-GP คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		-	761,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 39	580,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	580,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 35	921,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	921,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าผาง	462,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	462,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	571,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68		รอยยกเลิกโครงการ		-	571,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 25	2,723,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง		-	2,723,000.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเรือแจวเก่า	436,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	436,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีพูนพิณ	1,137,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	1,137,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 21	7,485,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68		รอลงนาม ในสัญญาจ้าง		-	7,485,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 4	189,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	189,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 6	419,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	419,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2	1,402,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		จัดทำ TOR และ ราคาในระบบ e-GP คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		-	1,402,000.00		✓
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโลกลรัฐ 24	672,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง		-	672,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโลกลรัฐ ซอย 16	329,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง		-	329,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโลกรรัฐ ซอย 18/1	704,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง		-	704,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโลกรรัฐ ซอย 18/2	493,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง		-	493,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ่อนไก่ ซอยนวมล	261,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง		-	261,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 10	229,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง		-	229,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ 4	717,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง		-	717,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ	3,147,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง		-	3,147,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนาวิถี	6,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		แจ้งผู้รับจ้างลงนาม สัญญา		-	6,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ่วงทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	6,900,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกการุณราษฎร์	488,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	488,000.00		✓
28	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	432,000.00		✓
29	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกเทศบาล	493,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	493,000.00		✓
30	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกไทยสมุทร	462,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ คุณลักษณะและ ราคากลาง		-	462,000.00	✓	
31	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธรรมบูชา	489,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	489,000.00		✓
32	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธารา	378,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	378,000.00		✓
33	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกลัดคี	451,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	451,000.00		✓
34	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกวัดโพธิ์	473,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	473,000.00		✓
35	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกแสงเพชร	465,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ คุณลักษณะและ ราคากลาง		-	465,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกอนามัย	392,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ คุณลักษณะและ ราคากลาง		-	392,000.00	✓	
37	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี (ระหว่าง ซอย 20 และซอย 20/1)	101,970.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคดำเนินการ		101,967.79	2.21	✓	
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 2 (ท้ายซอย)	33,500.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคดำเนินการ		33,492.07	7.93	✓	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนท่าโรงช้าง ซอยประยูรธารช้าง แยกซ้าย	30,650.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคดำเนินการ		30,646.94	3.06	✓	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปทุมพร 6/2	53,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคดำเนินการ		53,014.22	5.78	✓	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยงเมือง ซอยท่าทราย	40,700.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคดำเนินการ		40,694.24	5.76	✓	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม (ทางเข้าสวนหลวงรีสอร์ท)	67,370.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคดำเนินการ		67,368.27	1.73	✓	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม 7	24,130.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคดำเนินการ		24,119.94	10.06	✓	
44	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 11/1	25,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคดำเนินการ		25,011.25	8.75	✓	
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสันติสุข 1	42,110.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคดำเนินการ		42,104.50	5.50	✓	
46	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนอำเภอ ซอยมินตรา (ข้างกิตติาคารบัวทอง)	79,240.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคดำเนินการ		79,237.78	2.22	✓	
รวม		65,962,710.00	-	-						497,657.00	65,465,053.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
47	โครงการเคหะดาวน/สวีตคีย์ใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	493,600.00	6,400.00	✓	
48	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	30,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		98,625.00	371,375.00	✓	
49	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	200,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		41,000.00	159,000.00	✓	
50	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00		✓
51	โครงการเทศกาลดนตรี	1,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	1,500,000.00		✓
52	โครงการยื่นหัวลำโพงมหาสงกรานต์	1,500,000.00	-	200,000.00	1 ก.พ. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	1,300,000.00		✓
53	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	830,000.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,830,000	-	✓	
รวม		5,800,000.00	830,000	430,000						2,463,225.00	3,736,775.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
54	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ตรวจคุณภาพน้ำ ทุกเดือน		-	300,000.00	✓	
55	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมขึ้น ทะเบียนไม้ใหญ่ใน เมือง		-	300,000.00	✓	
56	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการแลกขยะ ตลอดทั้งปี		2,008.00	297,992.00	✓	
รวม		900,000.00	-	-						2,008.00	897,992.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
57	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการ เมื่อมีเหตุสาธารณสุข		-	500,000.00	✓	
58	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68	✓			-	100,000.00		✓
59	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68		ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		-	250,000.00	✓	
60	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาขาชชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68		กำหนดอบรมวันที่ 6-7 มี.ค. 2568		-	200,000.00	✓	
61	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการทั้งปี มีการจัดจ้างเช่าเครื่องเสียงตลอดทั้งปี	✓	36,400.00	163,600.00	✓	
62	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	✓	
63	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 ส.ค. 68		ออกตรวจผู้หยอดเหรียญ		-	400,000.00	✓	
64	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		กำหนดจัดอบรมและศึกษาดูงาน เดือน พ.ค. 2568		-	800,000.00	✓	
65	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		กำหนดฝึกอบรมวันที่ 26-27 มี.ค. 2568		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
66	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68		กำหนดจัดอบรมเดือน พ.ศ. 2568		-	200,000.00	✓	
67	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รายงานผลการดำเนินโครงการ		23,400.00	70,200.00	✓	
68	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68		รายงานผลการดำเนินโครงการ		-	200,000.00	✓	
69	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,481,300.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		กำหนดจัดอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนด้านสาธารณสุขวันที่ 28 มี.ค. 2568		1,029,450.00	451,850.00	✓	
70	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี		18,250.00	38,750.00	✓	
71	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2568		12,075.00	27,925.00	✓	
72	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงพื้นที่บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้าน		-	50,000.00	✓	
73	โครงการบริการรับยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	10,000.00	✓	
74	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
75	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	800.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	782,116.00	17,084.00	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	50,000.00	✓	
77	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	80,000.00	✓	
78	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รายงานผลการ ดำเนินโครงการ		54,900.00	195,100.00	✓	
79	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญา สู่สังคมอายุยืน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	100,000.00		✓
80	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68		เตรียมจัดอบรม หลักสูตร เยาวชน รู้รอด ปลอดภัย ณ โรงแรมวังใต้		52,200	47,800.00	✓	
81	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		ติดตั้งและจัดวาง สื่อประชาสัมพันธ์ ภายในเขตเทศบาล		29,700.00	300.00	✓	
82	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	285,448.00	14,552.00	✓	
83	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนิน กิจกรรมทบทวน แผนชุมชนประจำปี		253,480.00	146,520.00	✓	
84	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	1,200,000.00		✓
85	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	750,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	729,305.00	20,695.00	✓	
86	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	20,000.00	✓	
87	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	90,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมจัดอบรม หลักสูตร ดิจิตอล แพลตฟอร์ม		19,450.00	22,550.00	✓	
89	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	420,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ บริหารงานกองทุน สวัสดิการชุมชนสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2568		240,330.00	179,670.00	✓	
90	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00	✓	
91	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรม การปลูกผักสวนครัว บริบทชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2568 ณ บริเวณ บ้านพักเรือนจำเก่า		4,950.00	95,050.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	✓			-	50,000.00		✓
93	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จรจัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ออกหน่วยทำหมัน สุนัขในวัด		-	300,000.00	✓	
94	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นอองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า		-	399,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
95	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ออกสำรวจข้อมูลสัตว์		-	80,000.00	✓	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ /ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ /ชุมชนเพชรวิลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋าผ้าแฟชั่นด้วยลายผ้าไทย /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน/ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำEco Print /ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าจักสานเคคูพาง /ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าแฟชั่น /ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมคุกกี้ /ชุมชนหลังอาชีวะ	26,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	26,000.00		✓
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมถ้วย ชนมจีบ /ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทศกาลและเครื่องดื่มสมุนไพร/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชน ลูกเสือ-การุณราชบุรี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชน ฝั่งบางไปไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและเครื่องดื่ม สมุนไพร /ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยสาธิตไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ /ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียว หมูแดดเดียว หมูฝอย /ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนโนลิก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กช็อกหน้านิ่มและ เค้กส้มหน้านิ่ม/ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กวันขนมไทย (วันเรนโบว์) /ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และ เหรียญไปรษณีย์ /ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโตปลาแห้ง /ชุมชน สันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโตปลาแห้ง/ชุมชน ปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกกาหมู และ โตปลาแห้ง /ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน /ชุมชน เมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ (สบู์เหลวจากสมุนไพรเข้มข้น) /ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบะหมี่เปิดอย่าง เกี้ยวหมูแดง /ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำประมงชายฝั่ง ขั้นพื้นฐาน /ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วย เทคนิคเคคูพาง /ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพันคอ Eco Print/ ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ (Eco Print)/ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนท่า แขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชน ไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชน บึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ต่อเนื่องปี 2567) /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน ตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน ตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน หน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจาก สี่ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจากสี่ ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์กระจุต /ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว /ชุมชน บางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว/ชุมชน ศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว/ ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำวันเค็มมะพร้าวอ่อน / ชุมชนเสรีไทย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสกรีนเสื้ออัตลักษณ์ ชุมชน/ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสบู่จากสมุนไพร / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสวรรค์/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสะเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำแหม่ม ไส้กรอกปลาต้ม(ต่อเนื่องปี 67) /ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดฝ่าเท้า/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	99,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	99,000.00		✓
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเลหมึกหวาน กุ้งหวาน /ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ/ชุมชน ร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันที่ผ้าปาเต๊ะให้กับผู้ว่างงาน /ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่ากระดาษสาจานจุด /ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระดาษกระจูด /ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง /ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง /ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานผ้าซีแพนซี /ชุมชนวัดโพธิาวาส	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามพระราชดำริ /ชุมชนสิริสุข	130,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	130,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเสื้อ Eco Print /ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
161	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	840,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		-	840,000.00	✓	
162	โครงการอุดหนุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ในการควบคุมจำนวนและโรคจากลิงแสมบริเวณรอบบึงขุนทะเลและสถานที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	200,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ส.ค. 68		ขอความเห็นชอบ จ่ายเงินอุดหนุนต่อ สภาเทศบาลในการ ประชุมสภาเทศบาล คราวถัดไป		-	200,000.00	✓	
รวม		14,198,700.00	-	800						3,770,629.00	10,427,271.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
163	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	450,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการจัดงาน กิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายใน ปีงบประมาณ		156,800.00	293,200.00	✓	
164	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68			✓	348,596.50	1,403.50	✓	
165	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มี.ย. 68		จัดเตรียมการรับสมัคร		-	500,000.00	✓	
166	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	1,200,000.00		✓
167	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	250,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
168	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เบิกค่าวัสดุ ทำข้อสอบ ระหว่างภาค 2/2567		103,271.00	796,729.00	✓	
169	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 พ.ค. 68		จัดทำฎีกาเบิกจ่าย ค่าจัดทำเอกสารฯ		42,780.00	257,220.00	✓	
170	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	37,100,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานโรงเรียนขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษาไตรมาส 2, งานอกระบบขอ อนุมัติเบิกจ่าย		15,065,587.14	22,034,612.86	✓	
171	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	56,311,400.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานนิเทศก์โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษาไตร มาส 2, งานกิจการ นักเรียน ร.ร.กีฬา ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย		18,586,416.74	37,724,983.26	✓	ไม่เป็นไป
172	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68			✓	896,861.00	103,139.00	✓	
173	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	150,000.00	✓	
174	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	
175	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตามหลักสูตร พื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	800,000.00		✓
176	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68		จัดเตรียมเอกสาร โครงการ		-	110,000.00	✓	
177	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	58,795.00	1,205.00	✓	
178	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	80,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
179	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	50,000.00	✓	
180	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	
181	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		สำรวจการจัดหา หนังสือ		-	200,000.00	✓	
182	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		พิจารณาหลักเกณฑ์ การให้ทุนฯ		-	700,000.00	✓	
183	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมตาม โรงเรียน		-	100,000.00	✓	
184	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	300,000.00		✓
185	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	800,000.00		✓
186	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00		✓
187	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		-	200,000.00	✓	
188	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	35,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขัน ระดับประเทศ		3,159,740.00	1,805,260.00	✓	
189	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		-	300,000.00	✓	
190	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
191	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	600,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดงานประจำปี 2567 เสร็จสิ้น, เตรียมจัดงาน ประจำปี 2568		5,960,796.12	439,203.88	✓	
192	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	200,000.00	25,700.00	1 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	1,974,270.50	29.50	✓	
193	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	10,800.00	1 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	239,130.00	70.00	✓	
194	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	650,000.00		✓
195	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	5,000.00		✓
196	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างจัดทำ แบบรูปรายการ ก่อสร้าง		-	904,000.00	✓	
197	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	990,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		475,200.00	514,800.00	✓	
198	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,315,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		594,000.00	721,600.00	✓	
199	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	594,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		277,200.00	316,800.00	✓	
200	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		261,600.00	266,400.00	✓	
201	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	836,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		402,600.00	433,400.00	✓	
202	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,232,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		638,000.00	594,000.00	✓	
203	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		574,200.00	833,800.00	✓	
204	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,955,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		3,907,200.00	4,048,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
205	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,087,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	1,087,200.00	-	✓	
206	อุดหนุนมัสยิดอิกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00	✓	
207	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	✓	
208	อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	✓	
รวม		134,816,600.00	200,000.00	671,500.00						55,010,244.00	79,334,856.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
209	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	10,000.00		✓
210	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	80,000.00	✓	
211	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		- ประกาศใช้แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2567 - เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2568 - แก้ไขครั้งที่ 3/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2568 - การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ นโยบายผู้บริหาร		35,790.00	34,210.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
212	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		- ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2567 - แก้ไขครั้งที่ 1/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2568 - เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนโยบาย ผู้บริหาร		23,577.00	326,423.00	✓	
213	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ประจำเดือน ก.พ. 2568		20,205.00	9,795.00	✓	
214	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	135,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	135,000.00	✓	
215	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณ หน้าสำนักงาน เทศบาล		12,000.00	88,000.00	✓	
216	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	80,000.00	✓	
217	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	20,000,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
218	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขอความเห็นชอบ ดำเนินงานตาม โครงการฯ		-	2,000,000.00	✓	
219	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติ TOR และ ขออนุมัติจ้างบุคคล หรือหน่วยงาน ภายนอกเป็นที่ปรึกษา		-	250,000.00	✓	
รวม		23,105,000.00	-	-						91,572.00	23,013,428.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		244,783,010.00	1,030,000.00	1,102,300.00						61,835,335.00	182,875,375.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		ขออนุมัติจ้างรังวัด สอบเขตที่ดิน		-	6,000,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		ขออนุมัติจ้างรังวัด สอบเขตที่ดิน		-	5,930,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		ขออนุมัติจ้างรังวัด สอบเขตที่ดิน		-	426,000.00	✓	
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	722,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนปากน้ำ จากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขต เทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		ขออนุมัติจ้างรังวัด สอบเขตที่ดิน		-	47,666,000.00	✓	
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลียงเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	203,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม เหล็กถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบ่อสะพาน	200,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	200,000.00	✓	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 11	184,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	184,000.00	✓	
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	166,000.00	✓	
10	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 6	118,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	118,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)


ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					ดำเนินการ						
11	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	115,000.00	✓	
12	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 2	128,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	128,000.00	✓	
13	โครงการขยายเขตประปาถนนชนเกษม 50/1	461,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	461,000.00	✓	
14	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6	97,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	97,000.00	✓	
15	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	115,000.00	✓	
16	โครงการขยายเขตประปาถนนศรีเกษมตัดใหม่ (ร้านเดอะชอฟต์)	119,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	119,000.00		✓
17	โครงการขยายเขตประปาถนนกาญจนาวิถี 6	213,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	213,000.00		✓
18	โครงการขยายเขตประปาถนนกาญจนาวิถี 20	104,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	104,000.00		✓
19	โครงการขยายเขตประปาถนนสาย 420 (ข้าวแกงสมุย - หัวสะพานศาลพ่อตาหวด)	1,360,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	1,360,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนพอขุนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		ประกาศเชิญชวนใน เว็บไซต์		-	527,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	65,000,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		ประกาศเชิญชวนใน เว็บไซต์		-	3,132,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	820,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	30,000,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	10,000,000.00	✓	
รวม		173,806,000.00						-	173,806,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		173,806,000.00						-	173,806,000.00		



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **28 โครงการ**
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น **518,106,648 บาท** (ห้าร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 182,458,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	-
รวม	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,072,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	7,072,000.00	765,000	1	872,000.00	765,000.00	1	6,200,000.00	-	-	-	-	-
รวม	2	7,072,000.00	765,000	1	872,000.00	765,000.00	1	6,200,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			50.00			50.00			0.00		0.00

3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 328,576,648 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	328,576,648.00	8,221,974	4	8,684,000.00	8,221,974.00	20	319,892,648.00	-	-	-	-	-
รวม	24	328,576,648.00	8,221,974	4	8,684,000.00	8,221,974.00	20	319,892,648.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			16.67			83.33			0.00		0.00

รวม	28	518,106,648.00	75,477,281.11	5	9,556,000.00	8,986,974.00	23	508,550,648.00	66,490,307	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			17.86			82.14			0.00		0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		ศาลสั่งให้ระงับการ เบิกจ่ายเงิน		38,465,580.02	29,002,419.98		✓
2	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		ศาลสั่งให้ระงับการ เบิกจ่ายเงิน		28,024,727.09	86,965,272.91		✓
รวม		182,458,000.00						66,490,307.11	115,967,692.89		
รวมทุกยุทธศาสตร์		182,458,000.00						66,490,307.11	115,967,692.89		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน เนื่องจากรอ ผลทดสอบวัสดุ		-	6,200,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	765,000.00	107,000.00		✓
รวม		7,072,000.00						765,000.00	6,307,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		7,072,000.00						765,000.00	6,307,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	8,905,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,000,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		ขออนุมัติจ้าง ก่อสร้าง		-	2,328,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำ BOQ		-	947,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	495,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำ BOQ		-	8,070,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		ขออนุมัติจ้าง ก่อสร้าง		-	3,490,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสะบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	1,200,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		รายงานผล การพิจารณาและ ขออนุมัติสิ่งจ้าง		-	1,250,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	749,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,555,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,896,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		คณะกรรมการ พิจารณาผล ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์		-	645,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนโฉลกัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67			✓	555,000.00	2,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67		ขออนุมัติจ้าง ก่อสร้าง		-	2,820,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุโมงค์จราจรแตรคเตอร์)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	386,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		รายงานผล การพิจารณาและ ขออนุมัติตั้งจ้าง		-	3,510,000.00		✓
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีเกษม ซอยข้างอุ้งรียุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		รายงานผล การพิจารณาและ ขออนุมัติตั้งจ้าง		-	2,500,000.00		✓
19	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคแจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	19,800,778.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนการุณราชฤทธิ์	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคแจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	70,998,138.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคแจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	184,347,732.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,447,985.70	87,014.30		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,964,692.80	117,307.20		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตถนนคอนนง STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	4,254,295.50	255,704.50		✓
รวม		328,576,648.00						8,221,974.00	320,354,674.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		328,576,648.00						8,221,974.00	320,354,674.00		

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



**สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)**

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้ มีทั้งหมด **45 โครงการ** งบประมาณที่กันเงินไว้ **140,845,819 บาท** (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 14,210,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	14,210,000.00	6,300,000.00	3	7,110,000.00	6,300,000.00	3	7,100,000.00	-	-	-	-	-
รวม	6	14,210,000.00	6,300,000.00	3	7,110,000.00	6,300,000.00	3	7,100,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			50.00			50.00		0.00			0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 56,384,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	45,219,519.00	5,352,000.00	6	6,441,000.00	5,352,000.00	16	38,778,519.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,157,000.00	-	-	-	-	2	5,157,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	27	56,384,519.00	5,352,000.00	6	6,441,000.00	5,352,000.00	21	49,943,519.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			22.22			77.78		0.00			0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 70,251,300 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	32,000,000.00	-	-	-	-	2	32,000,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	4	22,200,100.00	-	-	-	-	4	22,200,100.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	651,200.00	151,200.00	1	151,200.00	151,200.00	1	500,000.00	-	-	-	-	-
รวม	12	70,251,300.00	151,200.00	1	151,200.00	151,200.00	11	70,100,100.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			8.33			91.67		0.00		0.00	
รวม	45	140,845,819.00	11,803,200.00	10	13,702,200.00	11,803,200.00	35	127,143,619.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			22.22			77.78		0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียยเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	800,000.00	-		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	1,700,000.00	10,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญาผลงาน 99%		-	1,300,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญาผลงาน 28%		-	3,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญาผลงาน 85%		-	2,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	3,800,000.00	800,000.00		✓
รวม		14,210,000.00	14,210,000.00						6,300,000.00	7,910,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		14,210,000.00	14,210,000.00						6,300,000.00	7,910,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2		-	660,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนดอนนาก จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง เนื้องาน 29%		-	9,100,000.00		✓
3	โครงการขยายเขตประปา - ถนนกาญจนาวิถี 26 - ซอยเลี้ยงเมืองข้างโรงแรมเพชรพจน์ - ถนนคลองฉนาก (ตอนที่ 2)	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผลงาน 100%		-	1,680,519.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	181,000.00	6,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 32%		-	4,026,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผลงาน 96%		-	1,854,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนาก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้าง		-	2,341,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	326,000.00	29,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง		-	1,857,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝัวจรจรถนนโฉลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง		-	1,877,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝัวจรจรถนนโฉลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง		-	1,978,000.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง		-	4,000,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝัวจรจรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	940,000.00	30,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝัวจรจรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	700,000.00	29,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝัวจรจรถนนกาญจนาวิถี 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง		-	619,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		เตรียมเอกสารขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	1,130,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝัวจรจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 35%		-	2,927,000.00		✓
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโฉลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้าง		-	929,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนศรีเกษมหลังขอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำและระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง		-	1,800,000.00		✓
20	โครงการปรับปรุงฝิวจراجรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชูร์ แยกซ้าย 1 (ขอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง บริหารสัญญา ผลงาน 45%		-	2,000,000.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,555,000.00	395,000.00		✓
22	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	1,650,000.00	600,000.00		✓
รวม		45,219,519.00	45,219,519.00						5,352,000.00	39,867,519.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
23	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		คณะกรรมการ กำหนดรูปแบบ รายการและ ราคากลาง		-	1,795,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ตรวจสอบปริมาณ งานก่อนทำสัญญาจ้าง		-	3,363,000.00	✓	
รวม		5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
25	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนภูมิ 2,3 อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ BOQ		-	1,157,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงอาคารสนามเบตมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม		-	4,000,000.00		✓
รวม		5,157,000.00	5,157,000.00						-	5,157,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
27	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		กำหนดคัดเลือก ผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไข วันที่ 11 มี.ค. 2568		-	850,000.00	✓	
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		56,384,949.00	56,384,519.00						5,352,000.00	51,032,519.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ตามแผนดำเนินงาน		ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูป รายการ		-	5,500,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,900,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ก.ค. 68		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,000,000.00	✓	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูป รายการ		-	5,000,000.00	✓	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		สำนักช่างจัดทำ ราคากลาง		-	4,500,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	27,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		คณะกรรมการจัดทำ ราคากลาง		-	27,500,000.00	✓	
รวม		32,000,000.00	32,000,000.00						-	32,000,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนภูมิ 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		คณะกรรมการจัดทำ รูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,429,600.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขั้นตอนประกาศร่าง วิจารณ์		-	15,000,000.00	✓	
9	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	4,130,000.00	4,130,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย งวดที่ 1/4		850,715.36	3,279,284.64	✓	
10	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	1,640,500.00	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		ผู้บริหารมีคำสั่งให้ ชะลอโครงการ เนื่องจากการแก้ไข แบบแปลน		-	1,640,500.00	✓	
รวม		22,200,100.00	22,200,100.00						850,715.36	21,349,384.64		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
11	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง วันที่ 5 มี.ค. 2568		-	500,000.00		✓
12	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	151,200.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	151,200.00	-	✓	
รวม		750,000.00	651,200.00						151,200.00	500,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		70,350,100.00	70,251,300.00						1,001,915.36	69,249,384.64		
