

รายงานติดตาม

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประจำไตรมาส ที่ 3/2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)



รวบรวมโดย : งานวิจัยและประเมินผล



คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



สารบัญ



หน้า
1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

หน้า
2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

หน้า
6

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

หน้า
7

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

หน้า
8

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประจำปีไตรมาสที่ 3/2568 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

หน้า
9

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ, จ่ายจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

หน้า
42


สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565-2567 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

หน้า
47

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

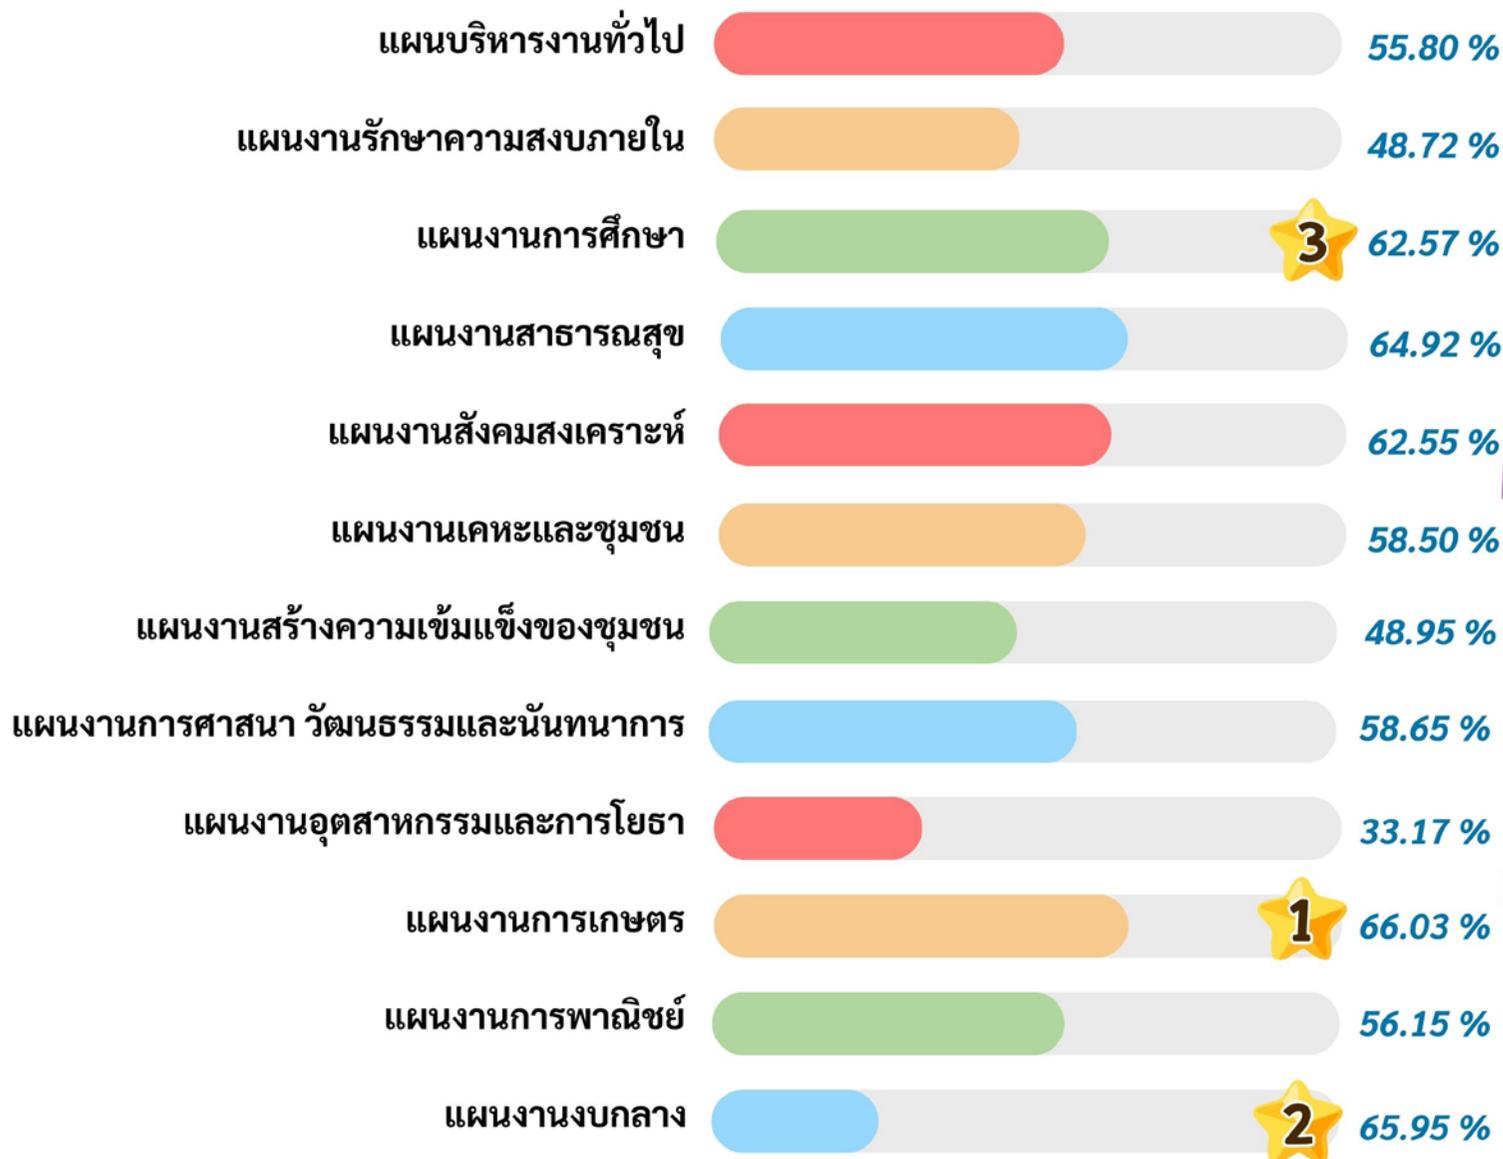

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

สรุปข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเนื่องจาก
การบันทึกข้อมูลในระบบ e-Lass ยังไม่สมบูรณ์

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2568)

รายจ่ายประจำร้อยละ 75 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 60 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	164,827,228.00	6,172,660.00	9,302,660.00	9,121,973.69	90,219,524.40	62,355,729.91	55.80	
	รายจ่ายประจำ	162,098,328.00	5,541,360.00	9,299,660.00	9,121,973.69	89,156,724.40	60,061,329.91	56.31	
	- งานบริหารทั่วไป	96,959,603.00	3,493,100.00	7,669,400.00	5,698,078.04	47,990,556.58	39,094,668.38		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,635,500.00	-	-	279,950.00	2,535,432.36	1,820,117.64		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	59,622,148.00	2,043,260.00	1,625,260.00	3,108,735.65	38,263,276.46	18,668,135.89		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	881,077.00	5,000.00	5,000.00	35,210.00	367,459.00	710,727.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,728,900.00	631,300.00	3,000.00	-	1,062,800.00	2,294,400.00	31.66	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	2,317,500.00	631,300.00	-	-	655,800.00	2,756,800.00		
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-		
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	342,400.00	-	3,000.00	-	338,000.00	342,400.00		สป./กองยุทธฯ/กจ.
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,459,050.00	604,760.00	544,760.00	1,945,058.98	18,281,036.51	17,292,954.51	48.72	
	รายจ่ายประจำ	31,702,550.00	604,760.00	544,760.00	1,945,058.98	17,774,536.51	12,042,954.51	55.96	
	- งานเทคนิค	10,781,450.00	327,760.00	327,760.00	1,068,465.00	6,659,242.07	8,497,159.02		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	14,876,800.00	-	-	223,031.38	8,363,505.91	11,977,077.55		
	- งานจราจร	6,044,300.00	277,000.00	217,000.00	653,562.60	2,751,788.53	2,698,948.87		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,756,500.00	-	-	-	506,500.00	5,250,000.00	8.80	
	- งานจราจร (ครุภัณฑ์)	5,756,500.00	-	-	-	506,500.00	5,715,000.00		สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	342,190,110.00	3,113,377.00	2,685,477.00	45,716,881.81	214,377,712.86	82,523,415.33	62.57	
	รายจ่ายประจำ	341,295,110.00	3,113,377.00	2,685,477.00	44,971,881.81	214,227,712.86	82,523,415.33	62.69	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,329,300.00	293,377.00	293,377.00	198,825.09	4,673,847.33	6,792,887.68		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	185,774,260.00	530,000.00	425,100.00	22,751,371.39	121,990,797.05	41,136,991.56		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	140,989,150.00	2,139,000.00	1,761,000.00	21,834,547.80	84,530,591.08	35,002,011.12		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,202,400.00	151,000.00	206,000.00	187,137.53	3,032,477.40	5,131,992.97		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	895,000.00	-	-	745,000.00	150,000.00	-	16.76	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	470,000.00	-	-	320,000.00	150,000.00	470,000.00		
	- งานมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	425,000.00	-	-	425,000.00	-	425,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	71,974,050.00	890,937.00	2,220,200.87	1,646,546.33	45,860,748.01	23,137,491.79	64.92	
	รายจ่ายประจำ	68,882,850.00	890,937.00	2,220,200.87	1,572,546.33	45,393,548.01	20,587,491.79	67.20	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,484,750.00	140,818.00	488,337.00	211,815.73	5,783,545.01	3,141,870.26		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,297,050.00	188,130.00	971,112.00	654,155.75	11,314,266.42	6,545,645.83		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	40,101,050.00	561,989.00	760,751.87	706,574.85	28,295,736.58	10,899,975.70		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,091,200.00	-	-	74,000.00	467,200.00	2,550,000.00	15.11	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	40,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	68,200.00	-	-	-	68,200.00	-		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	2,983,000.00	-	-	74,000.00	359,000.00	2,894,000.00		
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,710,870.00	200,560.00	42,560.00	410,435.15	7,424,460.52	4,033,974.33	62.55	
	รายจ่ายประจำ	11,209,220.00	200,560.00	42,560.00	410,435.15	7,384,510.52	3,572,274.33	64.96	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,683,800.00	32,560.00	31,760.00	104,077.15	3,057,859.40	1,522,663.45		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,525,420.00	168,000.00	10,800.00	306,358.00	4,326,651.12	2,049,610.88		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	501,650.00	-	-	-	39,950.00	461,700.00	7.96	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	39,950.00	-	-	-	39,950.00	39,950.00		สำนักช่าง
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	461,700.00	-	-	-	-	461,700.00		
6	แผนงานเคหะและชุมชน	185,567,010.00	4,348,108.87	2,602,140.00	12,201,810.75	109,580,883.09	65,530,285.03	58.50	
	รายจ่ายประจำ	157,059,010.00	4,348,108.87	2,602,140.00	12,201,810.75	109,572,883.09	37,030,285.03	69.00	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,584,910.00	837,746.87	-	-	2,422,570.95	837,832.79		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	11,229,050.00	941,000.00	204,000.00	- 96,123.56	9,028,736.14	7,960,265.92		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	123,899,650.00	705,362.00	1,319,540.00	10,659,076.49	85,271,557.36	27,354,838.15		สช. / สร.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	20,345,400.00	1,864,000.00	1,078,600.00	1,638,857.82	12,850,018.64	6,641,923.54		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	28,508,000.00	-	-	-	8,000.00	28,508,000.00	0.03	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ (ค่าครุภัณฑ์)	20,008,000.00	-	-	-	8,000.00	20,008,000.00		สช. / สร.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ค่าครุภัณฑ์)	8,500,000.00	-	-	-	-	8,500,000.00		สช. / สร.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,241,100.00	19,000.00	177,000.00	668,130.00	9,340,714.98	9,074,255.02	48.95	
	รายจ่ายประจำ	19,241,100.00	19,000.00	177,000.00	668,130.00	9,340,714.98	9,074,255.02	48.95	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,770,000.00	-	-	95,000.00	4,236,250.00	6,683,000.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,471,100.00	19,000.00	177,000.00	573,130.00	5,104,464.98	8,944,291.15		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	28,648,600.00	7,096,840.00	3,618,740.00	1,808,569.75	18,842,803.66	11,475,326.59	58.65	
	รายจ่ายประจำ	28,648,600.00	7,096,840.00	3,618,740.00	1,808,569.75	18,842,803.66	11,475,326.59	58.65	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,736,350.00	267,100.00	1,400,000.00	342,168.75	4,340,912.22	5,025,489.18		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,643,950.00	5,949,740.00	749,740.00	27,475.00	10,591,037.42	3,222,228.38		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	7,268,300.00	880,000.00	1,469,000.00	1,438,926.00	3,910,854.02	5,916,963.36		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	151,384,047.00	3,006,078.00	4,506,478.00	22,156,680.66	49,715,350.83	78,011,615.51	33.17	
	รายจ่ายประจำ	59,864,150.00	2,891,728.00	3,000,378.00	811,268.16	41,079,708.89	17,864,522.95	68.75	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,178,900.00	551,000.00	299,400.00	103,832.50	5,060,479.94	3,266,187.56		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	51,685,250.00	2,340,728.00	2,700,978.00	707,435.66	36,019,228.95	14,598,335.39		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	91,519,897.00	114,350.00	1,506,100.00	21,345,412.50	8,635,641.94	60,147,092.56	9.58	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	-	25,800.00	-	-	25,800.00	25,800.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	2,500,000.00	88,550.00	-	-	2,502,950.00	2,588,550.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	89,019,897.00	-	1,506,100.00	21,345,412.50	6,106,891.94	88,891,905.06		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	6,369,150.00	270,000.00	405,000.00	435,925.05	4,116,323.08	1,681,901.87	66.03	
	รายจ่ายประจำ	6,369,150.00	270,000.00	405,000.00	435,925.05	4,116,323.08	1,681,901.87	66.03	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,369,150.00	270,000.00	405,000.00	435,925.05	4,116,323.08	4,290,464.20		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,484,700.00	439,695.00	57,000.00	305,241.90	2,171,466.05	1,390,687.05	56.15	
	รายจ่ายประจำ	3,484,700.00	439,695.00	57,000.00	305,241.90	2,171,466.05	1,390,687.05	56.15	
	- งานตลาดสด	600,200.00	9,000.00	-	70,123.00	349,530.00	484,880.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,884,500.00	430,695.00	57,000.00	235,118.90	1,821,936.05	2,346,281.77		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	302,144,085.00	-	-	697,829.00	199,251,547.85	102,194,708.15	65.95	
	รายจ่ายประจำ	302,144,085.00	-	-	697,829.00	199,251,547.85	221,250,947.96	65.95	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,325,000,000.00	26,162,015.87	26,162,015.87	97,115,083.07	769,182,571.84	577,758,584.90	58.05	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,191,998,853.00	25,416,365.87	24,652,915.87	74,950,670.57	758,312,479.90	478,555,392.34	63.58	
	รวมงบลงทุน	133,001,147.00	745,650.00	1,509,100.00	22,164,412.50	10,870,091.94	99,211,192.56	8.22	


รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยนับ : โครงการ

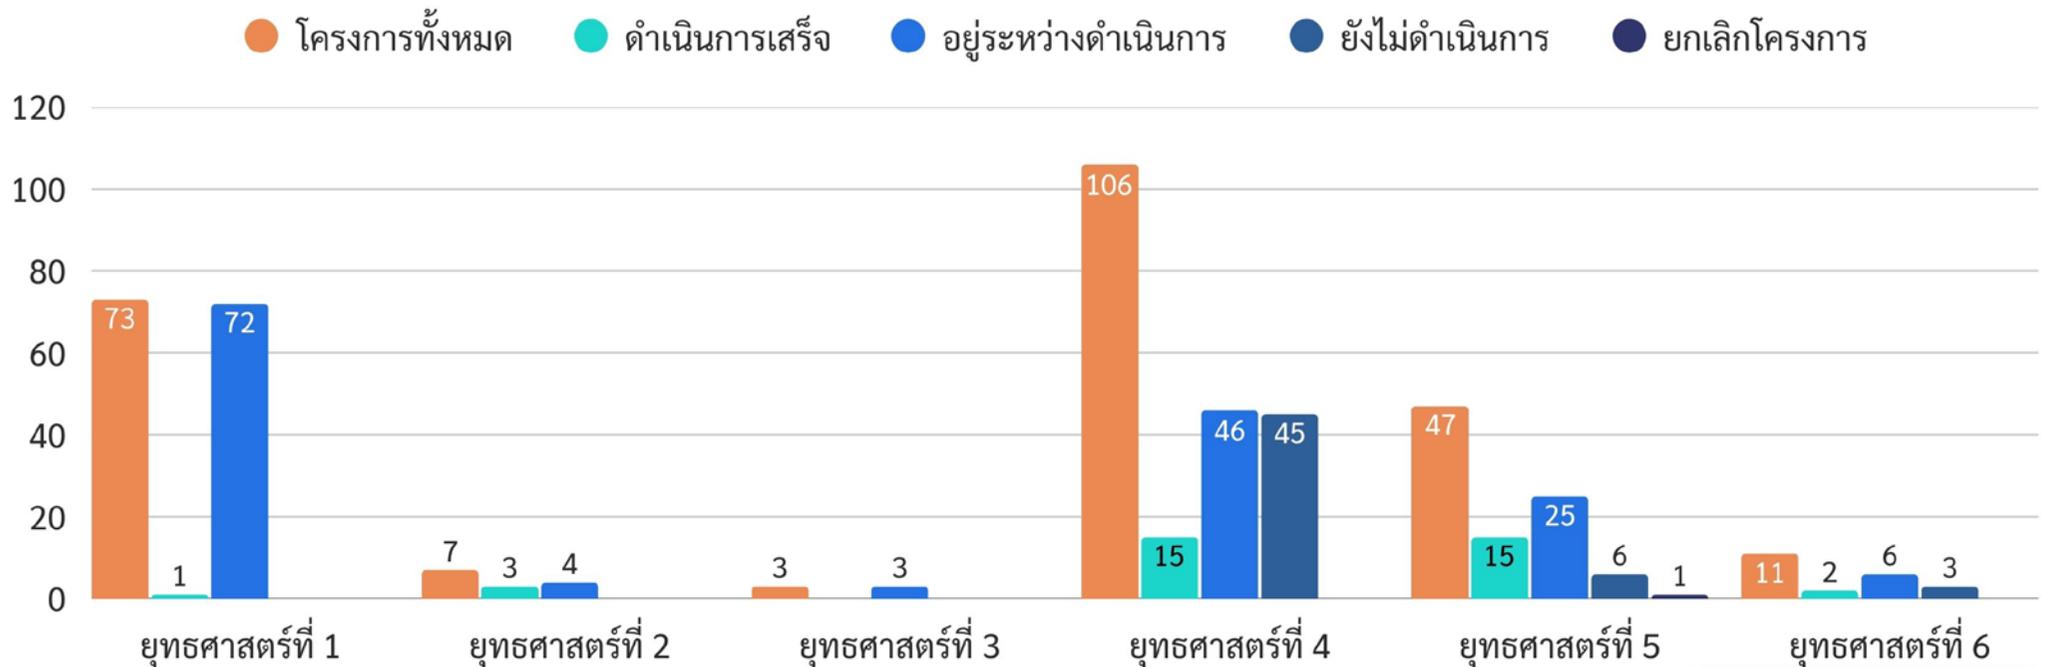

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี



แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ



- 1) งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- 2) จำยจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- 3) งบประมาณเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ร้อยละ
14.57

ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 36 โครงการ

ร้อยละ
63.17

อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 156 โครงการ


ร้อยละ
21.86

ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 54 โครงการ


ร้อยละ
0.41

ยกเลิก
จำนวน 1 โครงการ

โครงการทั้งหมด : 247 โครงการ



สถานะการดำเนินโครงการ

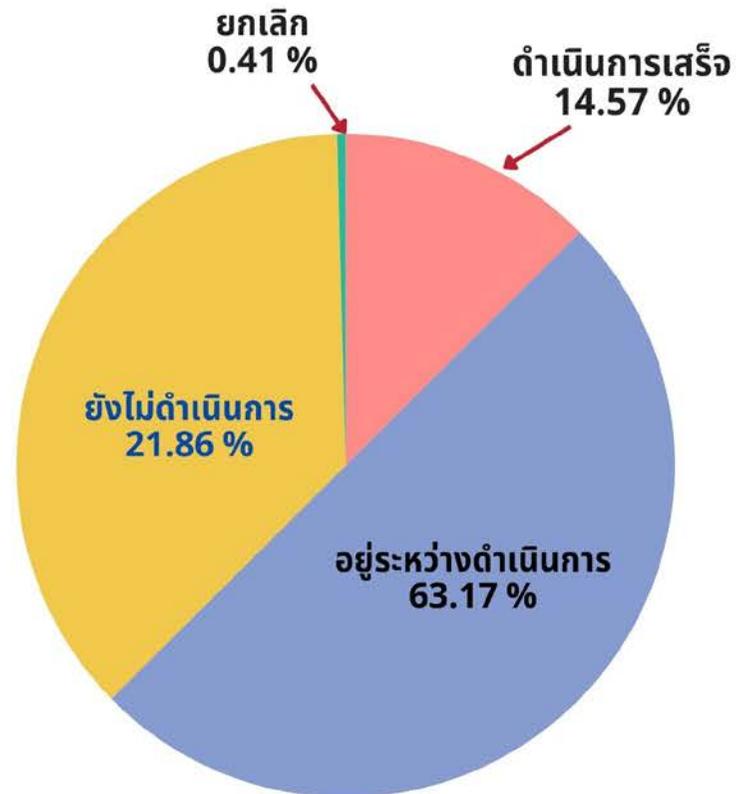

**สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	118	35.65	369,892,020.00	37.31	73	22.05	273,768,710.00	27.61	73	22.05	273,768,710.00	27.61
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	9	2.72	10,300,000.00	1.04	7	2.11	6,180,000.00	0.62	7	2.11	6,180,000.00	0.62
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7	2.11	144,500,000.00	14.57	3	0.91	900,000.00	0.09	3	0.91	900,000.00	0.09
4	ด้านสวัสดิการสังคมและ คุณภาพชีวิต	122	36.86	184,145,200.00	18.57	106	32.02	13,778,900.00	1.39	61	18.43	11,593,900.00	1.17
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	56	16.92	255,308,150.00	25.75	47	14.20	145,085,100.00	14.63	40	12.08	143,250,100.00	14.45
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	19	5.74	27,374,000.00	2.76	11	3.32	23,105,000.00	2.33	8	2.42	2,890,000.00	0.29
รวมทั้งสิ้น		331	100.00	991,519,370.00	100.00	247	74.62	462,817,710.00	46.68	192	58.01	438,582,710.00	44.23

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 247 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 462,817,710 บาท (สี่ร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 219 โครงการ งบประมาณ 248,211,710 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46	65,962,710.00	6,476,557.00	1	7,485,000.00	5,978,900.00	45	58,477,710.00	497,657.00	-	-	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	6,180,000.00	3,382,545.00	3	3,830,000.00	2,913,175.00	4	2,350,000.00	469,370.00	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	900,000.00	278,538.00	-	-	-	3	900,000.00	278,538.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	106	13,778,900.00	7,123,065.87	15	5,623,500.00	4,921,835.87	46	5,970,400.00	2,201,230.00	45	2,185,000.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	138,285,100.00	108,681,607.84	15	10,405,700.00	9,691,843.00	24	126,044,400.00	98,989,764.84	6	1,535,000.00	1	300,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	23,105,000.00	135,747.00	2	90,000.00	43,650.00	6	2,800,000.00	92,097.00	3	20,215,000.00	-	-
รวม	219	248,211,710.00	126,078,060.71	36	27,434,200.00	23,549,403.87	128	196,542,510.00	102,528,656.84	54	23,935,000.00	1	300,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			16.44			58.45			24.66		0.45

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 180,606,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	173,806,000.00	-	-	-	-	25	173,806,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	1	6,800,000.00	4,380,464.00	-	-	-	1	6,800,000.00	4,380,464.00	-	-	-	-
รวม	26	180,606,000.00	4,380,464.00	-	-	-	26	180,606,000.00	4,380,464.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

3. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 34,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	34,000,000.00	-	-	-	-	2	34,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	2	34,000,000.00	-	-	-	-	2	34,000,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

รวมทั้งสิ้น	247	462,817,710.00	130,458,524.71	36	27,434,200.00	23,549,403.87	156	411,148,510.00	106,909,120.84	54	23,935,000.00	1	300,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			14.57			63.16			21.86		0.41

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่า ไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	15,920,000.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี 20 ช่วง 2	528,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง		-	528,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนการบินไทย	769,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา (e-bidding)		-	769,000.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก	7,187,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ทำสัญญาารวม 3 โครงการ (ถ.คลองฉนาก, ถ.คลองฉนาก 2, ถ.คลองฉนาก 2 แยกขวา)		-	7,187,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2 แยกขวา 1	761,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ทำสัญญาารวม 3 โครงการ (ถ.คลองฉนาก, ถ.คลองฉนาก 2, ถ.คลองฉนาก 2 แยกขวา)		-	761,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 39	580,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา (e-bidding)		-	580,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 35	921,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา (e-bidding)		-	921,000.00	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าฉาง	462,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา (e-bidding)		-	462,000.00	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	571,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างบันทึก ขออนุมัติยกเลิก โครงการ		-	571,000.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 25	2,723,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง		-	2,723,000.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเรือนจำเก่า	436,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา (e-bidding)		-	436,000.00	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีพุนพิน	1,137,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา (e-bidding)		-	1,137,000.00	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 21	7,485,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68			✓	5,978,900.00	1,506,100.00	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 4	189,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา (e-bidding)		-	189,000.00	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 6	419,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา (e-bidding)		-	419,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2	1,402,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ทำสัญญารวม 3 โครงการ (ถ.คลองฉนาก, ถ.คลองฉนาก 2, ถ.คลองฉนาก 2 แยกขวา)		-	1,402,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ 24	672,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง		-	672,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 16	329,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง		-	329,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 18/1	704,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง		-	704,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 18/2	493,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง		-	493,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปอนไม้ ซอยนฤมล	261,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง		-	261,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 10	229,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง		-	229,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ 4	717,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง		-	717,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ	3,147,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง		-	3,147,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนาวิถี	6,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่างเสนอผล การตรวจรับงานจ้าง		-	6,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ่วงทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะการ เสนอราคา		-	6,900,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกการุณราษฎร์	488,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขออนุมัติและจัดทำ คำสั่งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป รายการและ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		-	488,000.00	
28	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อ จ้างฯ และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	432,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดที่เหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
29	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกเทศบาล	493,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขออนุมัติและจัดทำ คำสั่งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป รายการและ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		-	493,000.00	
30	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกไทยสมุทร	462,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 70%		-	462,000.00	
31	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกธรรมบูชา	489,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อ จ้างฯ และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	489,000.00	
32	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ ธารา	378,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขออนุมัติและจัดทำ คำสั่งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป รายการและ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		-	378,000.00	
33	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกหลักสี่	451,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อ จ้างฯ และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	451,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
34	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกวัดโพธิ์	473,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขออนุมัติและจัดทำ คำสั่งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป รายการและ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		-	473,000.00	
35	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกแสงเพชร	465,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	465,000.00	
36	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกอนามัย	392,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 40%		-	392,000.00	
37	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี (ระหว่าง ซอย 20 และซอย 20/1)	101,970.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		101,967.79	2.21	
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 2 (ท้ายซอย)	33,500.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		33,492.07	7.93	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนท่าโรงช้าง ซอยประยูรการช่าง แยกซ้าย	30,650.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		30,646.94	3.06	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปทุมพร 6/2	53,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		53,014.22	5.78	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียงเมือง ซอยท่าทราย	40,700.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		40,694.24	5.76	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม (ทางเข้าสวนหลวงรีสอร์ท)	67,370.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		67,368.27	1.73	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม 7	24,130.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		24,119.94	10.06	
44	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 11/1	25,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		25,011.25	8.75	
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสันติสุข 1	42,110.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		42,104.50	5.50	
46	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนอำเภอ ขอยมินตรา (ข้างกัศดาการบัวทอง)	79,240.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		79,237.78	2.22	
รวม		65,962,710.00	-	-						6,476,557.00	59,486,153.00	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
47	โครงการเคาท์ดาว์/สวัสดีปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	493,600.00	6,400.00	
48	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	30,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		324,470.00	145,530.00	
49	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	200,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		112,900.00	87,100.00	
50	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รวบรวม แบบสอบถามเพื่อ นัดประชุมผู้เข้าร่วม โครงการ		-	400,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
51	โครงการเทศบาลนคร	1,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	589,575.00	910,425.00	
52	โครงการยื่นทิวหล้า มหาสงกรานต์	1,500,000.00	-	220,000.00	1 ก.พ. 68	31 พ.ค. 68		หน่วยงานตรวจสอบ ภายนอกส่งผลตอบ กลับให้พัสดุ ดำเนินการ		32,000.00	1,248,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
53	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	830,000.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,830,000.00	-	
รวม		5,800,000.00	830,000	450,000						3,382,545.00	2,797,455.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
54	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ตรวจคุณภาพน้ำ ทุกเดือน และตรวจ ประชาสัมพันธ์รายงาน การติดตามคุณภาพ อากาศในพื้นที่ทุกสัปดาห์		-	300,000.00	
55	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมขึ้น ทะเบียนไม่ใหญ่ใน เมือง		226,060.00	73,940.00	
56	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการแลกขยะ ตลอดทั้งปี		76,688.00	223,312.00	
รวม		900,000.00	-	-						302,748.00	597,252.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
57	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการ เมื่อมีเหตุสาธารณสุข		79,300.00	420,700.00	
58	โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	100,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
59	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68			✓	116,930.00	133,070.00	
60	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาภาคไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	
61	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการทั้งปี มีการจัดจ้างเช่า เครื่องเสียงตลอดทั้งปี		95,200.00	104,800.00	
62	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	
63	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 ส.ค. 68		ตรวจสอบสุขาภิบาล อาหารในโรงเรียน		74,490.00	325,510.00	
64	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	400,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	400,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
65	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	188,675.00	11,325.00	
66	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68			✓	194,975.00	5,025.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
67	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดประชุมแกนนำ สุขภาพชุมชนทุก เดือน		62,400.00	31,200.00	
68	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหากัศจีศรีริธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	
69	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,481,300.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68			✓	1,029,340.00	451,960.00	
70	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี		18,250.00	38,750.00	
71	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประชุมคณะกรรมการสภา เด็กและเยาวชนฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2568		12,075.00	27,925.00	
72	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงพื้นที่บริการ ทำบัตรประจำตัว คนพิการที่บ้าน		-	50,000.00	
73	โครงการบริการรับยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	10,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
74	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ เด็กและเยาวชน	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		ประสานหน่วยงาน เพื่อขอศึกษาดูงานใน เดือน ส.ค. 2568		-	300,000.00	
75	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	800.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	782,116.00	17,084.00	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	49,825.00	175.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
77	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ก.ค. 68		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมพิชิตยาเสพติด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2568		64,200.00	15,800.00	
78	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อผู้สูงอายุด้านอาหารคาวหวาน และสมุนไพรที่บ้าน เมื่อวันที่ 23-27,30 มิ.ย. 2568		111,805.00	138,195.00	
79	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สูงวัยอย่างมีคุณค่า ถ้ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน วันที่ 25 ก.ค. 2568		-	100,000.00	
80	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	60,800.00	39,200.00	
81	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	29,700.00	300.00	
82	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	285,448.00	14,552.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
83	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		กำหนดจัดกิจกรรม ถอดบทเรียน เศรษฐกิจชุมชน จาก เงินอุดหนุน เดือน ส.ค. 2568		253,480.00	146,520.00	
84	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประสานหน่วยงาน เพื่อขอศึกษาดูงานใน เดือน ส.ค. 2568		-	1,200,000.00	
85	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	750,000.00	-	19,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	729,305.00	1,695.00	
86	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		กำหนดจัดกิจกรรม Bike-Ride-Fancy วันที่ 20 ก.ค. 2568		-	20,000.00	
87	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	90,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	19,450.00	22,550.00	
89	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	420,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ประชุมคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2568		254,330.00	165,670.00	
90	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
91	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายสำหรับสตรี ยุคใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2568		13,800.00	86,200.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสาร ในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	✓			-	50,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น ยังไม่เริ่มดำเนินการ
93	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จร จัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ออกหน่วยทำหมัน สุนัขในวัด		98,400.00	201,600.00	
94	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		283,500.00	116,300.00	
95	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		สำรวจจำนวนสุนัข และแมวในเขต เทศบาล		-	80,000.00	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ /ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ / ชุมชนเพชรวิมล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า ผ้าแฟชั่นด้วยลายผ้าไทย /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน/ ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำEco Print /ชุมชน เสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป่าจักสาน เดคูพาจ /ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าแฟนซี / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมคุกกี /ชุมชน หลังอาชีวะ	26,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	26,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมถ้วย ขนมจีบ / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทศกาลและ เครื่องดื่มสมุนไพร/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชน ลูกเสือ-การุณราชบุรี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชน ฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและเครื่องดื่ม สมุนไพร /ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยสาकुใส่หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ /ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียว หมูแดดเดียว หมูฝอย /ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดที่เหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็มเปียก /ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็มเปียก /ชุมชนในลีก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กช็อกหน้านิ่มและเค้กส้มหน้านิ่ม/ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กวันขนมไทย (รุ่นเรนโบว์) /ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน /ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไตปลาแห้ง /ชุมชนสันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไตปลาแห้ง/ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกกากหมู และไตปลาแห้ง /ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน /ชุมชนเมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยอนกประสงค์ (สบู์เหลวจากสมุนไพรขมิ้นชัน) /ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบะหมี่เปิดอย่างเกี้ยวหมูแดง /ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำประมงชายฝั่ง ขั้นพื้นฐาน /ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วย เทคนิคเดคูพาจ /ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพันคอ Eco Print/ ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ (Eco Print)/ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนท่า แขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชน ไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้าย /ชุมชน บึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้าย (ต่อเนื่องปี 2567) /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้าย/ชุมชน ตลาดดอนนอก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้าย/ชุมชน ตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้าย/ชุมชน หน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายจาก สี่ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายจากสี่ ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์กระจุต /ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว /ชุมชน บางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว/ชุมชน ศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว/ ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำวันเค้กมะพร้าวอ่อน / ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกรีนเลื้อยอัตลักษณ์ ชุมชน/ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสบู่จากสมุนไพร / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสวรรค์/ชุมชนกรม ทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหุ้สเด๊ะ/ ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม ไส้กรอก ปลาต้ม(ต่อเนื่องปี 67) /ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดฝ่าเท้า/ชุมชน ราษฎร์อุทิศ	99,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	99,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชน ตลาดใหม่-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชน หัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเล หมึกหวาน กุ้งหวาน /ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ/ ชุมชน ร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะให้กับ ผู้ว่างงาน /ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่ากระเป่า สานจูด /ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กระเป๋ากระจูด /ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานผ้าสีแพนซี /ชุมชนวัด โพธาวาส	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรพอเพียงด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ตามพระราชดำริ /ชุมชนสิริสุข	130,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	130,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเสื้อ Eco Print /ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
161	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	840,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	837,746.87	2,253.13	
162	โครงการอุดหนุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ในการควบคุมจำนวนและโรคจากลิงแสมบริเวณรอบบึงขุนทะเลและสถานที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	200,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ส.ค. 68		ขอความเห็นชอบ จ่ายเงินอุดหนุนต่อ สภาเทศบาลในการ ประชุมสภาเทศบาล คราวถัดไป		-	200,000.00	
รวม		14,198,700.00	-	419,800						7,123,065.87	6,655,834.13	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
163	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	450,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการจัดงาน กิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายใน ปีงบประมาณ		229,525.00	220,475.00	
164	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68			✓	348,596.50	1,403.50	
165	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	85,000.00	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	543,815.00	41,185.00	
166	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมการเข้าร่วม แข่งขันทักษะ วิชาการระดับภาคใต้		92,216.00	1,107,784.00	
167	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		กำหนดจัดอบรม วันที่ 22-24 ก.ค. 2568		-	250,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดที่เหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
168	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รอเบิกค่าวัสดุ จัดทำข้อสอบภาค 1/2568		348,967.00	551,033.00	
169	โครงการส่งเสริมรุดรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 พ.ค. 68			✓	297,425.00	2,575.00	
170	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	37,100,200.00	100,000	800,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานโรงเรียนขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษาไตรมาส 4, งานนอกระบบฯ รอ อนุมัติเบิกจ่ายเพิ่มเติม		32,209,275.44	4,190,924.56	
171	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	56,311,400.00	380,000	1,690,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานนิเทศก์โอนไปตั้งจ่าย ที่สถานศึกษาไตรมาส 4, งานกิจการนักเรียน ร.ร.กีฬา ดำเนินการ เบิกค่าใช้จ่าย		44,088,219.28	10,913,180.72	
172	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68			✓	896,861.00	103,139.00	
173	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68			✓	118,800.00	31,200.00	
174	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง, ยืมเงิน ทตรงจ่าย		89,440.00	10,560.00	
175	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตามหลักสูตร พื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68		จัดเตรียมเอกสาร เพื่อจัดโครงการ		-	800,000.00	
176	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68			✓	110,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
177	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	58,795.00	1,205.00	
178	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	80,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
179	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	50,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
180	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	96,550.00	3,450.00	
181	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		-	200,000.00	
182	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		คณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร		5,883.00	694,117.00	
183	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมออกหน่วย		69,243.00	30,757.00	
184	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ยกเลิกโครงการ งดจัดโครงการ เนื่องจาก กทท. จังหวัด ปิดปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา จังหวัด ซึ่งเป็น สถานที่จัดโครงการ		-	300,000.00	
185	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	800,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
186	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
187	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		49,580.00	150,420.00	
188	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	1,400,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	3,070,550.00	529,450.00	
189	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	300,000.00	
190	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	50,000.00	
191	โครงการจัดงานประเพณีซึกพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	5,600,000.00	600,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมจัดงานประจำปี 2568		5,960,796.12	6,039,203.88	
192	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	200,000.00	25,700.00	1 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	1,974,270.50	29.50	
193	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	10,800.00	1 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	239,130.00	70.00	
194	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68			✓	649,850.00	150.00	
195	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	5,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
196	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2568		-	904,000.00	
197	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	990,000.00	351,150.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,301,344.00	39,806.00	
198	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,315,600.00	561,800.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,732,632.00	144,768.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
199	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	594,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		546,000.00	48,000.00	
200	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		520,800.00	7,200.00	
201	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	836,000.00	325,250.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,073,688.00	87,562.00	
202	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,232,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,217,700.00	14,300.00	
203	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	391,800.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,512,456.00	287,344.00	
204	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,955,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		7,942,000.00	13,200.00	
205	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,087,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	1,087,200.00	-	
206	อุดหนุนมัสยิดอิกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
207	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	
208	อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	
รวม		134,816,600.00	7,995,000.00	4,526,500.00						108,681,607.84	29,603,492.16	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
209	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68			✓	10,000.00	-	
210	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	33,650.00	46,350.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
211	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		- ประกาศใช้แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2567 - เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2568 - แก้ไขครั้งที่ 6/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2568 - การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ นโยบายผู้บริหาร		35,790.00	34,210.00	
212	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		- ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2567 - แก้ไขครั้งที่ 3/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2568 - เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหาร		23,577.00	326,423.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
213	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ณ ไตรมาสที่ 3/2568		20,730.00	9,270.00	
214	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	135,000.00	-	-	1 ก.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	135,000.00	
215	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณ หน้าสำนักงาน เทศบาล		12,000.00	88,000.00	
216	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 ก.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	80,000.00	
217	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	20,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
218	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ ราคากลาง		-	2,000,000.00	
219	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้ผู้รับจ้างส่งมอบ งานงวดที่ 1 เพื่อ พิจารณาใหม่		-	250,000.00	
รวม		23,105,000.00	-	-						135,747.00	22,969,253.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		244,783,010.00	8,825,000.00	5,396,300.00						126,102,270.71	122,109,439.29	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		อยู่ระหว่างสอบเขตที่ดิน		-	6,000,000.00	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		อยู่ระหว่างสอบเขตที่ดิน		-	5,930,000.00	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	426,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		อยู่ระหว่างพิจารณาผล ราคากลาง		-	722,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนปากน้ำ จากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขต เทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างสอบเขตที่ดิน		-	47,666,000.00	
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลี้ยวเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	203,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงฝิวจراجรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบอกสะพาน	200,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68		จัดส่งแบบรูปรายการ และราคากลาง แก่ฝ่ายพัสดุเพื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		-	200,000.00	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 11	184,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	184,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
9	โครงการขยายเขตประปาถนอมประจักษ์ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		ทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2		-	166,000.00	
10	โครงการขยายเขตประปาถนอมประจักษ์ 6	118,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	118,000.00	
11	โครงการขยายเขตประปาถนอมประจักษ์ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	115,000.00	
12	โครงการขยายเขตประปาถนอมประจักษ์ 2	128,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	128,000.00	
13	โครงการขยายเขตประปาถนอมชนเกษม 50/1	461,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	461,000.00	
14	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6	97,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	97,000.00	
15	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	115,000.00	
16	โครงการขยายเขตประปาถนอมศรีเกษมตัดใหม่ (ร้านเดอะซอพท์)	119,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	119,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการขยายเขตประปาถนอมกาญจนวิถิ 6	213,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	213,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการขยายเขตประปาถนอมกาญจนวิถิ 20	104,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	104,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
19	โครงการขยายเขตประปาถนนสาย 420 (ข้าวแกงสมุย - หัวสะพานศาลพ่อตาหวด)	1,360,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	1,360,000.00	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนพ่อบุญทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง		-	527,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	65,000,000.00	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง		-	3,132,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	30,000,000.00	
25	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	10,000,000.00	
รวม		173,806,000.00						-	173,806,000.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม										
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	6,800,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย		4,380,464.00	2,419,536.00	
รวม		6,800,000.00						4,380,464.00	2,419,536.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		180,606,000.00						4,380,464.00	176,225,536.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนวนิถี	28,358,770.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่างเสนอผล การตรวจรับงานจ้าง		-	28,358,770.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5,641,230.00	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		อยู่ระหว่างพิจารณาผล การประกวดราคา e-bidding		-	5,641,230.00	
รวม		34,000,000.00						-	34,000,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		34,000,000.00						-	34,000,000.00	

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 28 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 518,106,648 บาท (ห้าร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 182,458,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	182,458,000.00	166,218,267.78	2	182,458,000.00	166,218,267.78	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2	182,458,000.00	166,218,267.78	2	182,458,000.00	166,218,267.78	-	-	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			100.00			0.00			0.00		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,072,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	7,072,000.00	4,455,000.00	2	7,072,000.00	4,455,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2	7,072,000.00	4,455,000.00	2	7,072,000.00	4,455,000.00	-	-	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			100.00			0.00			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 328,576,648 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	328,576,648.00	10,015,974.00	5	11,184,000.00	10,015,974.00	16	313,142,648.00	-	-	-	3	4,250,000.00
รวม	24	328,576,648.00	10,015,974.00	5	11,184,000.00	10,015,974.00	16	313,142,648.00	-	-	-	3	4,250,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			20.83			66.67			0.00		12.50
รวม	28	518,106,648.00	180,689,241.78	9	200,714,000.00	180,689,241.78	16	313,142,648.00	-	-	-	3	4,250,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			32.14			57.14			0.00		10.72

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	61,462,989.24	6,005,010.76	
2	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	104,755,278.54	10,234,721.46	
รวม		182,458,000.00						166,218,267.78	16,239,732.22	
รวมทุกยุทธศาสตร์		182,458,000.00						166,218,267.78	16,239,732.22	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ่วงทะเล จากแยกตาดานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	3,690,000.00	2,510,000.00	
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	765,000.00	107,000.00	
รวม		7,072,000.00							2,617,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		7,072,000.00							2,617,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	8,905,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบบูรปรายการ		-	2,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างพิจารณาผล ราคากลาง		-	2,328,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	947,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ที่จะทำ การก่อสร้างไม่เพียงพอ		-	495,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	8,070,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบบูรปรายการ		-	3,490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสบะบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากระดับจุดรับการ ระบายน้ำด้านหน้าโครงการ มีระดับที่สูงกว่า ทำให้ ไม่สามารถระบายน้ำได้		-	1,200,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 18%		-	1,250,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	749,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากรายละเอียด ในแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความกว้าง ฝิวจรรจร		-	2,555,000.00	
12	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายการ		-	2,896,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	645,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67			✓	555,000.00	2,000.00	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67		รายงานผลการพิจารณา (อยู่ระหว่างสั่งจ้างก่อสร้าง)		-	2,820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุโมงค์จราจร)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	386,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	3,510,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนศรีเกษม ขยายข้างอุทธิยุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	1,794,000.00	706,000.00	
19	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน		-	19,800,778.00	
20	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนการุณราษฎร์	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน		-	70,998,138.00	
21	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน		-	184,347,732.00	
22	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจراجรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,447,985.70	87,014.30	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,964,692.80	117,307.20	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนดอนนก STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	4,254,295.50	255,704.50	
รวม		328,576,648.00						10,015,974.00	318,560,674.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		328,576,648.00						10,015,974.00	318,560,674.00	

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้ มีทั้งหมด 45 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 140,845,819 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกักเงินไว้ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 14,210,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	14,210,000.00	12,405,000.00	6	14,210,000.00	12,405,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	6	14,210,000.00	12,405,000.00	6	14,210,000.00	12,405,000.00	-	-	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			100.00			0.00			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 56,384,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	45,219,519.00	13,837,297.39	10	16,001,519.00	12,883,887.51	10	25,561,000.00	953,409.88	-	-	2	3,657,000.00
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,157,000.00	3,180,000.00	1	4,000,000.00	3,180,000.00	1	1,157,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	27	56,384,519.00	17,017,297.39	11	20,001,519.00	16,063,887.51	14	32,726,000.00	953,410	-	-	2	3,657,000
คิดเป็นร้อยละ		100.00			40.74			51.85			0.00		7.41

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้

ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน **12 โครงการ** งบประมาณที่กันเงินไว้ **70,251,300 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น		ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก		
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	32,000,000.00	-	-	-	-	2	32,000,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	4	22,200,100.00	3,866,888.00	1	4,130,000.00	3,866,888.00	3	18,070,100.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	651,200.00	536,200.00	2	651,200.00	536,200.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	12	70,251,300.00	4,403,088.00	3	4,781,200.00	4,403,088.00	9	65,470,100.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			25.00			75.00		0.00			0.00
รวม	45	140,845,819.00	33,825,385.39	20	38,992,719.00	32,871,975.51	23	98,196,100.00	953,409.88	-	-	2	3,657,000
คิดเป็นร้อยละ		100.01			44.44			51.11		0.00			4.45

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียยเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	800,000.00	-	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	1,700,000.00	10,000.00	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	1,050,000.00	250,000.00	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	2,900,000.00	300,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	2,155,000.00	445,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	3,800,000.00	800,000.00	
รวม		14,210,000.00	14,210,000.00						12,405,000.00	1,805,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		14,210,000.00	14,210,000.00						12,405,000.00	1,805,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อน้ำขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2		-	660,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนตอนนอก จากสี่แยกถนนม้าย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 75%		953,409.88	8,146,590.12	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการขยายเขตประปา - ถนนกาญจนาวิถี 26 - ซอยเลี้ยวเมืองข้างโรงแรมเพชรพจน์ - ถนนคลองฉนาก (ตอนที่ 2)	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	746,407.55	934,111.45	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	181,000.00	6,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	4,016,000.00	10,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	1,648,000.00	206,000.00	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตอนนอก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		พิจารณาผลราคากลาง		-	2,341,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	326,000.00	29,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระดับท่อเดิมต่าง ระดับมาก น้ำไม่สามารถไหลได้		-	1,857,000.00	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ขออนุมัติสั่งจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก		-	1,877,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ขออนุมัติสั่งจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก		-	1,978,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ประกาศผลผู้ชนะการ เสนอราคา		-	4,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	940,000.00	30,000.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	700,000.00	29,000.00	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	619,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
16	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	1,130,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 35%		-	2,927,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโฉลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2		-	929,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจากรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากที่ดินสาธารณะ ด้านท้าย/จุดที่ตั้งอาคาร สถานีสูบน้ำแคบ		-	1,800,000.00	
20	โครงการปรับปรุงฝิวจากรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชฎูร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,121,479.96	878,520.04	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,555,000.00	395,000.00	
22	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	1,650,000.00	600,000.00	
รวม		45,219,519.00	45,219,519.00						13,837,297.39	31,382,221.61	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
23	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณา ผล		-	1,795,000.00	
24	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการปรับปรุง อาคาร		-	3,363,000.00	
รวม		5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
25	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนภูมิ 2,3 อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง		-	1,157,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	3,180,000.00	820,000.00	
รวม		5,157,000.00	5,157,000.00						3,180,000.00	1,977,000.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
27	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68		ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ต.ค. 2568		-	850,000.00	
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		56,384,949.00	56,384,519.00						17,017,297.39	39,367,221.61	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	5,500,000.00	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	2,900,000.00	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางปลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ก.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	2,000,000.00	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	5,000,000.00	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างก่อสร้าง		-	4,500,000.00	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	27,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา รอเรียกทำสัญญา		-	27,500,000.00	
รวม		32,000,000.00	32,000,000.00						-	32,000,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,429,600.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุญาตใช้ที่ดิน		-	15,000,000.00	
9	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	4,130,000.00	4,130,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	3,866,888.00	263,112.00	
10	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	1,640,500.00	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		ผู้บริหารมีคำสั่งให้ชะลอ โครงการ เนื่องจาก มีการแก้ไขแบบแปลน		-	1,640,500.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		22,200,100.00	22,200,100.00						3,866,888.00	18,333,212.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
11	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	385,000.00	115,000.00	
12	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	151,200.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	151,200.00	-	
รวม		750,000.00	651,200.00						536,200.00	115,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		70,350,100.00	70,251,300.00						4,403,088.00	65,848,212.00	
