

รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประจำไตรมาสที่ 4/2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)



รวบรวมโดย : งานวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



สารบัญ



หน้า
1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

หน้า
2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

หน้า
7

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน้า
9

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

หน้า
10

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

หน้า
11

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ,จ่ายจากเงินสะสม และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

หน้า
42


สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

หน้า
48

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566-2567 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

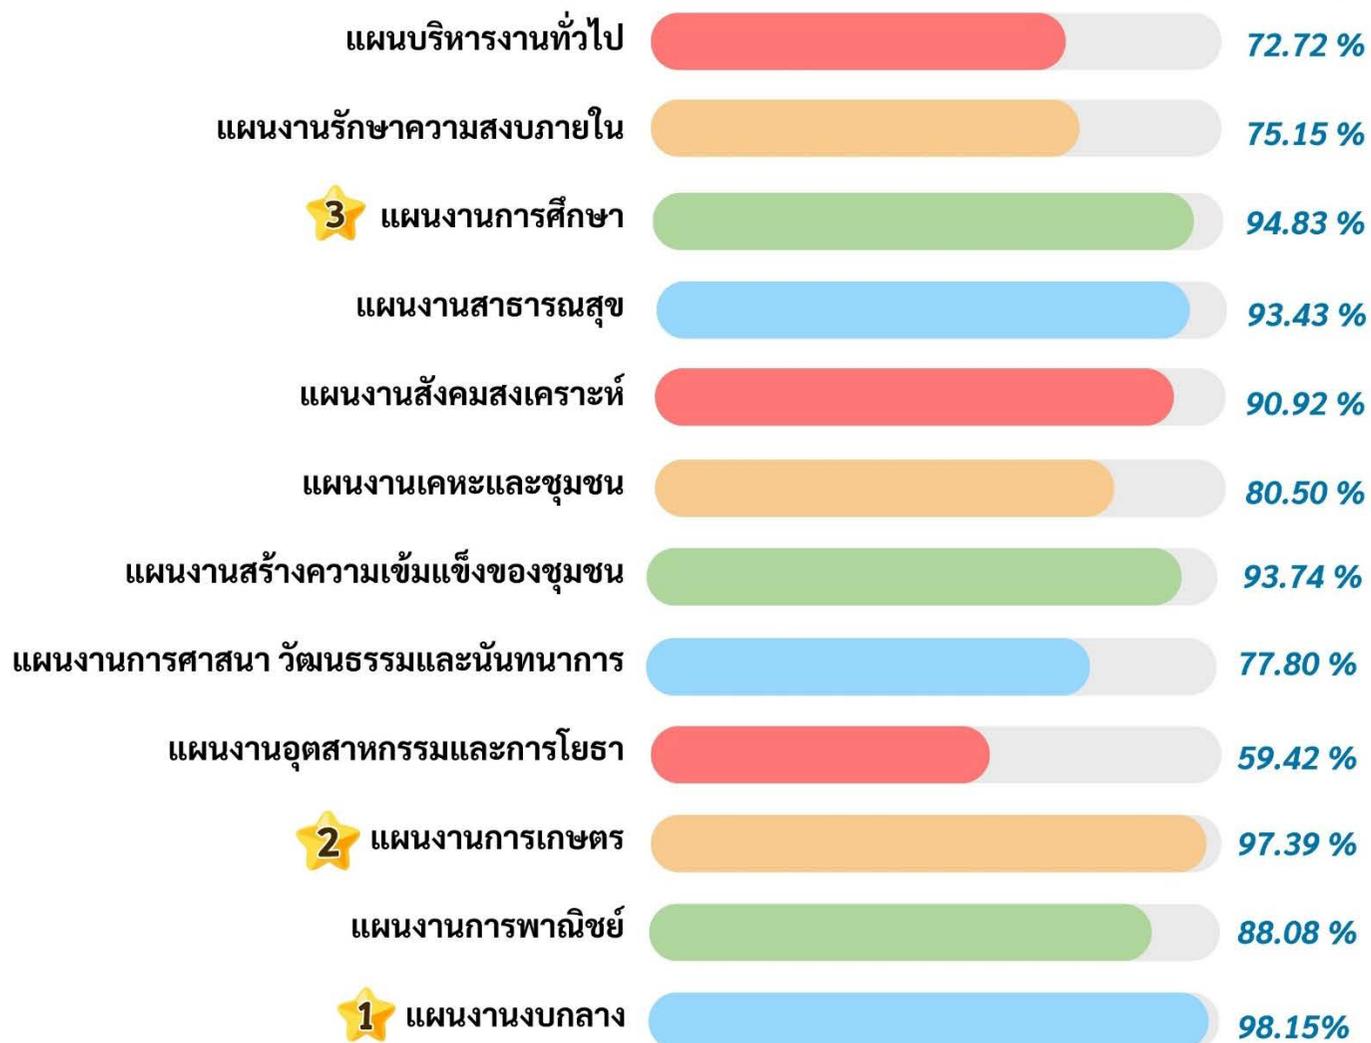

- งบลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 28.06**
- รายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 92.41**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568)

รายจ่ายประจำปีร้อยละ 100 (ของรายจ่ายประจำปีทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 100 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	164,827,228.00	39,150,950.00	22,130,339.38	40,909,845.01	132,240,825.65	8,697,167.96	72.72	
	รายจ่ายประจำปี	162,098,328.00	34,868,260.00	22,127,339.38	36,951,555.01	129,205,855.65	8,681,837.96	73.90	
	- งานบริหารทั่วไป	96,959,603.00	26,801,700.00	16,566,636.88	35,118,325.99	67,835,707.07	4,240,633.06		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,635,500.00	-	548,900.00	47,250.00	3,640,579.36	398,770.64		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	59,622,148.00	8,061,560.00	5,006,802.50	1,780,979.02	57,215,414.22	3,680,512.26		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	881,077.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	514,155.00	361,922.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,728,900.00	4,282,690.00	3,000.00	3,958,290.00	3,034,970.00	15,330.00	43.30	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	2,317,500.00	3,100,810.00	-	3,596,430.00	1,816,670.00	5,210.00		
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	69,000.00	106,700.00	-	8,900.00	166,800.00	-		
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	342,400.00	1,075,180.00	3,000.00	352,960.00	1,051,500.00	10,120.00		คลัง/สารสนเทศฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,459,050.00	1,902,260.00	3,614,820.00	5,588,701.00	26,864,375.63	3,293,413.37	75.15	
	รายจ่ายประจำปี	31,702,550.00	1,430,760.00	3,614,820.00	580,701.00	25,905,475.63	3,032,313.37	87.76	
	- งานเทศกิจ	10,781,450.00	417,760.00	490,660.00	9,450.00	9,307,237.89	1,391,862.11		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	14,876,800.00	336,000.00	2,064,500.00	110,217.00	11,700,745.41	1,337,337.59		
	- งานจราจร	6,044,300.00	677,000.00	1,059,660.00	461,034.00	4,897,492.33	303,113.67		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,756,500.00	471,500.00	-	5,008,000.00	958,900.00	261,100.00	15.40	
	- งานเทคนิค	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-		
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครุภัณฑ์)	-	453,500.00	-	-	452,400.00	1,100.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานจราจร (ครุภัณฑ์)	5,756,500.00	-	-	4,990,000.00	506,500.00	260,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
3	แผนงานการศึกษา	342,190,110.00	11,316,853.00	20,303,253.00	6,025,500.08	315,963,615.75	11,214,594.17	94.83	
	รายจ่ายประจำ	341,295,110.00	8,151,253.00	20,303,253.00	2,885,100.08	315,043,415.75	11,214,594.17	95.72	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,329,300.00	437,877.00	1,251,077.00	3,300.00	6,731,398.15	781,401.85		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	185,774,260.00	4,680,240.00	8,696,776.00	2,879,600.08	173,996,368.04	4,881,755.88		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	140,989,150.00	2,881,236.00	9,363,500.00	2,200.00	129,391,866.45	5,112,819.55		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,202,400.00	151,900.00	991,900.00	-	4,923,783.11	438,616.89		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	895,000.00	3,165,600.00	-	3,140,400.00	920,200.00	-	22.66	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	131,400.00	-	131,400.00	-	-		
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(ครุภัณฑ์)	470,000.00	3,005,200.00	-	2,980,000.00	495,200.00	-		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	29,000.00	-	29,000.00	-	-		
4	แผนงานสาธารณสุข	71,974,050.00	1,547,237.00	7,132,450.87	2,744,213.82	62,025,935.30	1,618,687.01	93.43	
	รายจ่ายประจำ	68,882,850.00	1,373,137.00	7,132,450.87	346,213.82	61,287,135.30	1,490,187.01	97.09	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,484,750.00	230,818.00	1,452,427.00	37,000.00	7,995,111.35	231,029.65		สำนักสาธารณสุข
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,297,050.00	306,330.00	3,465,272.00	127,985.00	15,334,642.54	675,480.46		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	40,101,050.00	835,989.00	2,214,751.87	181,228.82	37,957,381.41	583,676.90		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,091,200.00	174,100.00	-	2,398,000.00	738,800.00	128,500.00	22.63	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	40,000.00	96,000.00	-	-	134,500.00	1,500.00		สำนักสาธารณสุข
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ครุภัณฑ์)	68,200.00	78,100.00	-	-	146,300.00	-		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	2,983,000.00	-	-	2,398,000.00	458,000.00	127,000.00		
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,710,870.00	314,480.00	610,680.00	290,050.00	10,377,727.78	746,892.22	90.92	
	รายจ่ายประจำ	11,209,220.00	244,680.00	610,680.00	16,550.00	10,092,277.78	734,392.22	93.07	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,683,800.00	32,560.00	411,760.00	-	4,115,183.82	189,416.18		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,525,420.00	212,120.00	198,920.00	16,550.00	5,977,093.96	544,976.04		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	501,650.00	69,800.00	-	273,500.00	285,450.00	12,500.00	49.95	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(ครุภัณฑ์)	39,950.00	69,800.00	-	-	109,750.00	-		สำนักช่าง
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(ครุภัณฑ์)	461,700.00	-	-	273,500.00	175,700.00	12,500.00		
6	แผนงานเคหะและชุมชน	185,567,010.00	13,032,648.87	9,495,507.00	33,556,135.35	152,235,252.31	3,312,764.21	80.50	
	รายจ่ายประจำ	157,059,010.00	12,843,148.87	9,495,507.00	5,056,135.35	152,037,752.31	3,312,764.21	94.78	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,584,910.00	837,746.87	-	-	2,422,570.95	85.92		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	11,229,050.00	1,866,540.00	552,380.00	245,578.50	12,180,430.13	117,201.37		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	123,899,650.00	7,135,562.00	5,502,924.00	4,762,456.85	118,229,665.31	2,540,165.84		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	20,345,400.00	3,003,300.00	3,440,203.00	48,100.00	19,205,085.92	655,311.08		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	28,508,000.00	189,500.00	-	28,500,000.00	197,500.00	-	0.69	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	20,008,000.00	34,000.00	-	20,000,000.00	42,000.00	-		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ค่าครุภัณฑ์)	8,500,000.00	155,500.00	-	8,500,000.00	155,500.00	-		สช. / สธ.

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,241,100.00	39,000.00	2,142,800.00	-	16,065,074.98	1,072,225.02	93.74	
	รายจ่ายประจำ	19,241,100.00	39,000.00	2,142,800.00	-	16,065,074.98	1,072,225.02	93.74	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,770,000.00	-	1,062,000.00	-	6,389,750.00	318,250.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,471,100.00	39,000.00	1,080,800.00	-	9,675,324.98	753,975.02		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	28,648,600.00	8,029,840.00	4,729,940.00	4,939,776.83	24,856,674.30	2,152,048.87	77.80	
	รายจ่ายประจำ	28,648,600.00	7,838,040.00	4,729,940.00	4,818,176.83	24,786,474.30	2,152,048.87	78.05	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,736,350.00	967,100.00	1,836,000.00	28,300.00	6,616,053.03	1,223,096.97		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,643,950.00	5,975,740.00	864,740.00	4,759,876.83	12,782,136.25	212,936.92		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	7,268,300.00	895,200.00	2,029,200.00	30,000.00	5,388,285.02	716,014.98		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	191,800.00	-	121,600.00	70,200.00	-	36.60	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	-	56,000.00	-	56,000.00	-	-		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	65,600.00	-	65,600.00	-	-		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว(ครุภัณฑ์)	-	70,200.00	-	-	70,200.00	-		
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	151,384,047.00	18,880,628.00	20,109,816.50	59,043,988.72	89,217,794.26	1,893,075.52	59.42	
	รายจ่ายประจำ	59,864,150.00	5,357,728.00	8,878,879.00	77,800.72	55,117,857.82	1,147,340.46	97.83	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,178,900.00	654,000.00	1,536,958.00	9,200.00	7,099,470.41	187,271.59		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	51,685,250.00	4,703,728.00	7,341,921.00	68,600.72	48,018,387.41	960,068.87		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	91,519,897.00	13,522,900.00	11,230,937.50	58,966,188.00	34,099,936.44	745,735.06	36.35	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	-	267,600.00	-	76,400.00	191,200.00	-		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	2,500,000.00	856,300.00	-	387,350.00	2,883,350.00	85,600.00		
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	89,019,897.00	12,399,000.00	11,230,937.50	58,502,438.00	31,025,386.44	660,135.06		
10	แผนงานการเกษตร	6,369,150.00	303,106.00	1,018,008.00	67,000.00	5,506,835.73	80,412.27	97.39	
	รายจ่ายประจำ	6,369,150.00	303,106.00	1,018,008.00	67,000.00	5,506,835.73	80,412.27	97.39	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,369,150.00	303,106.00	1,018,008.00	67,000.00	5,506,835.73	80,412.27		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,484,700.00	538,285.00	264,000.00	144,718.30	3,310,991.57	303,275.13	88.08	
	รายจ่ายประจำ	3,484,700.00	465,385.00	264,000.00	144,718.30	3,239,091.57	302,275.13	87.87	
	- งานตลาดสด	600,200.00	16,000.00	7,000.00	-	494,163.00	115,037.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,884,500.00	449,385.00	257,000.00	144,718.30	2,744,928.57	187,238.13		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	72,900.00	-	-	71,900.00	1,000.00	98.63	
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ครุภัณฑ์)	-	72,900.00	-	-	71,900.00	1,000.00		สำนักสาธารณสุข
12	แผนงานงบกลาง	302,144,085.00	1,486,926.88	4,990,600.00	1,250.00	293,122,439.16	5,516,722.72	98.15	
	รายจ่ายประจำ	302,144,085.00	1,486,926.88	4,990,600.00	1,250.00	293,122,439.16	5,516,722.72	98.15	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,325,000,000.00	96,542,214.75	96,542,214.75	153,311,179.11	1,131,787,542.42	39,901,278.47	85.42	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,191,998,853.00	74,401,424.75	85,308,277.25	50,945,201.11	1,091,409,685.98	38,737,113.41	92.41	
	รวมงบลงทุน	133,001,147.00	22,140,790.00	11,233,937.50	102,365,978.00	40,377,856.44	1,164,165.06	28.06	

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภท

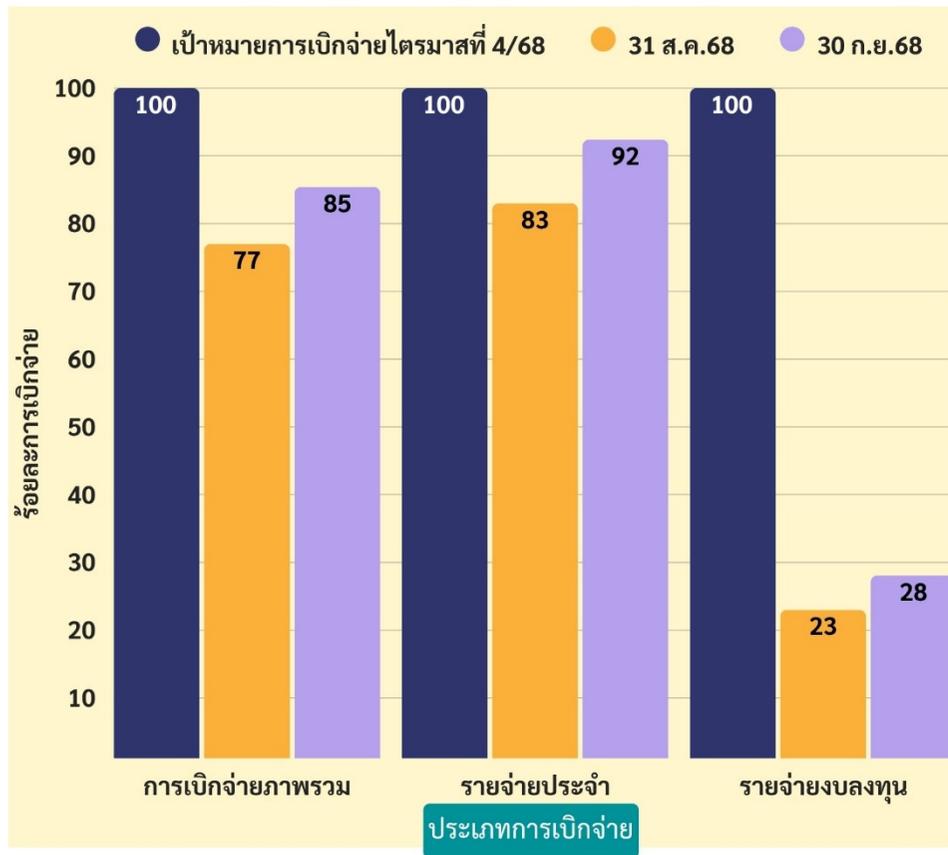

ผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน

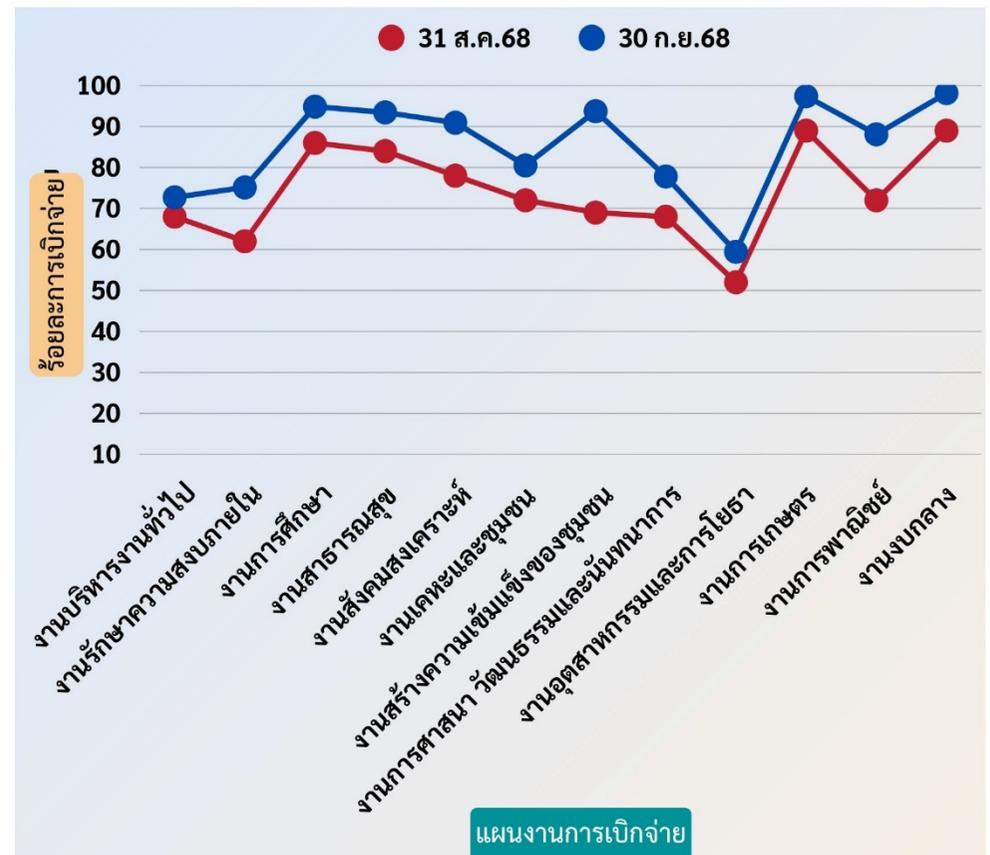

ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 8.58 ของงบประมาณทั้งหมด
- การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ม 2568 คิดเป็นร้อยละ 9.02 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด
- การเบิกจ่ายงบลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ม 2568 คิดเป็นร้อยละ 5.35 ของงบลงทุนทั้งหมด

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ร้อยละ
79.84

ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 206 โครงการ

ร้อยละ
15.12

อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 39 โครงการ


ร้อยละ
2.71

ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 7 โครงการ

ร้อยละ
2.33

ยกเลิก
จำนวน 6 โครงการ

โครงการทั้งหมด : 258 โครงการ




สถานะการดำเนินโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ
2.71 %

ยกเลิก
2.33 %

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
15.12 %

ดำเนินการเสร็จ
79.84 %

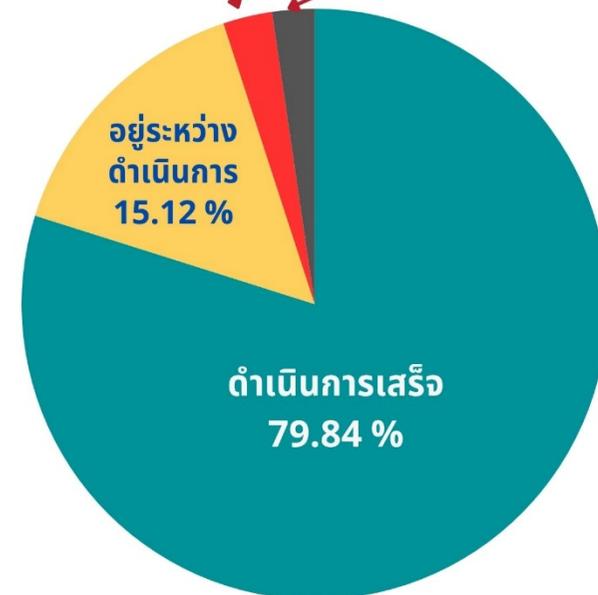

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยนับ : โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี



แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ

- 1) งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- 2) จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- 3) จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



**สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	120	35.71	370,737,020.00	37.21	79	23.51	280,818,710.00	28.19	78	23.21	280,818,710.00	28.19
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	9	2.68	10,300,000.00	1.03	7	2.08	5,780,000.00	0.58	6	1.79	5,780,000.00	0.58
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7	2.08	144,500,000.00	14.50	3	0.89	716,000.00	0.07	3	0.89	716,000.00	0.07
4	ด้านสวัสดิการสังคมและ คุณภาพชีวิต	122	36.31	184,145,200.00	18.48	106	31.55	12,742,540.00	1.28	99	29.46	12,532,540.00	1.26
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	59	17.56	259,186,150.00	26.02	52	15.48	156,371,600.00	15.70	49	14.58	156,286,600.00	15.69
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	19	5.65	27,374,000.00	2.75	11	3.27	22,947,000.00	2.30	10	2.98	22,812,000.00	2.29
รวมทั้งสิ้น		336	100.00	996,242,370.00	100.00	258	76.79	479,375,850.00	48.12	245	72.92	478,945,850.00	48.08

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 258 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 479,375,850 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 230 โครงการ งบประมาณ 264,769,850 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	52	73,012,710.00	31,132,901.50	36	39,367,710.00	31,132,901.50	15	33,645,000.00	-	-	-	1	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	5,780,000.00	4,736,145.00	6	5,780,000.00	4,736,145.00	-	-	-	1	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	716,000.00	634,349.00	3	716,000.00	634,349.00	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	106	12,742,540.00	11,074,711.87	99	12,532,540.00	11,074,711.87	-	-	-	6	210,000.00	1	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	51	149,571,600.00	134,322,496.39	42	131,353,400.00	124,460,139.63	6	18,133,200.00	9,862,356.76	-	-	3	85,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	22,947,000.00	479,107.00	8	812,000.00	479,107.00	2	22,000,000.00	-	-	-	1	135,000.00
รวม	230	264,769,850.00	182,379,710.76	194	190,561,650.00	172,517,354.00	23	73,778,200.00	9,862,356.76	7	210,000.00	6	220,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			84.35			10.00			3.04		2.61

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 180,606,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	173,806,000.00	2,767,900.00	9	2,784,000.00	2,767,900.00	16	171,022,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	1	6,800,000.00	4,380,464.00	1	6,800,000.00	4,380,464.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	26	180,606,000.00	7,148,364.00	10	9,584,000.00	7,148,364.00	16	171,022,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			38.46			61.54			0.00		0.00

3. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 34,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	34,000,000.00	4,371,766.00	2	34,000,000.00	4,371,766.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2	34,000,000.00	4,371,766.00	2	34,000,000.00	4,371,766.00	-	-	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			100.00			0.00			0.00		0.00

รวมทั้งสิ้น	258	479,375,850.00	193,899,840.76	206	234,145,650.00	184,037,484.00	39	244,800,200.00	9,862,356.76	7	210,000.00	6	220,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			79.84			15.12			2.71		2.33

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่าไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		ยกเลิกผลการพิจารณา เนื่องจากผู้เสนอราคา ไม่ผ่านคุณสมบัติ (สภาเทศบาลฯ อนุมัติกัน เงินงบประมาณ กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน)		-	15,920,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี 20 ช่วง 2	528,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	462,400.00	65,600.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนการบินไทย	769,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68			✓	630,334.00	138,666.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก	7,187,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	4,008,182.50	3,178,817.50	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2 แยกขวา 1	761,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	666,570.00	94,430.00	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 39	580,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68			✓	508,640.00	71,360.00	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 35	921,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68			✓	754,954.00	166,046.00	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าอาว	462,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68			✓	378,674.00	83,326.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	571,000.00	-	571,000.00	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการ ที่ซ้ำซ้อนกับโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนด้านหลัง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8		-	-	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 25	2,723,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68			✓	2,419,469.00	303,531.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเรือนจำเก่า	436,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68			✓	357,440.00	78,560.00	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีพุนพิน	1,137,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68			✓	931,332.00	205,668.00	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 21	7,485,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68			✓	5,978,900.00	1,506,100.00	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 4	189,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68			✓	155,196.00	33,804.00	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 6	419,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68			✓	343,362.00	75,638.00	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2	1,402,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	1,228,521.00	173,479.00	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ 24	672,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	550,420.00	121,580.00	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 16	329,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	301,076.00	27,924.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 18/1	704,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	644,360.00	59,640.00	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 18/2	493,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	451,588.00	41,412.00	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ่อนไก่ ซอยนฤมล	261,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	214,032.00	46,968.00	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 10	229,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	188,140.00	40,860.00	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ 4	717,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	615,006.00	101,994.00	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ	3,147,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	2,577,648.00	569,352.00	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนาวิถี	6,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68			✓	5,001,000.00	999,000.00	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 0% (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อหนี้ ผูกพัน)		-	6,900,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกการุณราชบุรี	488,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 0% (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อหนี้ ผูกพัน)		-	488,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
28	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 5% (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อนนี้ ผูกพัน)		-	432,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกเทศบาล	493,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 0% (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อนนี้ ผูกพัน)		-	493,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกไทยสมุทร	462,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	454,000.00	8,000.00	
31	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธรรมบูชา	489,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 5% (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อนนี้ ผูกพัน)		-	489,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธารา	378,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 0% (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อนนี้ ผูกพัน)		-	378,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกหลักสี่	451,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 10% (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อนนี้ ผูกพัน)		-	451,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
34	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกวัดโพธิ์	473,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 0% (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อนนี้ ผูกพัน)		-	473,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกแสงเพชร	465,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	457,000.00	8,000.00	
36	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกอนามัย	392,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	357,000.00	35,000.00	
37	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก (ระหว่าง ซอย 20 และซอย 20/1)	101,970.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	101,967.79	2.21	
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 2 (ท้ายซอย)	33,500.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	33,492.07	7.93	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนท่าโรงช้าง ซอยประยูรการช่าง แยกซ้าย	30,650.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	30,646.94	3.06	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปทุมพร 6/2	53,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	53,014.22	5.78	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี้ยวเมือง ซอยท่าทราย	40,700.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	40,694.24	5.76	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม (ทางเข้าสวนหลวงวีรสิทธิ์)	67,370.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	67,368.27	1.73	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม 7	24,130.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	24,119.94	10.06	
44	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 11/1	25,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	25,011.25	8.75	
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสันติสุข 1	42,110.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	42,104.50	5.50	
46	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนอำเภอ ซอยมินตรา (ข้างภัตตาคารบัวทอง)	79,240.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	79,237.78	2.22	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
47	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	4,507,000.00	-	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68		ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่ายงบประมาณ (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อนนี้ ผูกพัน)		-	4,507,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
48	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 18 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	355,000.00	-	1 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68		สภาเทศบาลฯ อนุมัติกัน เงินงบประมาณ กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน		-	355,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
49	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกรมหลวงอนุวดี (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	490,000.00	-	1 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68		สภาเทศบาลฯ อนุมัติกัน เงินงบประมาณ กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน		-	490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
50	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 5 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	826,000.00	-	1 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68		สภาเทศบาลฯ อนุมัติกัน เงินงบประมาณ กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน		-	826,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาเก็บ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	806,000.00	-	1 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68		สภาเทศบาลฯ อนุมัติกัน เงินงบประมาณ กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน		-	806,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาปก (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	637,000.00	-	1 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68		สภาเทศบาลฯ อนุมัติกัน เงินงบประมาณ กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน		-	637,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		65,962,710.00	7,621,000.00	571,000						31,132,901.50	41,879,808.50	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
53	โครงการเคหะตาวน/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	493,600.00	6,400.00	
54	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	30,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	422,970.00	47,030.00	
55	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	200,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	168,800.00	31,200.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
56	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	400,000.00	-	400,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การประชุมหรือแนวทางการ การจัดตั้งตลาด ยังไม่สามารถสรุปผล เพื่อบริหารจัดการ การจัดตลาดได้
57	โครงการเทศกาลดนตรี	1,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	589,575.00	910,425.00	
58	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	1,500,000.00	-	220,000.00	1 ก.พ. 68	31 พ.ค. 68			✓	1,231,200.00	48,800.00	
59	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	830,000.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,830,000.00	-	
รวม		5,800,000.00	830,000	850,000						4,736,145.00	1,043,855.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
60	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	300,000.00	-	184,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	108,355.00	7,645.00	
61	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	226,060.00	73,940.00	
62	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	299,934.00	66.00	
รวม		900,000.00	-	184,000						634,349.00	81,651.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
63	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	191,327.00	308,673.00	
64	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	100,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากจะดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนการเผชิญเหตุ กรณีแผ่นดินไหว จำเป็นต้องเตรียมข้อมูลให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์ ความสามารถด้าน บุคลากรและเครื่องมือใน การตอบโต้สถานการณ์ สมมติ เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ สูงสุดในการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร จึง ยกเลิก		-	-	
65	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและ หลักสูตรทบทวน)	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68			✓	116,930.00	133,070.00	
66	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	
67	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	54,400.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	134,400.00	11,200.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
68	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	
69	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	400,000.00	-	230,000.00	1 พ.ย. 67	31 ส.ค. 68			✓	169,870.00	130.00	
70	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	400,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	367,505	32,495.00	
71	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	188,675.00	11,325.00	
72	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68			✓	194,975.00	5,025.00	
73	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	85,800.00	7,800.00	
74	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	
75	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,481,300.00	-	451,960.00	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68			✓	1,029,340.00	-	
76	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68			✓	41,910.00	15,090.00	
77	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	13,325.00	26,675.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
78	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	32,600.00	17,400.00	
79	โครงการบริการรับยื่นสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68			✓	4,805.00	5,195.00	
80	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68			✓	237,975.00	62,025.00	
81	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	800.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	782,116.00	17,084.00	
82	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	49,825.00	175.00	
83	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ก.ค. 68			✓	76,385.00	3,615.00	
84	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	135,714.00	114,286.00	
85	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	99,965.00	35.00	
86	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	60,800.00	39,200.00	
87	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	29,700.00	300.00	
88	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	285,448.00	14,552.00	
89	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	363,930.00	36,070.00	
90	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,052,375.00	147,625.00	
91	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	750,000.00	-	19,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	729,305.00	1,695.00	
92	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	20,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
93	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	90,000.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
94	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	19,450.00	22,550.00	
95	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	420,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	280,880.00	139,120.00	
96	โครงการสตริตันแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	154,840.00	45,160.00	
97	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	55,200.00	44,800.00	
98	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68			✓	17,870.00	32,130.00	
99	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จรจัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	197,600.00	102,400.00	
100	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	378,000.00	21,800.00	
101	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	45,600.00	34,400.00	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ /ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดดอกไม้ / ชุมชนเพชรวิลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า ผ้าแฟชั่นด้วยลายผ้าไทย /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน/ ชุมชนราษฎร์บำรุง-คอนนง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำEco Print /ชุมชน เสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าจักสาน เดคูพาง /ชุมชนกาญจนวิถีสระวิ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าแฟชั่น / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมคุกกี /ชุมชน หลังอาชีวะ	26,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	26,000.00	-	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมถ้วย ขนมจีบ / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทศกาลและ เครื่องดื่มสมุนไพร/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชน ลูกเสือ-การณราษฎร์	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชน ฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและเครื่องดื่ม สมุนไพร /ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยสาธิตไล่หนู ข้าวเกรียบปากหม้อ /ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียว หมูแดดเดียว หมูฝอย /ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนในลิก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการค้าช็อกโกแลตน้ำนมและ เค้กส้มหน้าน้ำนม/ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกวนขนมไทย (วุ้นเรนโบว์) /ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และ เหรียญโปรยทาน /ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำปลาแห้ง /ชุมชน สันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำปลาแห้ง/ชุมชน ปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกกากหมู และ ไตปลาแห้ง /ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน /ชุมชน เมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ (สบู์เหลวจากสมุนไพรเข้มข้น) /ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบะหมี่เปิดอย่าง เกี่ยวหมุดัง /ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำประมงชายฝั่ง ขั้นพื้นฐาน /ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วย เทคนิคเดคูพาจ /ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพันคอ Eco Print/ ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ (Eco Print)/ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายไปไม้ / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม /ชุมชนท่า แขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม /ชุมชน ไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม /ชุมชน บึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม (ต่อเนื่องปี 2567) /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน ตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อมจากสี่ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อมจากสี่ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์กระชูด /ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว /ชุมชนบางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว/ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำวันเค้กมะพร้าวอ่อน /ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากชุมชนไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุน
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสกรีนเสื้ออัตลักษณ์ชุมชน/ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสบู่จากสมุนไพร /ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสวรรค์/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหุสตะเต๊ะ/ ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำแหนม ไล่กรอก ปลาต้ม(ต่อเมื่อปี 67)/ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดผ้าเต้า/ชุมชน ราษฎร์อุทิศ	99,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	99,000.00	-	
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชน ตลาดใหม่-ดอนนง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชน หัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเล หมึกหวาน กุ้งหวาน /ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ/ ชุมชน ร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันที่ผ้าปาเต๊ะให้กับ ผู้ว่างงาน /ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่ากระเป่า สานจูด /ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กระเป๋ากระดาษ /ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชัง / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชุมชนหลังคั้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานผ้าชิ้นแฟนซี /ชุมชนวัด โพธารวาส	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามพระราชดำริ /ชุมชนสิริสุข	130,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	130,000.00	-	
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเสื้อ Eco Print /ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
167	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	840,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	837,746.87	2,253.13	
168	โครงการอุดหนุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ในการควบคุมจำนวนและโรคจากลิงแสมบริเวณรอบบึงขุนทะเลและสถานที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	200,000.00	200,000.00	1 มี.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน
รวม		13,998,700.00	200,000.00	1,456,160.00						11,074,711.87	1,667,828.13	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
169	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	450,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	449,800.00	200.00	
170	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68			✓	348,596.50	1,403.50	
171	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	85,000.00	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	543,815.00	41,185.00	
172	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,200,000.00	798,900.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,832,336.00	166,564.00	
173	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	116,491.00	133,509.00	
174	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	696,541.00	203,459.00	
175	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 พ.ค. 68			✓	297,425.00	2,575.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
176	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	37,100,200.00		2,551,900.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	33,192,203.94	1,356,096.06	
177	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	56,311,400.00		6,497,500.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	46,498,158.74	3,315,741.26	
178	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	102,200.00	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68			✓	896,861.00	939.00	
179	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68			✓	118,800.00	31,200.00	
180	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	96,190.00	3,810.00	
181	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตามหลักสูตร พื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	707,530.00	92,470.00	
182	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68			✓	110,000.00	-	
183	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	58,795.00	1,205.00	
184	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68				-	80,000.00	
185	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68			✓	-	50,000.00	
186	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	96,550.00	3,450.00	
187	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	199,772	228.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
188	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	627,633.00	72,367.00	
189	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	69,243.00	30,757.00	
190	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	300,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ยกเลิกโครงการ งดจัดโครงการ เนื่องจาก กท. จังหวัด ปิดปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา จังหวัด ซึ่งเป็น สถานที่จัดโครงการ		-	-	
191	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	708,642.00	91,358.00	
192	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	197,090.00	2,910.00	
193	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	74,860.00	125,140.00	
194	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	1,400,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	3,070,820.00	529,180.00	
195	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	700,000.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	925,401.00	74,599.00	
196	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	-	50,000.00	
197	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	5,600,000.00	600,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	11,927,552.95	72,447.05	
198	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	200,000.00	25,700.00	1 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	1,974,270.50	29.50	
199	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	10,800.00	1 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	239,130.00	70.00	
200	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68			✓	649,850.00	150.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
201	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ยกเลิกโครงการ ตั้งงบประมาณ เพื่อรองรับการขอ ความร่วมมือในการจัด กิจกรรมทางศาสนา เนื่องจากไม่ได้รับ การประสานงาน จากจังหวัด จึงยกเลิก		-	5,000.00	
202	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อนุมัติเงินงบประมาณ กรณีก่อหนี้ผูกพัน		262,150.00	641,850.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
203	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	990,000.00	351,150.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,322,024.00	19,126.00	
204	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,315,600.00	568,620.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,766,732.00	117,488.00	
205	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	594,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	546,000.00	48,000.00	
206	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	520,800.00	7,200.00	
207	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	836,000.00	325,250.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,093,050.00	68,200.00	
208	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,232,000.00	88,660.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,320,000.00	660.00	
209	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นimit	1,408,000.00	412,216.00	115,896.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,537,976.00	166,344.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
210	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,955,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	7,942,000.00	13,200.00	
211	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,087,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	1,087,200.00	-	
212	อุดหนุนมีสียอดอีกมะตูลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68			✓	400,000.00	-	
213	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	
214	อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	
215	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,551,200.00	-	1,100,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รอเบิกจ่าย (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อนนี้ ผูกพัน)		9,600,206.76	2,850,993.24	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
216	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 (เผด็จศึก) (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	1,266,000.00	-	1 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68		สภาเทศบาลฯ อนุมัติกัน เงินงบประมาณ กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน		-	1,266,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
217	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	1,738,000.00	-	1 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68		สภาเทศบาลฯ อนุมัติกัน เงินงบประมาณ กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน		-	1,738,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
218	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 (พิชชานันท์) (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	874,000.00	-	1 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68		สภาเทศบาลฯ อนุมัติกัน เงินงบประมาณ กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน		-	874,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
219	โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งพื้นยางสนามแบดมินตัน (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	900,000.00	-	1 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68		สภาเทศบาลฯ อนุมัติกัน เงินงบประมาณ กรณี มิได้ก่อนนี้ผูกพัน		-	900,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		148,367,800.00	13,907,796.00	12,703,996.00						134,322,496.39	15,249,103.61	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
220	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68			✓	10,000.00	-	
221	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	33,650.00	46,350.00	
222	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	35,790.00	34,210.00	
223	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	108,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	54,767.00	187,233.00	
224	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	22,130.00	7,870.00	
225	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	135,000.00	-	-	1 ก.ค. 68	31 ส.ค. 68				-	135,000.00	
226	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	50,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	12,000.00	38,000.00	
227	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 ก.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	63,770.00	16,230.00	
228	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68				-	20,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
229	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ผู้รับจ้างดำเนินการ เข้าพื้นที่ปรับปรุงอาคาร (อนุมัติกันเงิน งบประมาณ กรณีก่อนนี้ ผูกพัน)		-	2,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
230	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	247,000.00	3,000.00	
รวม		23,105,000.00	-	158,000.00						479,107.00	22,467,893.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		258,134,210.00	22,558,796.00	15,923,156.00						182,379,710.76	82,390,139.24	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	6,000,000.00	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		สำรวจโครงการ		-	5,930,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	426,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	722,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนปากน้ำ จากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขต เทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	47,666,000.00	
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลี้ยวเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	203,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงฝิวจراجรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบคอสะพาน	200,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 91.82%		-	200,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 11	184,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68			✓	169,900.00	14,100.00	
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		แก้ไขแบบบูรณาการ ก่อสร้าง และแบบสรุป ปริมาณงานและราคา		-	166,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 6	118,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	118,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
11	โครงการขยายเขตประปาถนอมประจักษ์ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	115,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการขยายเขตประปาถนอมประจักษ์ 2	128,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	126,000.00	2,000.00	
13	โครงการขยายเขตประปาถนอมชนเกษม 50/1	461,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	461,000.00	-	
14	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6	97,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	97,000.00	-	
15	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	115,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการขยายเขตประปาถนอมศรีเกษมตัดใหม่ (ร้านเดอะซอพท์)	119,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	119,000.00	-	
17	โครงการขยายเขตประปาถนอมกาญจนวิถิ 6	213,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	213,000.00	-	
18	โครงการขยายเขตประปาถนอมกาญจนวิถิ 20	104,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	104,000.00	-	
19	โครงการขยายเขตประปาถนอมสาย 420 (ข้าวแกงสมุย - หัวสะพานศาลพ่อตาหวด)	1,360,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	1,360,000.00	-	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนพ่วงชุมชนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	527,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงชุมชนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	65,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	3,132,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		กำหนดยื่นข้อเสนอ ราคา วันที่ 2 ต.ค. 2568		-	30,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	10,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		173,806,000.00						2,767,900.00	171,038,100.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม										
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	6,800,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	4,380,464.00	2,419,536.00	
รวม		6,800,000.00						4,380,464.00	2,419,536.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		180,606,000.00						7,148,364.00	173,457,636.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนวนิถี	28,358,770.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68			✓	28,339,000.00	19,770.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5,641,230.00	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	4,371,766.00	1,269,464.00	
รวม		34,000,000.00						4,371,766.00	1,289,234.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		34,000,000.00						4,371,766.00	1,289,234.00	

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 24 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 328,576,648 บาท (สามร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 328,576,648 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	328,576,648.00	12,291,974.00	8	14,026,000.00	12,291,974.00	12	309,914,648.00	-	-	-	4	4,636,000.00
รวม	24	328,576,648.00	12,291,974.00	8	14,026,000.00	12,291,974.00	12	309,914,648.00	-	-	-	4	4,636,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.33			50.00			0.00		16.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 22%		-	8,905,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	2,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	2,328,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	794,000.00	153,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ที่จะทำ การก่อสร้างไม่เพียงพอ		-	495,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 1%		-	8,070,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	3,490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสบะบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากระดับจุดรับการ ระบายน้ำด้านหน้าโครงการ มีระดับที่สูงกว่า ทำให้ ไม่สามารถระบายน้ำได้		-	1,200,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	933,000.00	317,000.00	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	749,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากรายละเอียด ในแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความกว้าง ฝิวจรรจร		-	2,555,000.00	
12	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	2,896,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67			✓	549,000.00	96,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มี.ย. 67	31 ต.ค. 67			✓	555,000.00	2,000.00	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มี.ย. 67	30 พ.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	2,820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุโมงค์จราจร)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา		-	386,000.00	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	3,510,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนศรีเกษม ซอยข้างอุรุวิทยุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	1,794,000.00	706,000.00	
19	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง		-	19,800,778.00	
20	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนการุณราษฎร	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง		-	70,998,138.00	
21	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง		-	184,347,732.00	
22	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจراجรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,447,985.70	87,014.30	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,964,692.80	117,307.20	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนดอนนก STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	4,254,295.50	255,704.50	
รวม		328,576,648.00						12,291,974.00	316,284,674.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		328,576,648.00						12,291,974.00	316,284,674.00	

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้ มีทั้งหมด 39 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 126,635,819 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 56,384,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	45,219,519.00	15,837,387.51	10	16,001,519.00	12,883,887.51	7	22,842,000.00	2,953,500.00	-	-	5	6,376,000.00
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	2	5,157,000.00	4,098,600.00	2	5,157,000.00	4,098,600.00	-	-	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	27	56,384,519.00	19,935,987.51	12	21,158,519.00	16,982,487.51	10	28,850,000.00	2,953,500.00	-	-	5	6,376,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			44.44			37.04			0.00		18.52

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้

ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกักเงินไว้ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 70,251,300 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	32,000,000.00	-	-	-	-	2	32,000,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	4	22,200,100.00	3,866,888.00	1	4,130,000.00	3,866,888.00	2	16,429,600.00	-	-	-	1	1,640,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	651,200.00	536,200.00	2	651,200.00	536,200.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	12	70,251,300.00	4,403,088.00	3	4,781,200.00	4,403,088.00	8	63,829,600.00	-	-	-	1	1,640,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			25.00			66.67		0.00			8.33
รวม	39	126,635,819.00	24,339,075.51	15	25,939,719.00	21,385,575.51	18	92,679,600.00	2,953,500.00	-	-	6	8,016,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			38.46			46.16		0.00			15.38

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อน้ำขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอและเสนอราคา		-	660,000.00	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนดอนนก จากสี่แยกถนนมัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 95% (อนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีก่อนผู้ผูกพัน)		2,953,500.00	6,146,500.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการขยายเขตประปา - ถนนกาญจนาวิถี 26 - ซอยเสียงเมืองข้างโรงแรมเพชรพจน์ - ถนนคลองฉนาก (ตอนที่ 2)	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	746,407.55	934,111.45	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	181,000.00	6,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	4,016,000.00	10,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	1,648,000.00	206,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0% (อนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีก่อนนี้ผูกพัน)		-	2,341,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	326,000.00	29,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระดับท่อเดิมต่าง ระดับมาก น้ำไม่สามารถไหลได้		-	1,857,000.00	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0% (อนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีก่อนนี้ผูกพัน)		-	1,877,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0% (อนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีก่อนนี้ผูกพัน)		-	1,978,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0% (อนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีก่อนนี้ผูกพัน)		-	4,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กักเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจจาระถนนกาญจนวิถี 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	940,000.00	30,000.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจจาระถนนกาญจนวิถี 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	700,000.00	29,000.00	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจจาระถนนกาญจนวิถี 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0% (อนุมัติกักเงินงบประมาณ กรณีกักหนี้ผูกพัน)		-	619,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอและเสนอราคา		-	1,130,000.00	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจจาระถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 35% (อนุมัติกักเงินงบประมาณ กรณีกักหนี้ผูกพัน)		-	2,927,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโฉลกัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอและเสนอราคา		-	929,000.00	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจราจรถนนศรีเกษมหลังขอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากที่ดินสาธารณะ ด้านท้าย/จุดที่ตั้งอาคาร สถานีสูบน้ำแคบ		-	1,800,000.00	
20	โครงการปรับปรุงฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชูร์ แยกซ้าย 1 (ขอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,121,479.96	878,520.04	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,555,000.00	395,000.00	
22	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	1,650,000.00	600,000.00	
รวม		45,219,519.00	45,219,519.00						15,837,387.51	29,382,131.49	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
23	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		ทำสัญญาแล้ว รอผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม (อนุมัติขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน กรณีกอนี้ผู้กพัน)		-	1,795,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
24	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ผลงาน 63% (อนุมัติขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน กรณีก่อนนี้ผู้กักพัน)		-	3,363,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
25	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนถุมิต 2,3 อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68			✓	918,600.00	238,400.00	
26	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	3,180,000.00	820,000.00	
รวม		5,157,000.00	5,157,000.00						4,098,600.00	1,058,400.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
27	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68		ผู้รับจ้างขอขยายเวลาการ เข้าดำเนินงานและส่งมอบ งานจ้าง (อนุมัติขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน กรณีก่อนนี้ผู้กักพัน)		-	850,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		56,384,949.00	56,384,519.00						19,935,987.51	36,448,531.49	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติ รายเดียว (สภาเทศบาลฯ อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน)		-	5,500,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง (สภาเทศบาลฯ อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน)		-	2,900,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ก.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง (สภาเทศบาลฯ อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน)		-	2,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง (สภาเทศบาลฯ อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน)		-	5,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน 45% (อนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีก่อนนี้ผูกพัน)		-	4,500,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	27,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ทำสัญญาแล้ว รอผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้าง (อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อนนี้ผูกพัน)		-	27,500,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		32,000,000.00	32,000,000.00						-	32,000,000.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		จัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง (สภาเทศบาลฯ อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน)		-	1,429,600.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุญาตใช้ที่ดิน (สภาเทศบาลฯ อนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน)		-	15,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	4,130,000.00	4,130,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	3,866,888.00	263,112.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 4/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
10	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	1,640,500.00	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		ยกเลิกโครงการ แบบบูรณาการไม่ตรงกับ เป้าหมาย(ผลผลิตของ โครงการ)		-	1,640,500.00	
รวม		22,200,100.00	22,200,100.00						3,866,888.00	18,333,212.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
11	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	385,000.00	115,000.00	
12	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	151,200.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	151,200.00	-	
รวม		750,000.00	651,200.00						536,200.00	115,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		70,350,100.00	70,251,300.00						4,403,088.00	65,848,212.00	
