

รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประจำเดือน

ตุลาคม 2567

จัดทำโดย :
งานวิจัยและประเมินผล



คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป




สารบัญ



หน้า 1	แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)
หน้า 2	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)
หน้า 7	แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)
หน้า 8	แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)
หน้า 9	บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)
หน้า 29	บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ที่จ่ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)
หน้า 36	บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำเดือนตุลาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

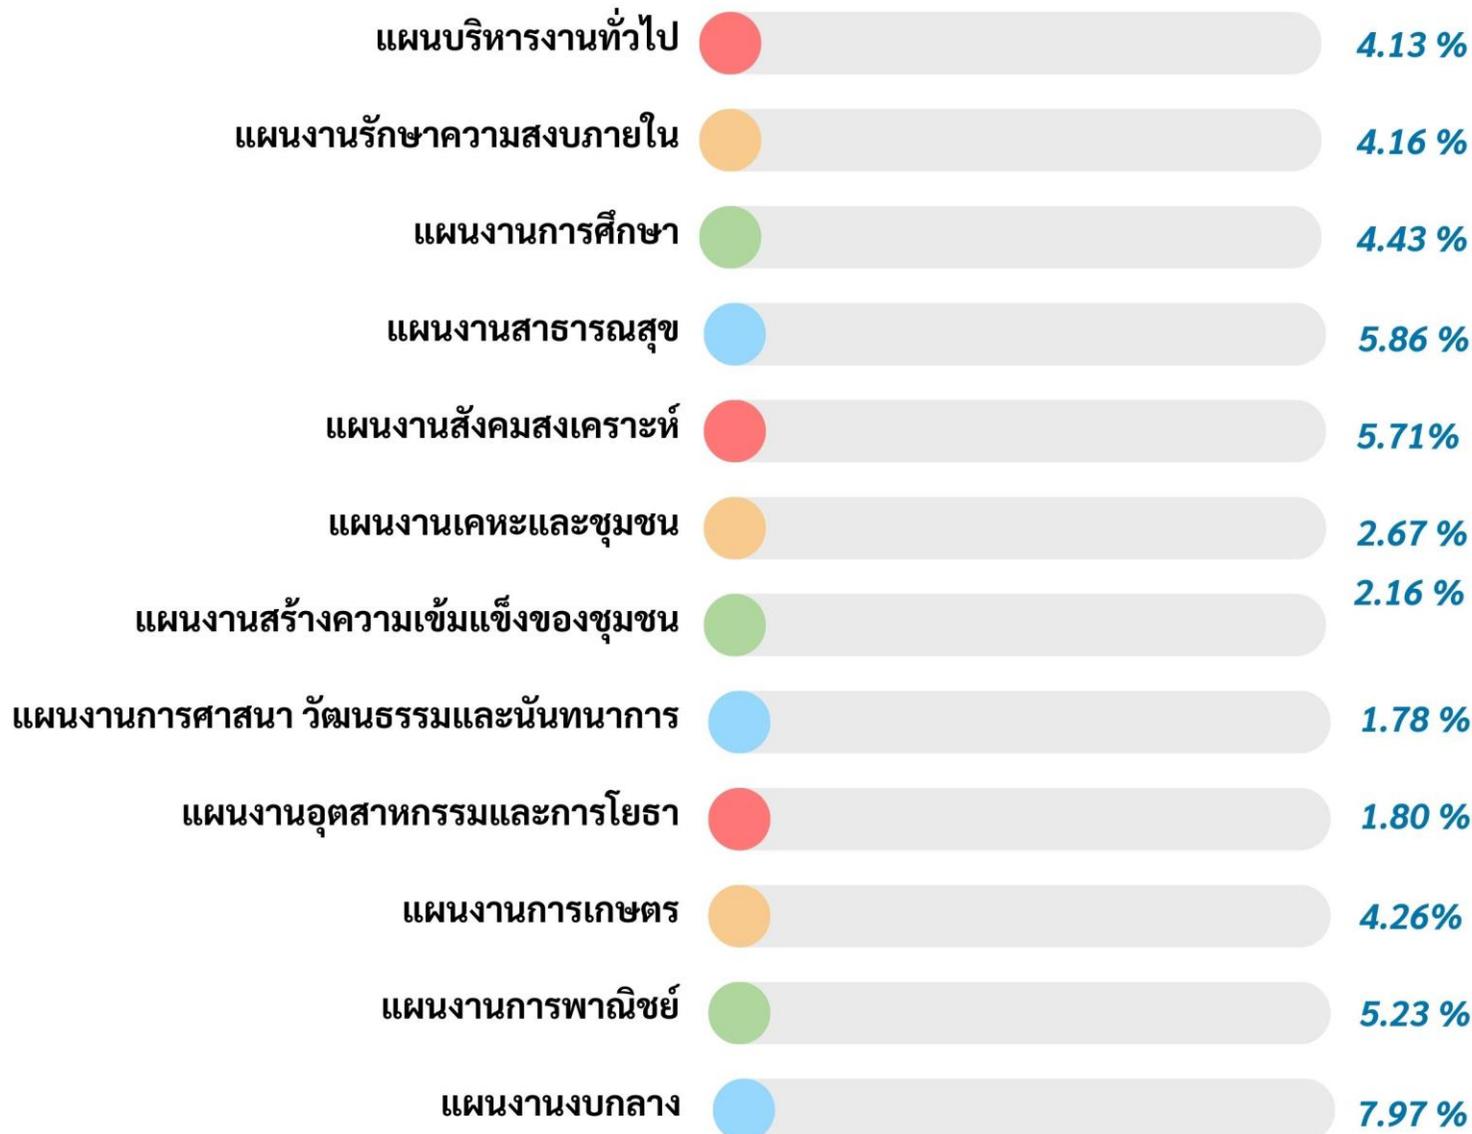

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำเดือน ตุลาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)

รายจ่ายประจำร้อยละ 30 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 15 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	164,827,228.00	42,000.00	42,000.00	5,971,908.07	6,804,687.40	152,050,632.53	4.13	
	รายจ่ายประจำ	162,098,328.00	42,000.00	42,000.00	5,971,908.07	6,804,687.40	149,321,732.53	4.20	
	- งานบริหารทั่วไป	96,959,603.00	42,000.00	42,000.00	4,659,988.26	4,118,803.85	88,180,810.89		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,635,500.00	-	-	34,570.00	226,030.00	4,374,900.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	59,622,148.00	-	-	1,217,349.81	2,426,293.55	55,978,504.64		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	881,077.00	-	-	60,000.00	33,560.00	787,517.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,728,900.00	-	-	-	-	2,728,900.00	-	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	2,317,500.00	-	-	-	-	2,317,500.00		
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	69,000.00	-	-	-	-	69,000.00		
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	342,400.00	-	-	-	-	342,400.00		สป./กองยุทธฯ/กจ.
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,459,050.00	660.00	660.00	150,553.70	1,559,444.68	35,749,051.62	4.16	
	รายจ่ายประจำ	31,702,550.00	660.00	660.00	150,553.70	1,559,444.68	29,992,551.62	4.92	
	- งานเทศกิจ	10,781,450.00	660.00	660.00	23,119.10	613,870.22	10,144,460.68		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	14,876,800.00	-	-	30,211.50	809,507.46	14,037,081.04		
	- งานจราจร	6,044,300.00	-	-	97,223.10	136,067.00	5,811,009.90		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,756,500.00	-	-	-	-	5,756,500.00	-	
	- งานจราจร (ครุภัณฑ์)	5,756,500.00	-	-	-	-	5,756,500.00		สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	342,190,110.00	18,377.00	18,377.00	2,907,928.37	15,142,717.27	324,139,464.36	4.43	
	รายจ่ายประจำ	341,295,110.00	18,377.00	18,377.00	2,907,928.37	15,142,717.27	323,244,464.36	4.44	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,329,300.00	18,377.00	18,377.00	67,807.05	400,523.87	7,860,969.08		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	185,774,260.00	-	-	1,245,060.61	8,251,865.17	176,277,334.22		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	140,989,150.00	-	-	1,545,537.91	6,206,229.84	133,237,382.25		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,202,400.00	-	-	49,522.80	284,098.39	5,868,778.81		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	895,000.00	-	-	-	-	895,000.00	-	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	470,000.00	-	-	-	-	470,000.00		
	- งานมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	425,000.00	-	-	-	-	425,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	71,974,050.00	76,628.00	111,128.00	2,306,564.50	4,214,663.19	65,418,322.31	5.86	
	รายจ่ายประจำ	68,882,850.00	76,628.00	111,128.00	2,238,364.50	4,214,663.19	62,395,322.31	6.12	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,484,750.00	28.00	91,600.00	481,762.00	563,855.72	8,347,560.28		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,297,050.00	76,600.00	19,528.00	847,386.40	860,237.94	17,646,497.66		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	40,101,050.00	-	-	909,216.10	2,790,569.53	36,401,264.37		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,091,200.00	-	-	68,200.00	-	3,023,000.00	-	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ครุภัณฑ์)	68,200.00	-	-	68,200.00	-	-		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	2,983,000.00	-	-	-	-	2,983,000.00		
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,710,870.00	-	-	24,958.00	669,225.20	11,016,686.80	5.71	
	รายจ่ายประจำ	11,209,220.00	-	-	-	358,235.20	10,850,984.80	3.20	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,683,800.00	-	-	-	358,235.20	4,325,564.80		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,525,420.00	-	-	-	-	6,525,420.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	501,650.00	-	-	24,958.00	310,990.00	165,702.00	61.99	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (ครุภัณฑ์)	39,950.00	-	-	-	-	39,950.00		สำนักช่าง
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (ครุภัณฑ์)	461,700.00	-	-	24,958.00	310,990.00			
6	แผนงานเคหะและชุมชน	185,567,010.00	181,890.00	166,890.00	24,599,268.56	4,964,254.38	156,018,487.06	2.67	
	รายจ่ายประจำ	157,059,010.00	181,890.00	166,890.00	24,599,268.56	4,964,254.38	127,510,487.06	3.16	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,584,910.00	-	-	497,657.00	-	1,087,253.00		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	11,229,050.00	-	-	290,788.59	617,925.39	10,320,336.02		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	123,899,650.00	179,890.00	166,890.00	23,070,429.15	3,448,794.99	97,393,425.86		สข. / สช.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	20,345,400.00	2,000.00	-	740,393.82	897,534.00	18,709,472.18		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	28,508,000.00	-	-	-	-	20,008,000.00	-	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	20,008,000.00	-	-	-	-	20,008,000.00		สข. / สช.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ค่าครุภัณฑ์)	8,500,000.00	-	-	-	-	8,500,000.00		สข. / สช.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,241,100.00	-	-	247,370.00	415,370.00	18,578,360.00	2.16	
	รายจ่ายประจำ	19,241,100.00	-	-	247,370.00	415,370.00	18,578,360.00	2.16	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,770,000.00	-	-	247,250.00	-	7,522,750.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,471,100.00	-	-	120.00	415,370.00			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	28,648,600.00	230,000.00	230,000.00	9,052,058.52	509,530.84	19,087,010.64	1.78	
	รายจ่ายประจำ	28,648,600.00	230,000.00	230,000.00	9,052,058.52	509,530.84	19,087,010.64	1.78	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,736,350.00	-	-	2,908,170.00	93,605.84	5,734,574.16		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,643,950.00	200,000.00	200,000.00	6,142,067.72	374,895.00	6,126,987.28		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	7,268,300.00	30,000.00	30,000.00	1,820.80	41,030.00	7,225,449.20		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	151,384,047.00	30,000.00	30,000.00	1,410,064.78	2,718,292.82	147,255,689.40	1.80	
	รายจ่ายประจำ	59,864,150.00	30,000.00	30,000.00	1,410,064.78	2,590,300.88	55,863,784.34	4.33	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,178,900.00	30,000.00	30,000.00	173,760.00	410,570.00	7,594,570.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	51,685,250.00	-	-	1,236,304.78	2,179,730.88	48,269,214.34		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	91,519,897.00	-	-	-	127,991.94	91,391,905.06	0.14	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	89,019,897.00	-	-	-	127,991.94	88,891,905.06		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	6,369,150.00	-	-	851,981.20	271,208.00	5,245,960.80	4.26	
	รายจ่ายประจำ	6,369,150.00	-	-	851,981.20	271,208.00	5,245,960.80	4.26	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,369,150.00	-	-	851,981.20	271,208.00	5,245,960.80		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,484,700.00	19,500.00	-	77,341.30	183,343.79	3,243,514.91	5.23	
	รายจ่ายประจำ	3,484,700.00	19,500.00	-	77,341.30	183,343.79	3,243,514.91	5.23	
	- งานตลาดสด	600,200.00	-	-	-	37,240.00	562,960.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,884,500.00	19,500.00	-	77,341.30	146,103.79	2,680,554.91		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	302,144,085.00	-	-	3,195,941.00	24,074,269.05	274,873,874.95	7.97	
	รายจ่ายประจำ	302,144,085.00	-	-	3,195,941.00	24,074,269.05	274,873,874.95	7.97	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,325,000,000.00	599,055.00	599,055.00	50,795,938.00	61,527,006.62	1,212,677,055.38	4.64	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,191,998,853.00	599,055.00	599,055.00	50,702,780.00	61,088,024.68	1,080,208,048.32	5.12	
	รวมงบลงทุน	133,001,147.00	-	-	93,158.00	438,981.94	123,969,007.06	0.33	


รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา

หน่วย : โครงการ

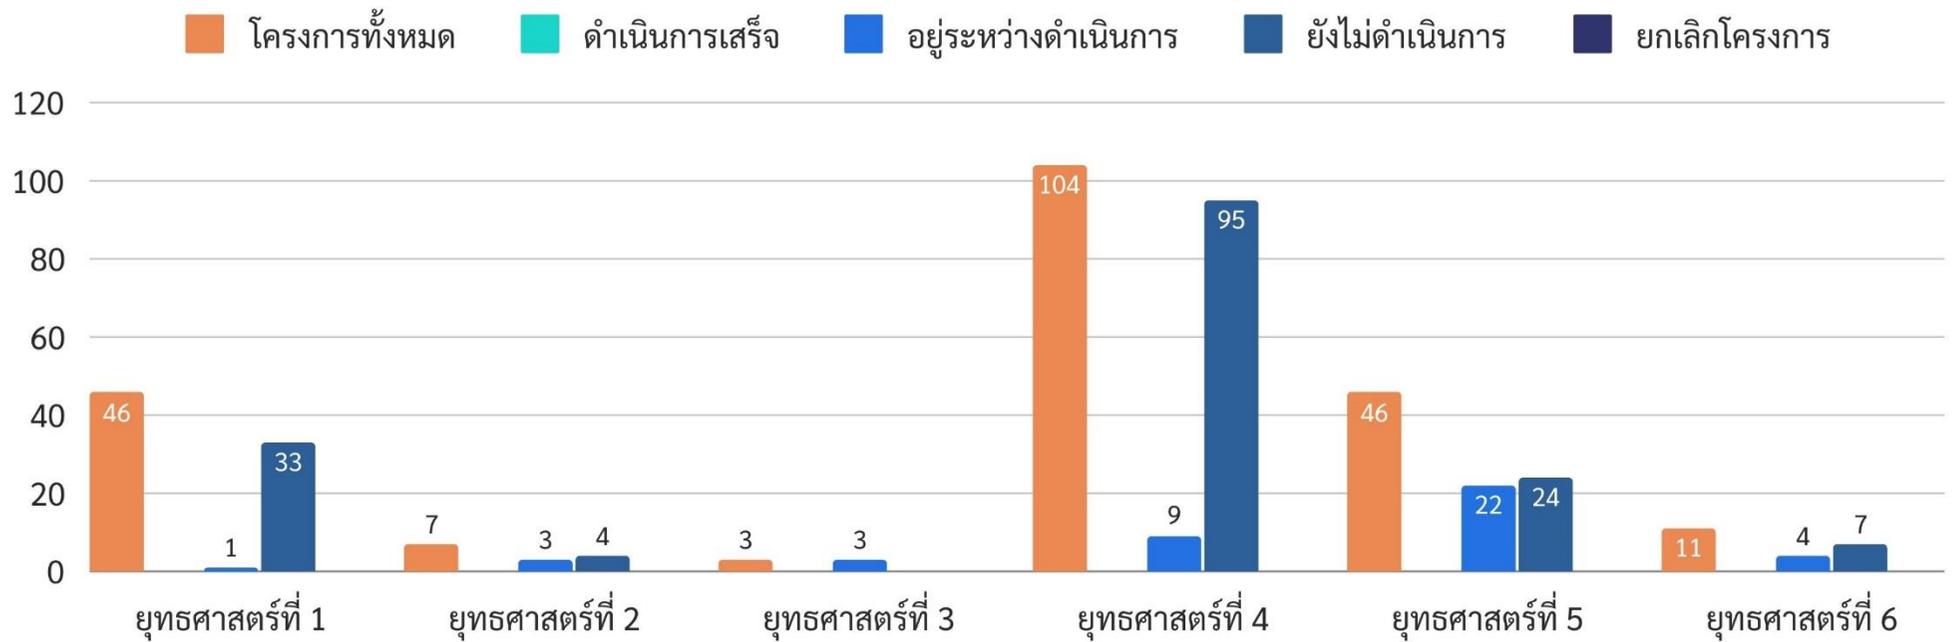

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ร้อยละ **-** ดำเนินการเสร็จ
จำนวน - โครงการ


ร้อยละ **24.88** อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 54 โครงการ

ร้อยละ **75.12** ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 163 โครงการ

ร้อยละ **-** ยกเลิก
จำนวน - โครงการ




สถานะการดำเนินโครงการ

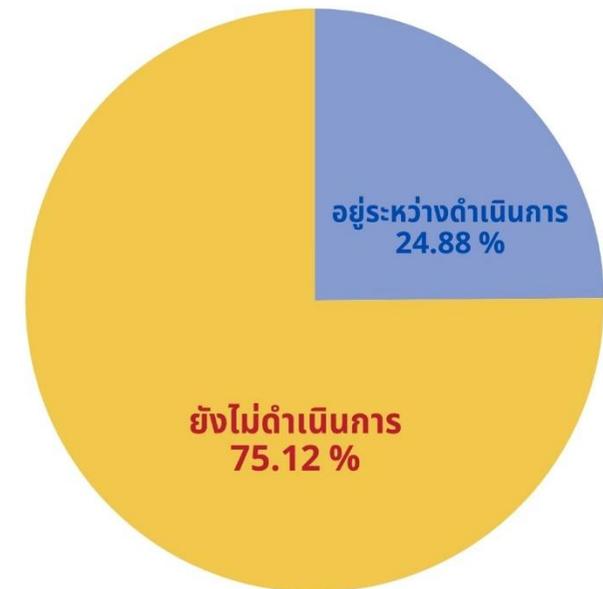



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนตุลาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 217 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 243,743,010 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 217 งบประมาณ 243,743,010 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46	65,962,710.00	497,657.00	-	-	-	13	7,354,710.00	497,657.00	33	58,608,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	5,800,000.00	-	-	-	-	3	1,900,000.00	-	4	3,900,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	900,000.00	-	-	-	-	3	900,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	104	13,158,700.00	18,300.00	-	-	-	9	3,504,700.00	18,300.00	95	9,654,000.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	134,816,600.00	7,975,847.72	-	-	-	22	124,657,600.00	7,975,847.72	24	10,159,000.00	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	23,105,000.00	3,080.00	-	-	-	4	700,000.00	3,080.00	7	22,405,000.00	-	-
รวม	217	243,743,010.00	8,494,884.72	-	-	-	54	139,017,010.00	8,494,884.72	163	104,726,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			24.88			75.12		0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่า ไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	15,920,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี 20 ช่วง 2	528,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	528,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนการบินไทย	769,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	769,000.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก	7,187,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68	✓			-	7,187,000.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2 แยกขวา 1	761,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68	✓			-	761,000.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 39	580,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	580,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 35	921,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	921,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าฉาง	462,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	462,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	571,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	571,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพู่ททะเล ซอย 25	2,723,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	2,723,000.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเรือนจำเก่า	436,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	436,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีพุนพิน	1,137,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	1,137,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 21	7,485,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68	✓			-	7,485,000.00	✓	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 4	189,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	189,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 6	419,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	419,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2	1,402,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68	✓			-	1,402,000.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ 24	672,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	672,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 16	329,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	329,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 18/1	704,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	704,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 18/2	493,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	493,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ่อนไก่ ซอยนฤมล	261,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	261,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 10	229,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	229,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ 4	717,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	717,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ	3,147,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	3,147,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนาภิเษก	เทศบัญญัติ	-	-	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	6,000,000.00	✓	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-						-	34,000,000.00		
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68	✓			-	6,900,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกการุณราษฎร์	488,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	488,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	432,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกเทศบาล	493,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	493,000.00	✓	
30	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกไทยสมุทร	462,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	462,000.00	✓	
31	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกธรรมบูชา	489,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	489,000.00	✓	
32	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยก ธารา	378,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	378,000.00	✓	
33	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกลัคกี้	451,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	451,000.00	✓	
34	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกวัดโพธิ์	473,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	473,000.00	✓	
35	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกแสงเพชร	465,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขอความเห็นชอบ รายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนด ราคากลาง		-	465,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกอนามัย	392,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง		-	392,000.00	✓	
37	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษย (ระหว่างซอย 20 และซอย 20/1)	101,970.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ		101,967.79	2.21	✓	
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคอนนค 2 (ท้ายซอย)	33,500.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ		33,492.07	7.93	✓	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนท่าโรงช้าง ซอยประยูรการช่าง แยกซ้าย	30,650.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ		30,646.94	3.06	✓	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปทุมพร 6/2	53,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ		53,014.22	5.78	✓	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยงเมือง ซอยท่าทราย	40,700.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ		40,694.24	5.76	✓	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม (ทางเข้าสวนหลวงรีสอร์ท)	67,370.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ		67,368.27	1.73	✓	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม 7	24,130.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ		24,119.94	10.06	✓	
44	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 11/1	25,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ		25,011.25	8.75	✓	
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสันติสุข 1	42,110.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ		42,104.50	5.50	✓	
46	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนอำเภอ ซอยมินตรา (ข้างภัตตาคารบัวทอง)	79,240.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ		79,237.78	2.22	✓	
รวม		65,962,710.00	-	-						497,657.00	65,465,053.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
47	โครงการเคหะทาวน์/สวีตส์ปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68	✓			-	500,000.00	✓	
48	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
49	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	400,000.00	✓	
50	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00	✓	
51	โครงการเทศกาลดนตรี	1,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	1,500,000.00	✓	
52	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	1,500,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	1,500,000.00	✓	
53	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	1,000,000.00	✓	
รวม		5,800,000.00	-	-						-	5,800,000.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
54	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	300,000.00	✓	
55	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	300,000.00	✓	
56	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	300,000.00	✓	
รวม		900,000.00	-	-						-	900,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
57	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการเมื่อ มีเหตุสาธารณสุขภัย		-	500,000.00	✓	
58	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68	✓			-	100,000.00	✓	
59	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68	✓			-	250,000.00	✓	
60	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	28 ก.พ. 68	✓			-	200,000.00	✓	
61	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการทั้งปี มีการจัดจ้างเช่าเครื่อง เสียงตลอดทั้งปี		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
62	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯ จักรีนธรรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	200,000.00	✓	
63	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯ จักรีนธรรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	400,000.00	✓	
64	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	✓			-	800,000.00	✓	
65	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯ จักรีนธรรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	200,000.00	✓	
66	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	200,000.00	✓	
67	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดประชุมแกนนำ สุขภาพชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดทั้งปี		-	93,600.00	✓	
68	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯ จักรีนธรรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	200,000.00	✓	
69	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,481,300.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		รวบรวมรายชื่อ กลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้า ร่วมอบรมและ ไปทัศนศึกษาดูงาน		-	1,481,300.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
70	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	57,000.00	✓	
71	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	40,000.00	✓	
72	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	50,000.00	✓	
73	โครงการบริการรับยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	10,000.00	✓	
74	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	300,000.00	✓	
75	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	800,000.00	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	50,000.00	✓	
77	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	80,000.00	✓	
78	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตผู้สูงอายุยุคปัจจุบัน		18,300.00	231,700.00	✓	
79	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	100,000.00	✓	
80	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	
81	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	30,000.00	✓	
82	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68	✓			-	300,000.00	✓	
83	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
84	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	1,200,000.00	✓	
85	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	750,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68	✓			-	750,000.00	✓	
86	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	20,000.00	✓	
87	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	90,000.00	✓	
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	42,000.00	✓	
89	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	420,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	420,000.00	✓	
90	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00	✓	
91	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	100,000.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	✓			-	50,000.00	✓	
93	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จรจัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			ขออนุมัติดำเนินโครงการ	-	300,000.00	✓	
94	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			ขออนุมัติดำเนินโครงการ	-	399,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
95	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	80,000.00	✓	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ /ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ /ชุมชนเพชรวิไลสำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋าผ้าแฟชั่นด้วยลายผ้าไทย /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน/ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำEco Print /ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าจักสานเคคูพาง /ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าแฟชั่น /ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมคุกกี /ชุมชนหลังอาชีวะ	26,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	26,000.00	✓	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมถั้ว ขนมะจีบ /ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทศกาลและเครื่องดื่มสมุนไพร/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชน ลูกเสือ-การณราษฎร์	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชน ฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและเครื่องดื่ม สมุนไพร /ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยสาकुไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ /ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียว หมูแดดเดียว หมูฝอย /ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนในลิ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กช็อกโกแลตน้ำนมและ เค้กส้มหน้าน้ำนม/ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กวันขนมไทย (วันเรนโบว์) /ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และ เหรียญโปรยทาน /ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโตปลาแห้ง /ชุมชน สันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโตปลาแห้ง/ชุมชน ปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกกากหมู และ โตปลาแห้ง /ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน /ชุมชน เมตตารธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ (สบู์เหลวจากสมุนไพรเข้มข้น) /ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบะหมี่เปิดอย่าง เกี่ยวหมูแดง /ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำประมงชายฝั่ง ขั้นพื้นฐาน /ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วย เทคนิคเคคูพาง /ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพันคอ Eco Print/ ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ (Eco Print)/ชุมชนโพทวย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้/ ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนท่า กูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนท่า แขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชน ไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชน บึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ต่อเนื่องปี 2567) /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน ตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน ตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน หน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจาก สีธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจากสี ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์กระจุต /ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว /ชุมชน บางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว/ชุมชน ศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว/ ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหุ่นเค้กมะพร้าวอ่อน / ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกรีนเสื่ออัครลักษณ์ ชุมชน/ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสบู่จากสมุนไพร / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสวรรค์/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสะเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม ไข่กรอกปลาต้ม(ต่อเนืองปี 67) /ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดฝ่าเท้า/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	99,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	99,000.00	✓	
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเลหมึกหวาน กุ้งหวาน /ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ/ชุมชน ร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันที่ผ้าปาเต๊ะให้กับผู้ว่างงาน /ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่ากระเป่าสานจูด /ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูด /ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชัง /ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง /ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานผ้าชิ้นแพนซี /ชุมชนวัดโพธารวาส	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามพระราชดำริ /ชุมชนสิริสุข	130,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	130,000.00	✓	
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเสื้อ Eco Print /ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
รวม		13,158,700.00	-	-						18,300.00	13,140,400.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
161	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	450,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการจัดงานกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		11,750.00	438,250.00	✓	
162	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68	✓			-	350,000.00	✓	
163	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	500,000.00	✓	
164	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	1,200,000.00	✓	
165	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	250,000.00	✓	
166	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	900,000.00	✓	
167	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 พ.ค. 68	✓			-	300,000.00	✓	
168	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	37,100,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานโรงเรียนขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษาไตรมาส 1, งานนอกระบบขออนุมัติเบิกจ่าย		-	37,100,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
169	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	56,311,400.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานโรงเรียนขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษาไตรมาส 1		-	56,311,400.00	✓	
170	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68	✓			-	1,000,000.00	✓	
171	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	150,000.00	✓	
172	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	
173	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตามหลักสูตร พื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	800,000.00	✓	
174	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68	✓			-	110,000.00	✓	
175	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68	✓			-	60,000.00	✓	
176	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	80,000.00	✓	
177	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	50,000.00	✓	
178	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	
179	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	200,000.00	✓	
180	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	700,000.00	✓	
181	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	100,000.00	✓	
182	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	300,000.00	✓	
183	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	800,000.00	✓	
184	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
185	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	200,000.00	✓	
186	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค ณ จังหวัดตรัง	5,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง		1,659,890	3,340,110.00	✓	
187	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	300,000.00	✓	
188	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	
189	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	200,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ		6,104,207.72	695,792.28	✓	
190	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	200,000.00	-	1 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	2,000,000.00	✓	
191	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68	✓			-	250,000.00	✓	
192	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	650,000.00	✓	
193	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	5,000.00	✓	
194	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	904,000.00	✓	
195	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	990,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		-	990,000.00	✓	
196	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,315,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		-	1,315,600.00	✓	
197	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	594,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		-	594,000.00	✓	
198	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		-	528,000.00	✓	
199	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	836,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		-	836,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
200	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดท่าทอง	1,232,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		-	1,232,000.00	✓	
201	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		-	1,408,000.00	✓	
202	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,955,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		-	7,955,200.00	✓	
203	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าภายใน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,087,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		-	1,087,200.00	✓	
204	อุดหนุนมีสียัดอีกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00	✓	
205	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67		รอรายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน		100,000.00	-	✓	
206	อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67		รอรายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน		100,000.00	-	✓	
รวม		134,816,600.00	200,000.00	200,000.00						7,975,847.72	126,840,752.28		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
207	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	10,000.00	✓	
208	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	80,000.00	✓	
209	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลฯ เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2567		2,380.00	67,620.00	✓	
210	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		กำหนดจัดประชุม คณะกรรมการสนับสนุนฯ วันที่ 22 พ.ย. 2567 และ ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลฯ วันที่ 28 พ.ย. 2567		-	350,000.00	✓	


รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
211	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2567		700.00	29,300.00	✓	
212	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	135,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	135,000.00	✓	
213	โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	100,000.00	✓	
214	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	80,000.00	✓	
215	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	20,000,000.00	✓	
216	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	2,000,000.00	✓	
217	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR)		-	250,000.00	✓	
รวม		23,105,000.00	-	-						3,080.00	23,101,920.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		243,743,010.00	200,000.00	200,000.00						8,494,884.72	235,248,125.28		



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ณ เดือนตุลาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 28 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 518,106,648 บาท (ห้าร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 182,458,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-
รวม	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,072,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	7,072,000.00	-	-	-	-	2	7,072,000.00	-	-	-	-
รวม	2	7,072,000.00	-	-	-	-	2	7,072,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 328,576,648 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	328,576,648.00	-	-	-	-	24	328,576,648.00	-	-	-	-
รวม	24	328,576,648.00	-	-	-	-	24	328,576,648.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

รวม	28	518,106,648.00	66,490,307.11	-	-	-	28	518,106,648.00	66,490,307	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7/8 แล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2567		38,465,580.02	29,002,419.98		✓
2	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7/8 แล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2568		28,024,727.09	86,965,272.91		✓
รวม		182,458,000.00						66,490,307.11	115,967,692.89		
รวมทุกยุทธศาสตร์		182,458,000.00						66,490,307.11	115,967,692.89		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน		-	6,200,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผู้รับจ้าง ยังไม่เข้าดำเนินการ		-	872,000.00		✓
รวม		7,072,000.00						-	7,072,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		7,072,000.00						-	7,072,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	8,905,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,000,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการ		-	2,328,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	947,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	495,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	8,070,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	3,490,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสะบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	1,200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	1,250,000.00	✓	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	749,000.00	✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,555,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,896,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	645,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	557,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,820,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุสมจิตรแทรกเตอร์)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	386,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	3,510,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีเกษม ซอยข้างอุ้งรียุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,500,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	19,800,778.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนการุณราชบุรี	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	70,998,138.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	184,347,732.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ดำเนินงาน 20%		-	1,535,000.00		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ดำเนินงาน 20%		-	2,082,000.00		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนดอนนก STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ดำเนินงาน 20%		-	4,510,000.00		✓
รวม		328,576,648.00						-	328,576,648.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		328,576,648.00						-	328,576,648.00		

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้
ณ เดือนตุลาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้ มีทั้งหมด **45 โครงการ** งบประมาณที่กักเงินไว้ **140,845,819 บาท** (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกักเงินไว้ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 14,210,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	14,210,000.00	-	-	-	-	6	14,210,000.00	-	-	-	-	-
รวม	6	14,210,000.00	-	-	-	-	6	14,210,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 56,384,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	45,219,519.00	507,000.00	2	542,000.00	507,000.00	20	44,677,519.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,157,000.00	-	-	-	-	2	5,157,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	27	56,384,519.00	507,000.00	2	542,000.00	507,000.00	25	55,842,519.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			7.41			92.59			0.00		0.00	

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนตุลาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 70,251,300 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	32,000,000.00	-	-	-	-	2	32,000,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	4	22,200,100.00	-	-	-	-	4	22,200,100.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	651,200.00	-	-	-	-	2	651,200.00	-	-	-	-	-
รวม	12	70,251,300.00	-	-	-	-	12	70,251,300.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00
รวม	45	140,845,819.00	507,000.00	2	542,000.00	507,000.00	43	140,303,819.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			4.44			95.56			0.00		0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้

ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ		-	800,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	1,710,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	1,300,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	3,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 15%		-	2,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 70%		-	4,600,000.00		✓
รวม		14,210,000.00	14,210,000.00						-	14,210,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		14,210,000.00	14,210,000.00						-	14,210,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ ครั้งที่ 2		-	660,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนดอนนก จากสี่แยกอานามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	9,100,000.00		✓
3	โครงการขยายเขตประปา	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผลงาน 10%		-	1,680,519.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	181,000.00	6,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพอขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	4,026,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	1,854,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	2,341,000.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	326,000.00	29,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	1,857,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	1,877,000.00	✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	1,978,000.00	✓	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	4,000,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนวิถึ 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		กำลังดำเนินการก่อสร้าง		-	970,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนวิถึ 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขั้นตอนตรวจรับพัสดุ		-	729,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนวิถึ 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	619,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		อยู่ระหว่างจัดทำ แบบแปลน		-	1,130,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา		-	2,927,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคากลาง		-	929,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจากรถถนนศรีเกษมหลังขอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		อยู่ระหว่างจัดทำ แบบแปลน		-	1,800,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงฝิวจากรถแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชฎูร์ แยกซ้าย 1 (ขอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	2,000,000.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		บริหารสัญญา เนื้อหา 30%		-	1,950,000.00		✓
22	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง เสาเข็มจากความยาว 18 ม. เป็น 9 ม. จำนวน 2 ท่อน		-	2,250,000.00		✓
รวม		45,219,519.00	45,219,519.00						507,000.00	44,712,519.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
23	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		เปลี่ยนแปลงแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,795,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลางใหม่		-	3,363,000.00	✓	
รวม		5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
25	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนภูมิ 2,3 อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		เนื่องจากโครงการได้ ประกาศยกเลิก การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เพราะ ไม่มีผู้ยื่นประกวดราคาฯ จึงดำเนินการขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง		-	1,157,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงอาคารสนามเบตมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม		-	4,000,000.00		✓
รวม		5,157,000.00	5,157,000.00						-	5,157,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
27	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		มีผู้ยื่นเสนอราคา เพียงรายเดียวและ ราคาสูงกว่าราคากลาง		-	850,000.00	✓	
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		56,384,949.00	56,384,519.00						507,000.00	55,877,519.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ		-	5,500,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ		-	2,900,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ก.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ		-	2,000,000.00	✓	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ		-	5,000,000.00	✓	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างออกแบบและ กำหนดราคากลาง		-	4,500,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	27,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง และกำหนด ราคากลาง		-	27,500,000.00	✓	
รวม		32,000,000.00	32,000,000.00						-	32,000,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนภูมิ 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,429,600.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประกาศยกเลิกประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		-	15,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,130,000.00	4,130,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์		-	4,130,000.00	✓	
10	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	1,640,500.00	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,640,500.00	✓	
รวม		22,200,100.00	22,200,100.00						-	22,200,100.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
11	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้าง		-	500,000.00	✓	
12	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	151,200.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 (สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2567)		-	151,200.00	✓	
รวม		750,000.00	651,200.00						-	651,200.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		70,350,100.00	70,251,300.00						-	70,251,300.00		
